





Construcción de 500 estufas ecoeficientes en comunidades indígenas en el Municipio de Barranco Minas departamento del Guainia

07/06/2023

29/02/2024

TERMINADO

\$ 5,423,414.500

\$5,423,414.500

No

* Cifras en pesos


Timeline of the project:

- Fecha de aprobación: 07/08/2023
- Fecha de migración del proyecto a GESPROY: 27/08/2023
- Asignación Presupuestal SPGR: 28/07/2023
- Primer proceso precontractual: 28/08/2023
- Primer contrato suscrito: 21/10/2023
- Fecha de la primera acta de inicio: 23/10/2023

The timeline spans from June 2023 to March 2024, with specific months labeled: junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo.

Indicadores de Desempeño en la Eficiencia

Curva S

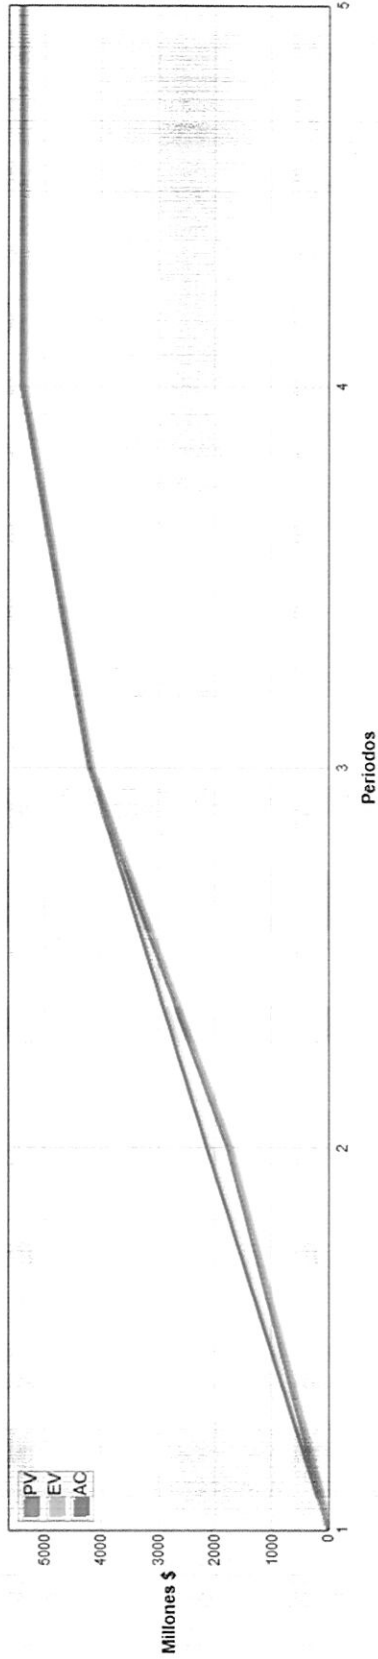

Línea	Periodos				
	1 oct-23	2 nov-23	3 dic-23	4 ene-24	5 feb-24
* Valor Planeado (PV) ①	6	2133	4212	5413	5423
* Valor Ganado (EV) ①	6	1775	4231	5413	5423
* Costo Actual (AC) ①	6	1775	4231	5413	5423
Cumplimiento en la programación (SPI) ①	1	0.83	1	1	1
Cumplimiento del costo (CPI) ①	1	1	1	1	1
Retraso SV(t) Meses ①		0.27			0.07

* Valores en millones de pesos


Q Buscar

11:23 a. m.
7/05/2024

ESP
LAA

979

BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO DETALLE	IGPR PROYECTO	RANGO DE CALIFICACIÓN	RESPONSABLE
2023943430002	SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE BARRANCO MINAS	TERMINADO	✓ 100,0	Excelente	MABEL HERRERA PLANEACION

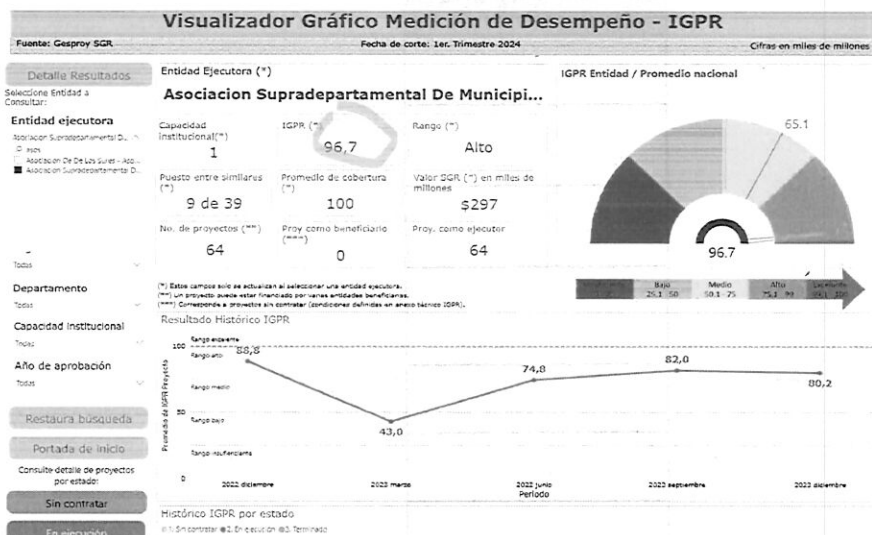

CASILLA DE VERIFICACIÓN
SI / NO / N/A

SI

EL SUPERVISOR A LA
AS PLATAFORMAS DE
L CUMPLIMIENTO DE LOS

/ISIÓN
