

ENERGÍA INTEGRAL ANDINA.

www.eia.com.co

INFORME MENSUAL DEL OBRA No. 1

Del 09 de junio al 30 de junio de 2026

OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE

CONTRATISTA:

ENERGIA INTEGRAL ANDINA

INTERVENTORÍA:

PROYECTOS TRIPLE O S.A.S.

VILLAVICENCIO, META.

LISTA DE CHEQUEO CONTRATO DE OBRA
INFORME MENSUAL

No BPIN (Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional):	**2025850010003**		
CONTRATO N°	**019 de 2026**	**FECHA:**	**24/04/2026**
OBJETO DEL CONTRATO	**IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE**		
PERIDO COMPRENDIDO ENTRE EL:	**09 al 30 de junio de 2026**		

INFORME MENSUAL No 01	**FORMATO DE LA ASOSUPRO**	**CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO / N/A**
INFORME DE OBRA, y los siguientes anexos:	SI	SI
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO (contratista manifieste, su plan de trabajo, frentes de obra, Orden de ejecución, descripción general de la ejecucion del proyecto - **Aplica para el primer informe de obra)**	NO	SI
ACTA APROBACIÓN PERSONAL OPERATIVO. (Según Anexo tecnico, la aprobacion es generada por la Interventoria en concordancia con el perfil profesional según el anexo tecnico de obra, del proceso de licitación).	SI	SI/COPIA
CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DEL CONTRATISTA (Antecedentes Judiciales, disciplinarios y fiscales). Nota: En caso de que el contratista sea consorcio y/o unión temporal, se debe adjuntar de cada persona natural y/o jurídica que la conforman.	NO	SI
HOJA DE VIDA PERSONAL en concordancia con al perfil solicitado en el proceso de contratación.	NO	N/A
APU - ANALISIS DE PRECIO UNITARIO OBRA (De todas las actividades incluidas en la lista de cantidades y precios presentados en la oferta); Aplica para el primer informe.	SI	SI
LISTA DE INSUMOS (Aprobada por la Interventoria); Aplica para el primer informe.	NO	N.A
COPIA ACTA DE VECINDAD, Cuando aplique cada mes.	SI	N.A
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO- PMT, Se entrega con el primer informe mensual, validado por la interventoría y aprobado por la autoridad competente. Si Aplica	NO	SI
ENTREGA DE DOTACIÓN Y/O ELEMENTOS PROTECCIÓN PERSONAL	SI	SI
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Informe de las acciones realizadas en cumplimiento del plan.	NO	SI
INFORME IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	SI	SI
ACTA RESUMEN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO - CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA	SI	N.A
CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	SI	SI
ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA	SI	SI

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA	SI	SI
BITACORA DE OBRA (Copia)	SI	SI
ACTA APROBACIÓN CAMBIO DE PERSONAL (Cuando Aplique)	SI	N/A
INFORME DE INTERVENTORIA	SI	SI

NOTAS

*TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER ORIGINALES, IMPRESIÓN CLARA Y A COLOR, SERÁN RADICADOS ÚNICAMENTE POR EL SUPERVISOR DONDE DEBEN ESTAR FOLIADOS 1-200 EN CARPETAS DE CONFORMIDAD A LA LEY DE ARCHIVO Y CARGADOS A LAS PLATAFORMAS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD . *LA LISTA DE CHEQUEO DEBE IR FIRMADA POR LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DEL PROCESO, COMO INDICADOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS AQUI ESTABLECIDOS.

OBSERVACIONES

Firma
Nombre: LAURO DANIEL LEÓN GARZÓN
DIRECTOR OBRA
M.P. 20641705

Firma
Nombre: Miguel Angel Caro Jimenez
DIRECTOR INTERVENTORIA
M.P. CN205-139465

Firma
Nombre: JEFFERSON PARRA CAPERA
APOYO A LA SUPERVISOR
M.P. CN205-68996

Firma
Nombre: LINA MELISA ROJAS VALBUENA
SUPERVISOR
M.P. A1202618-1122138384

Nota: Una vez cumplido el proceso de verificación por cada responsable se debe firmar la lista de chequeo

INFORME DE OBRA

INFORME MENSUAL No. 01

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

INFORME MENSUAL
Periodo de 09/06/2026 a 30/06/2026
Fecha de Presentación: 26/08/2026

INFORMACIÓN BÁSICA	
OBJETO CONTRATO DE OBRA:	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.
VALOR DEL CONTRATO:	$5.369.899.707
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	$5.369.899.707
CONTRATISTA DE OBRA	Energía Integral Andina S.A.
CORREO ELECTRÓNICO:	gerencia@eiasa.com.co; carlos.naranjo@eiasa.com.co
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	019 de 2026
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	Proyectos Triple O S.A.S.
CORREO ELECTRÓNICO:	Juamclp0315@hotmail.com; tripleosas@hotmail.com

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL			
FECHA DE INICIACIÓN:			09/06/2026
PRÓRROGA:			N/A
SUSPENSIÓN:			N/A
TIEMPO:			N/A
REINICIO:			N/A
FECHA DE TERMINACIÓN			08/03/2027
TIEMPO DE EJECUCIÓN			Nueve (9) meses
9	Meses	0	Días

INFORME MENSUAL No. 01

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

MUNICIPIO:	YOPAL CASANARE	VEREDA:	Vía La Pedrera
CORREGIMIENTO:	N/A	BARRIO:	Vía La Pedrera
COMUNA:	N/A		

COORDENADAS:


TRAMO A INTERVENIR							
PUNTO INICIAL				PUNTO FINAL			
K0+000				K12+7353,93			
PLANAS		GEOGRAFICAS		PLANAS		GEOGRAFICAS	
N: 1079910.452	E:855282.146	LAT: 5.317450°	LONG: -72.383000°	N:1078981.067	E:854818.949	LAT: 5.309039°	LONG:-72.387160°

MAPA DE LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO



INFORME MENSUAL No. 01

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

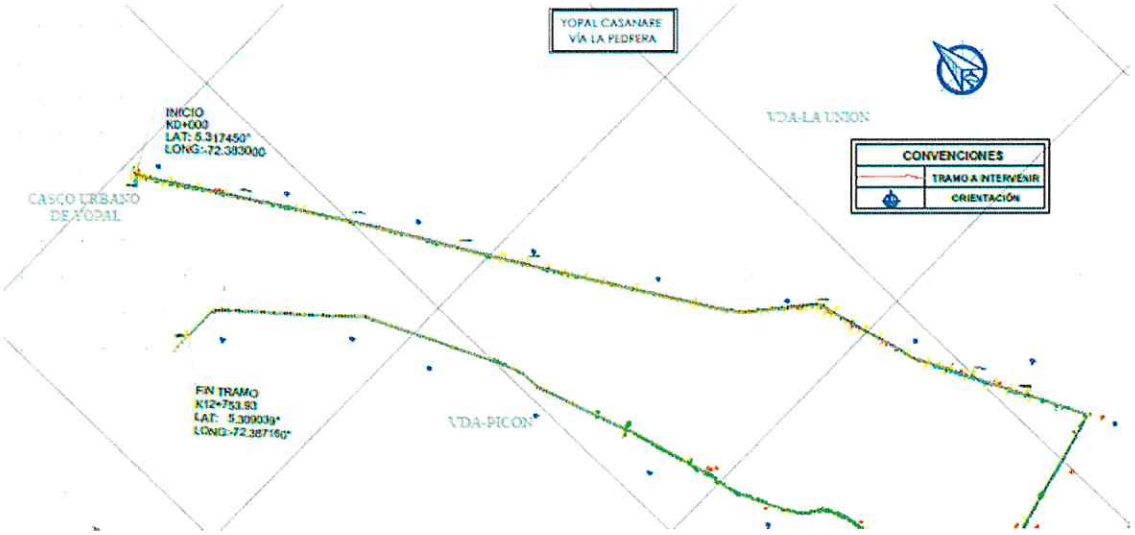

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La alternativa de solución consiste en instalar un sistema de alumbrado público basado en tecnología solar fotovoltaica, mediante luminarias autónomas que captan, almacenan y utilizan la energía solar para la iluminación nocturna de la vía la pedrera del municipio de Yopal, Casanare. Esta solución busca suplir la carencia de infraestructura eléctrica convencional, aprovechando las condiciones de irradiación solar de la región, garantizando así una solución eficiente, sostenible y de bajo impacto ambiental.

Esta solución tecnológica corresponde a un sistema de iluminación solar autónomo de baja potencia, diseñado especialmente para aplicaciones de alumbrado en zonas rurales, senderos peatonales, parques, áreas comunes o vías secundarias con baja densidad vehicular.

Esta alternativa se compone de los siguientes elementos:

- Luminaria LED de 35W, con eficiencia lumínica mayor a 140 lm/W, garantizando un nivel de iluminación adecuado para áreas de baja exigencia.
- Panel solar monocristalino, de alta eficiencia, optimizado para cargas solares diarias promedio y dimensionado para garantizar una autonomía mínima de 44 horas, incluso en días consecutivos con baja radiación solar.
- Batería de Litio $LiFePO_4$, con vida útil estimada de entre 8 y 10 años, diseñada para soportar 2.000 ciclos de descarga al 50%.
- Controlador inteligente con tecnología MPPT, que optimiza la conversión de energía solar, gestiona la carga y descarga de la batería.

INFORME MENSUAL No. 01

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

A. INFORME TÉCNICO

1. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el mes de junio de 2026, se dio inicio a la ejecución del Contrato de Obra No. 019 de 2026. Las actividades comenzaron con la gestión logística necesaria para el desarrollo del proyecto.

Asimismo, se llevó a cabo el replanteo topográfico de las vías a intervenir, proceso dentro del cual se ejecutaron las siguientes actividades clave:

1. Pre-replanteo topográfico: Se realizó el análisis del corredor vial, identificando la ubicación proyectada para las luminarias y evaluando las condiciones del suelo.

2. Acercamiento con empresas de servicios públicos (Gas): Debido a la presencia de redes de gas sobre el borde de la vía a intervenir, se articuló un trabajo con las empresas prestadoras del servicio. Estas entidades suministraron los planos de recorrido y la titularidad de las redes, facilitando las instrucciones de seguridad para la excavación.

3. Ajuste de diseño y localización: Con base en el pre-replanteo topográfico, se procedió al ajuste de los planos constructivos y archivos KMZ, permitiendo la demarcación y localización exacta de cada uno de los postes.

4. Gestión administrativa y logística: Se ejecutaron las labores de coordinación logística, compras y planeación de recursos de acuerdo con los tiempos y la ruta crítica del cronograma de trabajo.

ASOSUPRO
Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso

INFORME MENSUAL No. 01

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

PROGRAMACIÓN **INICIO**

"IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VIA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE"

ITEM	ACTIVIDAD	INICIO	FIN	DURACIÓN (días)	VALOR CONTRATO	VALOR MGA	VALOR x DIA	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
1	**PRELIMINARES**				$ 56.977.806,00	$ 60.172.549,00	$ 1.328.531,35											
1,01	Replanteo de obra	9/06/2026	24/07/2026	46	$ 49.225.360,00	$ 51.985.965,76	$ 1.070.116,52	$ 23.542.563,48	$ 25.682.796,52									$ 49.225.360,00
1,02	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas del sitio (incluye retiro disposición final)	1/08/2026	30/08/2026	30	$ 7.752.446,00	$ 8.186.583,24	$ 258.414,87			$ 7.752.446,00								$ 7.752.446,00
2	**ALUMBRADO PÚBLICO**				$ 5.252.176.585,00	$ 5.547.325.435,00	$ 30.698.554,37											
2,02	Excavación manual en material comun del sitio para cimentación de postes de alumbrado publico solar (incluye retiro y disposición final)	1/09/2026	15/10/2026	45	$ 34.758.796,00	$ 36.705.286,84	$ 772.417,69				$ 23.172.530,67	$ 11.586.266,33						$ 34.758.796,00
2,02	Suministro e instalación de poste en fibra de vidrio para alumbrado público (12mt 510kgf)	1/08/2026	30/01/2027	180	$ 1.985.686.509,00	$ 2.097.249.099,00	$ 11.031.591,72			$ 330.947.751,50	$ 330.947.751,50	$ 330.947.751,50	$ 330.947.751,50	$ 330.947.751,50	$ 330.947.751,50			$ 1.985.686.509,00
2,03	Cimentación para postes de alumbrado publico solar	15/09/2026	15/12/2026	91	$ 173.164.630,00	$ 182.910.858,24	$ 1.902.908,02				$ 30.446.528,35	$ 57.087.240,66	$ 57.087.240,66	$ 28.543.620,33				$ 173.164.630,00
2,04	Suministro e instalacion de luminarias solar ELITE III PRO INI-DL incluye (Luminaria LED, Panel solar fotovoltaico y paterria, soporte para conexiones, brazo metalico galvanizado y soliarm anti vandalico)	1/08/2026	30/01/2027	180	$ 3.058.566.650,00	$ 3.230.460.150,72	$ 16.992.036,94			$ 509.761.108,33	$ 509.761.108,33	$ 509.761.108,33	$ 509.761.108,33	$ 509.761.108,33	$ 509.761.108,33		$ 298.343.597,00	$ 3.356.910.247,00
TOTAL PROGRAMADO (AIU INCLUIDO)					$ 5.309.154.391,00	$ 5.697.497.988,00	$ 32.027.486,00	$ 23.542.563,48	$ 25.682.796,52	$ 848.461.305,83	$ 854.327.518,85	$ 909.382.365,83	$ 897.796.100,49	$ 869.252.480,16	$ 840.708.859,83		$ 298.343.597,00	$ 5.697.497.988,00
PORCENTAJE A COBRAR INTEVENTORIA								0,42%	0,45%	15,13%	15,96%	16,22%	16,01%	15,50%	14,99%		5,32%	100,00%
4	RETILAP	1/02/2027	14/03/2027	44	$ 14.277.144,00	$ 14.280.000,00	$ 324.480,55								$ 1.946.883,27	$ 9.734.416,36	$ 2.598.700,36	$ 14.280.000,00
5	PMA	9/06/2026	5/02/2027	240	$ 46.468.172,00	$ 46.468.172,00	$ 193.617,38	$ 4.259.582,43	$ 5.808.521,50	$ 5.808.521,50	$ 5.808.521,50	$ 5.808.521,50	$ 5.808.521,50	$ 5.808.521,50	$ 5.808.521,50	$ 1.548.939,07		$ 46.468.172,00
COSTO TOTAL OBRA					$ 5.369.899.707,00	$ 5.968.246.160,00												

INFORME DE OBRA

INFORME MENSUAL No. 01

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

REPROGRAMACIÓN

"IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE"

ITEM	ACTIVIDAD	INICIO	FIN	DURACIÓN (días)	VALOR CONTRATO	VALOR MGA	VALOR x DÍA	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
1.1.1	REALIZAR PRELIMINARES				$ 56,977,806.00	$ 60,171,721.00	$ 1,328,631.39	$ 23,542,563.48	$ 25,682,796.52	$ 7,752,446.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 56,977,806.00
1,01	Replanteo de obra	09/06/2026	24/07/2026	46	$ 49,225,360.00	$ 51,985,965.76	$ 1,070,116.52	$ 23,542,563.48	$ 25,682,796.52									$ 49,225,360.00
1,02	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas del sitio (incluye retiro disposición final)	01/08/2026	30/08/2026	30	$ 7,752,446.00	$ 8,186,583.24	$ 258,414.87			$ 7,752,446.00								$ 7,752,446.00
1.1.2	REALIZAR ALUMBRADO PÚBLICO				$ 5,252,176,585.00	$ 5,547,325,439.00	$ 30,698,954.37	$ -	$ -	$ 840,708,859.83	$ 894,327,918.85	$ 909,382,365.83	$ 897,796,100.49	$ 869,252,480.16	$ 840,708,859.83	$ -	$ -	$ 5,252,176,585.00
2,01	Excavación manual en material común del sitio para cimentación de postes de alumbrado público solar (Incluye retiro y disposición final)	01/09/2026	15/10/2026	45	$ 34,758,796.00	$ 36,705,288.84	$ 772,417.69				$ 23,172,530.67	$ 11,586,265.33						$ 34,758,796.00
2,02	Suministro e instalación de poste en fibra de vidrio para alumbrado público (12mt 510 kgf)	01/08/2026	30/01/2027	180	$ 1,985,686,509.00	$ 2,097,249,099.00	$ 11,031,591.72			$ 330,947,751.50	$ 330,947,751.50	$ 330,947,751.50	$ 330,947,751.50	$ 330,947,751.50	$ 330,947,751.50			$ 1,985,686,509.00
2,03	Cimentación para postes de alumbrado público solar	15/09/2026	15/12/2026	91	$ 173,164,630.00	$ 182,910,858.24	$ 1,902,908.02				$ 30,446,528.35	$ 57,087,240.66	$ 57,087,240.66	$ 28,543,620.33				$ 173,164,630.00
2,04	Suministro e instalación de luminarias solar ELITE III PRO INI-SL Incluye (Luminaria LED, Panel solar fotovoltaico y batería, soporte para conexiones, brazo metálico galvanizado y collarín anti vandálico)	01/08/2026	30/01/2027	180	$ 3,058,566,650.00	$ 3,230,460,150.72	$ 16,992,036.94			$ 509,761,108.33	$ 509,761,108.33	$ 509,761,108.33	$ 509,761,108.33	$ 509,761,108.33	$ 509,761,108.33			$ 3,058,566,650.00
TOTAL, PROGRAMADO (AIU INCLUIDO)					$ 5,309,154,391.00	$ 5,607,497,160.00	$ 32,027,485.76	$ 23,542,563.48	$ 25,682,796.52	$ 848,461,305.83	$ 894,327,918.85	$ 909,382,365.83	$ 897,796,100.49	$ 869,252,480.16	$ 840,708,859.83		$ -	$ 5,309,154,391.00
1.1.4	REALIZAR CERTIFICACIÓN RETILAP	1/02/2027	14/03/2027	44	$ 14,277,144.00	$ 14,280,000.00	$ 324,480.55								$ 1,946,883.27	$ 9,734,416.36	$ 2,595,844.36	$ 14,277,144.00
1.1.5	REALIZAR PLAN DE MANEJO AMBIENTAL-PMA	09/06/2026	08/02/2027	240	$ 46,468,172.00	$ 46,469,000.00	$ 193,620.83	$ 4,059,658.33	$ 5,808,625.00	$ 5,808,625.00	$ 5,808,625.00	$ 5,808,625.00	$ 5,808,625.00	$ 5,808,625.00	$ 5,808,625.00	$ 1,548,138.67		$ 46,468,172.00
COSTO TOTAL OBRA					$ 5,369,899,707.00	$ 5,668,246,160.00		$ 27,802,221.81	$ 31,491,421.52	$ 854,269,930.83	$ 900,136,543.85	$ 915,190,990.83	$ 903,604,725.49	$ 875,061,105.16	$ 848,464,368.11	$ 11,282,555.03	$ 2,595,844.36	$ 5,369,899,707.00

Justificación de la reprogramación de obra

La programación inicial del proyecto fue elaborada con base en el alcance contractual, las actividades previstas, la información presupuestal disponible y los criterios de planificación definidos para la ejecución, contando para su estructuración con el acompañamiento y seguimiento de la supervisión.

Esta programación constituyó la línea de referencia para la planificación inicial de las actividades del proyecto.

Posteriormente, a partir de las observaciones y precisiones realizadas durante el seguimiento por parte de la Supervisión, se efectuaron los ajustes correspondientes a la programación, con el propósito de armonizarla con los criterios establecidos para el seguimiento y presentación del avance de obra.

En consecuencia, la reprogramación presentada corresponde a una actualización de la programación inicialmente estructurada, manteniendo la secuencia y lógica de ejecución de las actividades, y atendiendo los criterios definidos durante el proceso de seguimiento del proyecto, modificando solo el ajuste del MGA.

BITÁCORA

Se hace constar que el desarrollo de las actividades se está registrando y supervisando de manera rigurosa a través de una bitácora diaria. Este instrumento técnico permite llevar un control minucioso y secuencial de cada tarea ejecutada, así como documentar en tiempo real las novedades, las condiciones del entorno y cualquier aspecto relevante que incide en el correcto desarrollo de las labores programadas.

2. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE OBRA

Avance físico

INFORME MENSUAL No. 01

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003


ACTIVIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
PERIODO 1 (09/06/2026-30/06/2026)	0,518%	$ 27.802.221,81	0,518 %	$ 27.802.221,81	0,519%	$ 27.887.755,43	0,519%	$ 27.887.755,43
PERIODO 2 (01/07/2026-31/07/2026)	0,556%	$ 31.491.421,52	1,074%	$ 59.293.643,33	%	$	%	$
PERIODO 3 (01/08/2026-31/08/2026)	15,908%	$ 854.269.930,83	16,982%	$ 913.563.574,17	%	$	%	$
PERIODO 4 (01/09/2026-30/09/2026)	16,763%	$ 900.136.543,85	33,745%	$ 1.813.700.118,02	%	$	%	$
PERIODO 5 (01/10/2026-31/10/2026)	17,043%	$ 915.190.990,83	50,788%	$ 2.728.891.108,84	%	$	%	$
PERIODO 6 (01/11/2026-30/11/2026)	16,827%	$ 903.604.725,49	67,615%	$ 3.632.495.834,34	%	$	%	$
PERIODO 7 (01/12/2026-31/12/2026)	16,296%	$ 875.061.105,16	83,911%	$ 4.507.556.939,50	%	$	%	$
PERIODO 8 (01/01/2027-31/01/2027)	15,800%	$ 848.464.368,11	99,711%	$ 5.356.021.307,61	%	$	%	$
PERIODO 9 (01/02/2027-28/02/2027)	0,210%	$ 11.282.555,03	99,921%	$ 5.367.303.862,64	%	$	%	$
PERIODO 10 (01/03/2027-08/03/2027)	0,079%	$ 2.595.844,36	100,00%	$ 5.369.899.707,00	%	$	%	$

NOTA: Se establecen diez (10) periodos, teniendo en cuenta que la trazabilidad del presente informe comprende del 9 al 30 de junio y se realiza con cortes al final de cada mes. Lo anterior no afecta el cumplimiento total de la obra ni el plazo contractual establecido. En la presente tabla, los porcentajes de avance se presentan con tres (3) decimales para facilitar su visualización y seguimiento, mientras que el porcentaje de programación registrado en GESPROY se presenta con dos (2) decimales.

INFORME MENSUAL No. 01

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

Gráfica Avance Físico

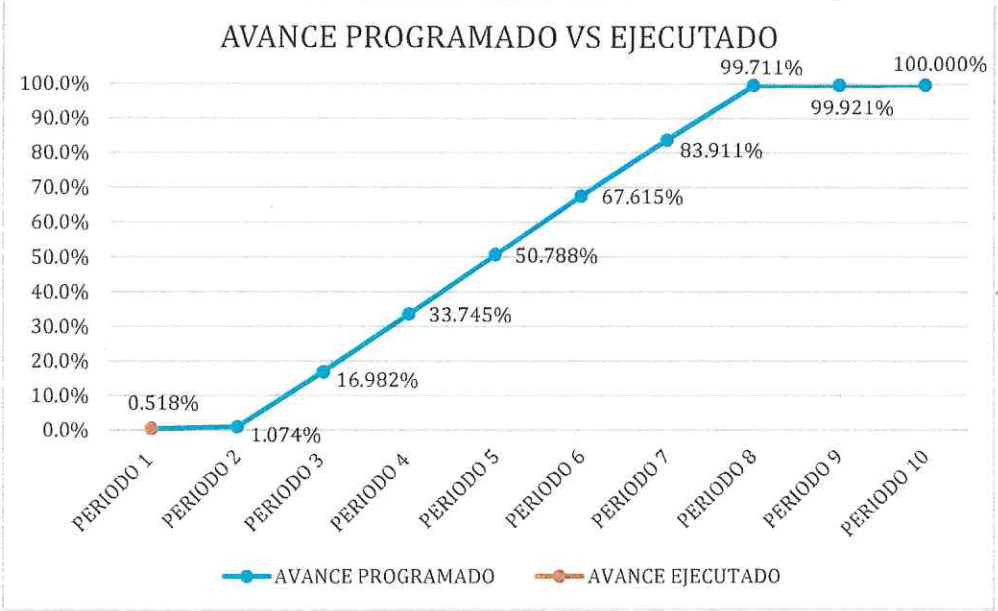

AVANCE DE OBRA %

1.1.1	REALIZAR PRELIMINARES	UNIDADES	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO 1	CANTIDAD ACUMULADA
1.01	Replanteo de obra	Und	425	204	204
1.02	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas del sitio (incluye retiro disposición final)	m2	1700	0	0
1.1.2	REALIZAR ALUMBRADO PÚBLICO				
2.01	Excavación manual en material común del sitio para cimentación de postes de alumbrado público solar (incluye retiro y disposición final)	m3	459	0	0

2.02	Suministro e instalación de poste en fibra de vidrio para alumbrado público (12m 510kg)	UND	425	0	0
2.03	Cimentación para postes de alumbrado público solar	UND	425	0	0
2.04	Suministro e instalación de luminarias solar ELITE III PRO IN-SL. Incluye (Luminaria LED, Panel solar fotovoltaico y batería, soporte para conexiones, brazo metálico galvanizado y collarín antivandálico)	UND	425	0	0
1.1.4	REALIZAR CERTIFICACIÓN RETILAP	N/A	1	0	0
1.1.5	REALIZAR PLAN DE MANEJO AMBIENTAL-PMA	UND	9	1	1
	% Avance de obra		0.519%		

3. GESTIÓN TÉCNICA Y DOCUMENTAL

Oficios y documentos elaborados por el contrato de obra sobre el desarrollo del contrato: solicitudes comunidad, entidades, temas varios e Informes presentados.

- **CORRESPONDENCIA ENVIADA**

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
04/06/2026	N/A	Solicitud de planimetría y/o información técnica de redes existentes en el área de intervención – Contrato de Interventoría No. 019 de 2026.	LUZ NEILA DÍAZ MOGOLLÓN Representante Legal PROYECTOS TRIPLE O S.A.S.	ALCALDÍA MUNICIPAL DE YOPAL DESPACHO DEL ALCALDE

INFORME MENSUAL No. 01

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

04/06/2026	N/A	Solicitud de planimetría de red de gas existente, protocolos de contingencia y contactos de atención para proyecto de iluminación solar en La Pedrera	Carlos Arturo Naranjo Amaya Apoyo a la Dirección de Proyectos	CUSIANAGAS S.A.S. E.S.P. Correo electrónico: correspondenciacusianagas@grupodellano.com Att: Ing Jerson Leonardo Suarez
8/06/2026	N/A	Solicitud de cartografía de red de gas existente, protocolos de contingencia y contactos de atención para proyecto de iluminación solar en La Pedrera	Carlos Arturo Naranjo Amaya Apoyo a la Dirección de Proyectos	ENERCA S.A E.S.P. Att: Ing Gustavo Parra
16/06/2026	EIA-001-26	Solicitud de aprobación de pólizas actualizadas de acuerdo al Acta de Inicio del Contrato No. 019 de 2026	Daniel León Garzón-Director de Proyecto	Arquitecta: LINA MELISA ROJAS VALBUENA Supervisora ASOSUPRO
17/06/2026	EIA-002-26	Radicación Anticipo	Daniel León Garzón-Director de Proyecto	Arquitecta: LINA MELISA ROJAS VALBUENA Supervisora ASOSUPRO

INFORME MENSUAL No. 01

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

Nota: Los comunicados correspondientes a los días 04 al 08 de junio, aunque son anteriores al periodo objeto de reporte, se incluyen debido a su relevancia y relación con los temas analizados, aportando contexto para la comprensión y seguimiento de la información reportada.

- **CORRESPONDENCIA RECIBIDA**


FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
18/06/2026	N/A	Solicitud de información radicado N° 1037432 del 05 de junio del 2026.	JHON ALEXANDER MEDINA Asistente II Distribución y MantenimientoUSIANAGAS	CARLOS ARTURO NARANJO AMAYA Apoyo a la Dirección: PROYECTO EN LA PEDRERA
18/06/2026	N/A	Respuesta a radicado 20260105708	Jorge Ernesto Socadagui DIR. Ingeniería y planeamiento ENERCA	MARIA LINDSEY GONZALES-Comercial ENERGIA INTEGRAL ANDINA

Comités y/o reuniones de trabajo:

FECHA	TEMAS TRATADOS	PARTICIPANTES
04-06-2026	Realizar seguimiento al estado actual del proyecto y evaluar las condiciones preliminares identificadas en el corredor vial objeto de intervención, con el fin de verificar la necesidad de adelantar procesos de gestión predial, identificación de interferencias y demás actividades previas a la ejecución de las obras.	LINA MELISA ROJAS VALBUENA SUPERVISOR ASOSUPRO JOSUÉ NEFTALI VALERO CAMARGO REPRESENTANTE LEGAL ENERGIA INTEGRAL ANDINA SA LUZ NEILA DIAZ MOGOLLON

INFORME MENSUAL No. 01

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

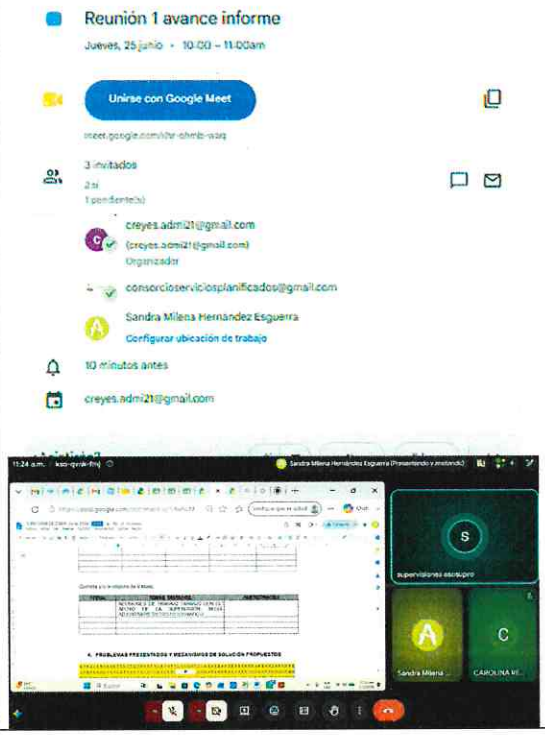		REPRESENTANTE LEGAL PROYECTOS TRIPLE O SAS
25-06-2026	Reunión de trabajo con el apoyo de la supervisión- seguimiento informe mensual 	Supervisión ASOSUPRO CAROLINA REYES-Interventoría SANDRA HERNÁNDEZ- Contratista EIA

4. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MECANISMOS DE SOLUCIÓN PROPUESTOS

A continuación, se detalla el estado de las actividades ejecutadas, identificando las incidencias ocurridas y las acciones correctivas o preventivas aplicadas para garantizar la continuidad del proyecto.

4.1. Actividad: Preliminares

- **Problema Presentado:**

Durante la revisión técnica de la zona objeto de intervención, se identificó la necesidad de complementar la información disponible respecto de la posible existencia de infraestructura de servicios públicos dentro del área de influencia del proyecto, particularmente redes subterráneas que pudieran generar interferencias con la ubicación prevista para los sistemas de iluminación solar.

Esta situación requiere contar con información técnica oficial y actualizada que permita validar las condiciones existentes en el corredor vial y verificar la compatibilidad de los puntos de instalación definidos con la infraestructura actualmente localizada en el sector.

- **Mecanismos de Solución / Mitigación:**

Con el propósito de validar las condiciones existentes y prevenir posibles interferencias durante la ejecución, el día 04 de junio de 2026, la Interventoría remitió comunicación formal a la Alcaldía Municipal de Yopal, solicitando información relacionada con la existencia de redes eléctricas en el sector, así como la planimetría, planos récord, cartografía y demás información técnica disponible del corredor vial.

De igual manera, se solicitó información sobre la infraestructura de servicios públicos existente que pudiera tener incidencia sobre el diseño y la ubicación prevista para los sistemas de iluminación solar.

La información solicitada permitirá fortalecer la validación técnica de los puntos de instalación, identificar oportunamente posibles interferencias y, de ser necesario, realizar los ajustes correspondientes en coordinación con la Supervisión e Interventoría, procurando garantizar la adecuada ejecución de las actividades y evitar afectaciones a la infraestructura existente.

5. ESTADO DEL TIEMPO

Frecuencia.

ESTADO	N° DE DÍAS
NUBLADO	0
LLUVIOSO	0
SOLEADO	22
TOTAL DIAS MES	22

INFORME MENSUAL No. 01

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

OBSERVACIONES:

Estado de las Actividades: Normalidad absoluta (Sin retrasos).

Desarrollo de Labores en Campo: Durante el período reportado, las actividades de campo se ejecutaron bajo condiciones de total normalidad y fluidez, cumpliendo rigurosamente con el cronograma establecido. Este rendimiento óptimo se vio favorecido de manera directa por las condiciones climáticas favorables, registrándose una nula presencia de lluvias que pudieran afectar el rendimiento del personal o de los equipos.

Continuidad de Labores Administrativas: Asimismo, se garantiza que la continuidad del proyecto no se vio interrumpida en ningún momento. De manera paralela e integrada, se avanzó con éxito en las labores administrativas, de coordinación y de organización de la información recolectada en campo. Esto permitió un procesamiento eficiente de los datos técnicos y una planificación estructurada para las siguientes fases.

Conclusión del Periodo: Las condiciones meteorológicas idóneas, sumadas a una correcta alternancia y gestión entre el trabajo de campo y las tareas de gabinete/oficina, permitieron mantener el ritmo de ejecución sin reportar ningún tipo de retraso.

B. CUMPLIMIENTO DE PLANES Y ESPECIFICACIONES

1. MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

Ensayos y pruebas de laboratorio realizadas

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Densidad en terreno Ensayo a compresión en cilindros de concreto C.B.R Muestra inalterada Flexión de Vigas de Concreto Rodadura Asfáltica Límite de Consistencia Desgaste Proctor Gradación Abrasión de Agregados en la Máquina de los ángeles Granulometría Equivalente de Arena otros (Especificar)	N/A	N/A

INFORME MENSUAL No. 01

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

2. SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Relacionar la aplicación de la normatividad vigente sobre seguridad industrial, salud ocupacional y señalización.

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
01/06/2026	Afiliación Parafiscales	Anexo certificados de afiliación
30/06/2026	Validación pago de seguridad social	Planillas de pago adjuntas en el informe SST mensual.
10/06/2026	Inducción SST- Ingeniera Ambiental	Los soportes se pueden evidenciar en el informe mensual SST.
15/06/2026	Entrega de dotación y EPP al personal profesional aprobado.	Los soportes de entrega de EPP y dotación se pueden evidenciar en el informe mensual SST.
10/06/2026	Evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso y periódicas	Los soportes de los exámenes médicos se encuentran en el informe SST mensual.
30/06/2026	Plan de manejo de Tránsito -PMT enviado a la interventoría para aprobación	Plan de manejo de Tránsito

3. MANEJO AMBIENTAL

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
Diseño e implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) para el proyecto.	CUMPLE	Se elaboró el Plan de Manejo Ambiental (PMA) de conformidad con el alcance del proyecto y la normatividad ambiental aplicable. Durante el período reportado se dio inicio a su implementación mediante actividades de planificación, coordinación y seguimiento, en concordancia con la etapa de alistamiento del proyecto.
Socialización del PMA al personal profesional especializado aprobado	CUMPLE	Actividad ejecutada con el personal profesional vinculado al proyecto. Esta actividad se implementará de manera continua con el personal que se incorpore durante la ejecución de la obra, como parte del proceso de inducción, capacitación y sensibilización en los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

Diseño e implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) para el proyecto.		período reportado se dio inicio a su implementación mediante actividades de planificación, coordinación y seguimiento, en concordancia con la etapa de alistamiento del proyecto.
Socialización del PMA al personal profesional especializado aprobado	CUMPLE	Actividad ejecutada con el personal profesional vinculado al proyecto. Esta actividad se implementará de manera continua con el personal que se incorpore durante la ejecución de la obra, como parte del proceso de inducción, capacitación y sensibilización en los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

C. INFORME ADMINISTRATIVO

1. PERSONAL ACTUAL PROFESIONAL VIGENTE

NOMBRE	CARGO	% DEDICACIÓN PERSONA- MES
Lauro Daniel León Garzón	Director de obra	50%
Joaquín Vargas Rodríguez	Residente de obra	100%
Laura Camila Caballero Roldan	Ingeniero Ambiental	30%
Néstor Raúl Canchón Casas	Tecnólogo Electricista	100%
Sandra Milena Hernández Esguerra	Profesional SISOMA	50%

2. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se presenta planilla de pago N°: 6026244447, 6025159055, 9507392938, 6033253680, 6033396031.

Anexo: ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA

3. GESTIÓN SOCIAL

EMPLEO	CANTIDAD
Total empleos generados:	7
Empleos directos generados:	5
Empleos indirectos generados:	2

4. CLASIFICACIÓN DEMOGRÁFICA DE LOS EMPLEOS GENERADOS

INFORME MENSUAL No. 01

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

D. INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURÍDICA DEL PROYECTO

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIO		
ACTA N° Y FECHA	TIEMPO (MESES / DÍAS)	JUSTIFICACIÓN
N/A	N/A	N/A

ADICIÓN		
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	VALOR ($)	JUSTIFICACIÓN
N/A	N/A	N/A

MODIFICACIÓN		
ACTA N° Y FECHA	VALOR ACTUALIZADO ($)	JUSTIFICACIÓN
N/A	N/A	N/A

2. GARANTÍAS: <Describa las pólizas de acuerdo con los actos administrativo-celebrados> SEGÚN ACTA DE INICIO

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	801056816		
ANEXO N°	1	FECHA DE EXPEDICIÓN:	16/06/2026
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	802091981		
ANEXO N°	1		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	17/06/2026		
COMPAÑÍA DE SEGUROS	CONFIANZA- COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.		

GARANTÍAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	09/06/2026	08/09/2027	$ 1.073.979.941,40

INFORME MENSUAL No. 01

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

Anticipo	09/06/2026	08/09/2027	$ 2.684.949.853,50
Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09/06/2026	08/03/2030	$ 536.989.970,70
Estabilidad de la obra	08/03/2027	08/03/2032	$ 1.073.979.941,40
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	09/06/2026	08/03/2029	$ 1.073.979.941,40
Responsabilidad civil extracontractual	23/04/2026	08/03/2027	$ 700.362.000,00

E. INFORME FINANCIERO

1. PAGOS REALIZADOS

ACTA No.	EGRESO No.	FECHA	% EJECUCIÓN	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DESCUENTO	VALOR ACUMULADO
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
TOTALES							


NOTA: El anticipo correspondiente al 50 % del valor del contrato fue desembolsado el 30 de junio de 2026, con el propósito de atender oportunamente los compromisos financieros asociados al pago de proveedores y demás requerimientos necesarios para la ejecución del proyecto.


F. REGISTRO FOTOGRÁFICO


INFORME MENSUAL No. 01


CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.1.1	Realizar Preliminares	EJECUTADO	%
	Replanteo de Obra	204 Und	48%

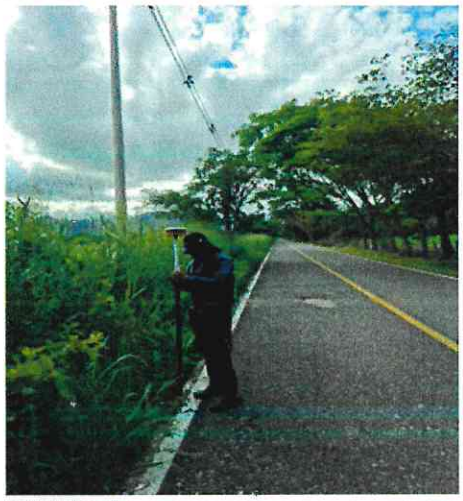

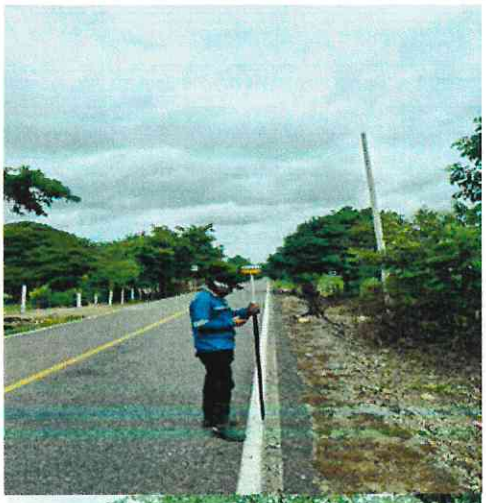

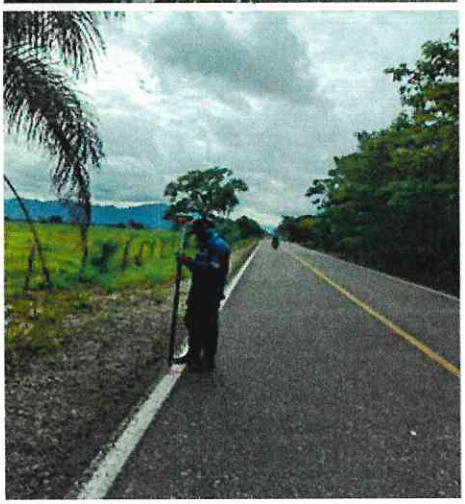

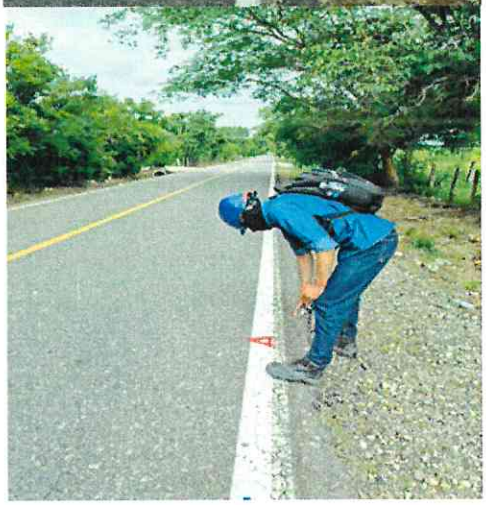

OBSERVACIONES: Pre-replanteo topográfico: Se realizó el análisis **del** corredor vial, identificando la ubicación proyectada para las luminarias y evaluando las condiciones del


INFORME MENSUAL No. 01

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

	suelo.

ITEMS	ACTIVIDAD
2M	**Realizar Plan de Manejo Ambiental-PMA** **Socialización del PMA con el personal profesional aprobado**



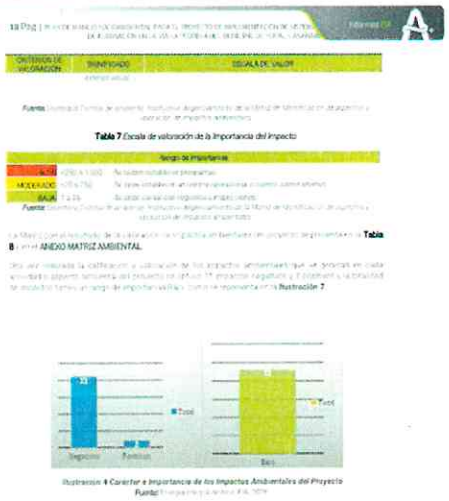



OBSERVACIONES: Se elaboró el PMA y se socializó con el personal profesional especializado aprobado.

INFORME MENSUAL No. 01

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

G. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

Durante el período comprendido entre el 09 al 30 de junio de 2026, el inicio del Contrato de Obra No. 019 de 2026 avanzó satisfactoriamente gracias a una preparación técnica detallada. Durante este período, se realizó la revisión y reconocimiento del terreno, así como el ajuste de los diseños y planos constructivos, incluidos los archivos KMZ, a las condiciones reales de la vía. Este proceso permitió validar y precisar la ubicación proyectada de los postes y luminarias, contribuyendo a reducir posibles errores, evitar reprocesos y optimizar la planificación de las actividades para la posterior etapa de instalación definitiva.

Por otro lado, se garantiza la seguridad y la viabilidad del proyecto mediante dos acciones clave: la coordinación con la empresa de gas para ubicar las tuberías existentes y evitar accidentes durante las excavaciones, y una planeación logística organizada que alineó las compras de materiales con el cronograma. Gracias a esta gestión previa, la obra cuenta con las condiciones de seguridad y los recursos necesarios para avanzar de manera eficiente y sin contratiempos.

H. ANEXOS

Se anexan al presente informe, como parte integral del mismo, los siguientes soportes documentales:

- Registro fotográfico detallado
- Correspondencia recibida y enviada.
- Estado del tiempo
- Actas de comité técnico.
- Copia afiliaciones del personal y pagos de seguridad social (Anexo en informe SST mensual).

INFORME MENSUAL No. 01


CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los 26 días del mes Agosto del 2026.

Firma




Nombre: LAURO DANIEL LEÓN GARZÓN
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 20641705



Firma

Nombre: JOAQUÍN VARGAS RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: BY25007973



ENERGÍA INTEGRAL ANDINA.

www.eia.com.co

ACTAS DE COMITÉ

ACTA COMITÉ TÉCNICO No. 01

ASOSUPRO

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
Villavicencio	07	05	2026	8:00am	10:00am

I. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE CONTRATO:

INTERVENTORÍA

CONTRATO N°: 019 de 2026 **PROYECTO N°:** 2025850010003

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.

CONTRATISTA:

PROYECTOS TRIPLE O SAS

II. CONVOCADOS

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
LINA MELISA ROJAS VALBUENA	SUPERVISOR	ASOSUPRO -ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
JOSUÉ NEFTALI VALERO CAMARGO	REPRESENTANTE LEGAL	ENERGIA INTEGRAL ANDINA SA
LUZ NEILA DIAZ MOGOLLON	REPRESENTANTE LEGAL	PROYECTOS TRIPLE O SAS

ACTA COMITÉ TÉCNICO No. 01

ASOSUPRO

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
Villavicencio	07	05	2026	8:00am	10:00am

III. OBJETIVO

Revisión documental del alcance del proyecto, estudios y diseños, y aprobación definitiva de los mismos para la ejecución del proyecto denominado "Implementación de Sistemas Solares Fotovoltaicos de Iluminación en la Vía La Pedrera del Municipio de Yopal", en el marco del Contrato de Obra No. 019 de 2026 y del Contrato de Interventoría No. 019 de 2026.

IV. DESARROLLO DEL COMITÉ

Siendo las 8:00am del día siete (07) de mayo de 2026, se llevó a cabo reunión presencial con el propósito de realizar la revisión documental del alcance del proyecto, así como de los estudios, diseños, memorias técnicas, especificaciones, planos y demás documentos presentados por el contratista **ENERGÍA INTEGRAL ANDINA S.A.**, correspondientes a la ejecución del Contrato de Obra No. 019 de 2026.

La Interventoría PROYECTOS TRIPLE O S.A.S., en cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría No. 019 de 2026, efectuó la revisión integral de la documentación técnica presentada, verificando su coherencia con el alcance contractual, las especificaciones técnicas del proyecto, la normatividad vigente y las condiciones requeridas para su correcta ejecución.

Como resultado de la revisión realizada, se evidenció que los estudios y diseños presentados contienen la información técnica necesaria para el desarrollo del proyecto y cumplen con

los requisitos contractuales establecidos para la ejecución de las actividades objeto del contrato.

DECISIÓN DEL COMITÉ

Una vez surtida la revisión documental correspondiente y analizados los estudios y diseños presentados por el contratista ENERGÍA INTEGRAL ANDINA S.A., la Interventoría PROYECTOS TRIPLE O S.A.S. emite **APROBACIÓN DEFINITIVA** de los mismos, al verificar que cumplen con las condiciones técnicas, administrativas, legales, financieras y ambientales requeridas para la ejecución del proyecto.

La presente aprobación se otorga sin perjuicio de las responsabilidades técnicas, administrativas, financieras, legales y ambientales que continúan siendo de exclusiva responsabilidad del contratista respecto de la calidad, suficiencia, exactitud y correcta implementación de los estudios y diseños aprobados.

ACTA COMITÉ TÉCNICO No. 01

ASOSUPRO

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
Villavicencio	07	05	2026	8:00am	10:00am

CONCLUSIÓN

En consecuencia, la Interventoría autoriza la continuidad de las actividades asociadas a la ejecución del proyecto, de conformidad con el alcance definido en el Contrato de Obra No. 019 de 2026 y los documentos técnicos objeto de aprobación.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se da por terminado el comité y se firma la presente acta para constancia.

V. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA			
No.	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	Continuar con la ejecución de las actividades del proyecto conforme a los estudios y diseños aprobados y al alcance del Contrato de Obra No. 019 de 2026.	ENERGÍA INTEGRAL ANDINA S.A. (Contratista)	Durante la ejecución del contrato
2	Realizar el seguimiento y control a la ejecución de las actividades autorizadas, verificando el cumplimiento de las condiciones aprobadas.	PROYECTOS TRIPLE O S.A.S. (Interventoría)	Durante la ejecución del contrato
3			
4			
5			

ACTA COMITÉ TÉCNICO No. 01

ASOSUPRO

CIUDAD	FECHA			HORA	
Villavicencio	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	07	05	2026	8:00am	10:00am

VI. PRÓXIMA REUNIÓN
NUEVA REUNIÓN CONVOCADA POR: PENDIENTE DEFINIR
FECHA, HORA Y SITIO DE NUEVA REUNIÓN: Se notificará por correo electrónico

Las decisiones tomadas y los compromisos aquí pactados no modifican por si solos las condiciones de un contrato suscrito con ASOSUPRO.

La presente Acta de Comité es leída y suscrita por los participantes.

VII. PARTICIPANTES	
NOMBRE	**FIRMA**
LUZ NEILA DIAZ MOGOLLON	
JOSUÉ NEFTALI VALERO CAMARGO	
LINA MELISA ROJAS VALBUENA	

ACTA COMITÉ TÉCNICO No. 02

ASOSUPRO

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
Villavicencio	04	06	2026	11:00am	01:00pm

I. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE CONTRATO:

INTERVENTORÍA

CONTRATO N°: 019 de 2026 **PROYECTO N°:** 2025850010003

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.

CONTRATISTA:

PROYECTOS TRIPLE O SAS

II. CONVOCADOS

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
LINA MELISA ROJAS VALBUENA	SUPERVISOR	ASOSUPRO -ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
JOSUÉ NEFTALI VALERO CAMARGO	REPRESENTANTE LEGAL	ENERGIA INTEGRAL ANDINA SA
LUZ NEILA DIAZ MOGOLLON	REPRESENTANTE LEGAL	PROYECTOS TRIPLE O SAS

ACTA COMITÉ TÉCNICO No. 02

ASOSUPRO

CIUDAD	FECHA			HORA	
Villavicencio	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	04	06	2026	11:00am	01:00pm

III. OBJETIVO

Realizar seguimiento al estado actual del proyecto y evaluar las condiciones preliminares identificadas en el corredor vial objeto de intervención, con el fin de verificar la necesidad de adelantar procesos de gestión predial, identificación de interferencias y demás actividades previas a la ejecución de las obras.

IV. DESARROLLO DEL COMITÉ

Siendo las 11:00am del día cuatro (04) de junio de 2026, se llevó a cabo reunión virtual donde se expusieron los resultados de la inspección visual realizada previamente en el área donde se proyecta la implementación de los sistemas solares fotovoltaicos de iluminación sobre la vía La Pedrera del Municipio de Yopal.

Como resultado de dicha verificación en campo, no se evidenció la necesidad de realizar intervenciones directas sobre predios privados ni ocupaciones que impliquen afectaciones prediales, servidumbres, adquisiciones o permisos especiales asociados a la utilización de terrenos particulares para la ejecución del proyecto.

En consecuencia, y con base en la información actualmente disponible, se determina que no aplica por el momento el diligenciamiento o desarrollo de actividades relacionadas con el formato destinado para gestión predial, razón por la cual se deja constancia de que dicho requisito permanecerá pendiente de aplicación hasta tanto se identifiquen condiciones diferentes a las observadas durante la inspección efectuada.

No obstante, lo anterior, la Interventoría considera técnicamente necesario complementar la información disponible mediante la validación de posibles interferencias con infraestructura

CIUDAD	FECHA			HORA	
Villavicencio	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	04	06	2026	11:00am	01:00pm

existente, especialmente redes eléctricas aéreas o subterráneas que pudieran encontrarse dentro del área de influencia del proyecto.

Por lo anterior, se deja constancia de que el día 04 de junio de 2026 la Interventoría remitió comunicación formal a la Alcaldía Municipal de Yopal solicitando información relacionada con:

- Existencia de redes eléctricas en el sector objeto de intervención.
- Planimetría, planos récord, cartografía y demás información técnica disponible del corredor vial.
- Información de infraestructura de servicios públicos que pueda generar interferencias con el diseño planteado para el proyecto.

La solicitud tiene como finalidad contar con información técnica oficial que permita verificar la viabilidad de la ubicación propuesta para los sistemas de iluminación solar y prevenir eventuales conflictos con infraestructura existente.

A la fecha de la presente reunión se encuentra pendiente la respuesta por parte del Municipio de Yopal, motivo por el cual la Interventoría continuará realizando el seguimiento correspondiente hasta obtener la información requerida.

CONCLUSIONES

1. De acuerdo con la inspección visual realizada, no se evidencian afectaciones prediales ni la necesidad de intervención directa sobre predios privados para la ejecución del proyecto.
2. En virtud de lo anterior, por el momento no se considera aplicable el formato destinado para la gestión predial, sin perjuicio de que esta condición pueda ser reevaluada una vez se disponga de información técnica complementaria.
3. El 04 de junio de 2026 la Interventoría radicó solicitud formal ante el Municipio de Yopal requiriendo información sobre redes eléctricas existentes y planimetría del área de intervención.
4. La Interventoría permanecerá atenta a la respuesta oficial del Municipio con el fin de validar posibles interferencias que puedan afectar el diseño o la ubicación de los sistemas solares fotovoltaicos de iluminación.

ACTA COMITÉ TÉCNICO No. 02

ASOSUPRO

CIUDAD	FECHA			HORA	
Villavicencio	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	04	06	2026	11:00am	01:00pm

V. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA			
No.	**COMPROMISOS**	**RESPONSABLE**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
1	Realizar seguimiento a la solicitud de información remitida al Municipio de Yopal respecto a redes eléctricas y planimetría del área de intervención.	Interventoría	Permanente
2	Convocar y desarrollar un comité extraordinario una vez se reciba la respuesta oficial del Municipio.	Interventoría	Una vez recibida la información
3	Socializar y divulgar a las partes interesadas la información técnica obtenida mediante los planos, cartografía o documentación suministrada por el Municipio.	Interventoría	Comité extraordinario
4	Verificar si la información recibida evidencia interferencias, restricciones o condiciones no contempladas inicialmente en los diseños del proyecto.	Interventoría y Contratista	Comité extraordinario
5	En caso de identificarse anomalías, interferencias o condiciones técnicas que obliguen a realizar ajustes de diseño, sobre diseño de iluminación, reubicación de puntos de instalación o modificaciones técnicas del proyecto, informar de manera inmediata a la Supervisión del Contrato para la evaluación y toma de decisiones correspondientes.	Interventoría	Inmediato una vez identificada la situación

ACTA COMITÉ TÉCNICO No. 02


ASOSUPRO


CIUDAD	FECHA			HORA	
Villavicencio	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	04	06	2026	11:00am	01:00pm

VI. PRÓXIMA REUNIÓN
NUEVA REUNIÓN CONVOCADA POR: PENDIENTE DEFINIR
FECHA, HORA Y SITIO DE NUEVA REUNÍON: Se notificará por correo electrónico

Las decisiones tomadas y los compromisos aquí pactados no modifican por si solos las condiciones de un contrato suscrito con ASOSUPRO.

La presente Acta de Comité es leída y suscrita por los participantes.

VII. PARTICIPANTES	
NOMBRE	**FIRMA**
LUZ NEILA DIAZ MOGOLLON	
JOSUÉ NEFTALI VALERO CAMARGO	
LINA MELISA ROJAS VALBUENA	



ENERGÍA INTEGRAL ANDINA.

www.eia.com.co

CORRESPONDENCIA ENVIADA

PROYECTOS TRIPLE O S.A.S.
Nit. 901017241-1

Yopal, Casanare, 04 de junio de 2026

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE YOPAL
DESPACHO DEL ALCALDE
Yopal, Casanare

Asunto: Solicitud de planimetría y/o información técnica de redes existentes en el área de intervención – Contrato de Interventoría No. 019 de 2026.

Respetados señores:

La sociedad **PROYECTOS TRIPLE O S.A.S.**, identificada con **NIT 901.017.241-1**, en calidad de interventora del **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 019 DE 2026**, cuyo objeto es la **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE"**, representada legalmente por la señora **LUZ NEILA DÍAZ MOGOLLÓN**, se permite solicitar respetuosamente el suministro de la información técnica disponible relacionada con el área donde se ejecutará el proyecto.

En particular, agradecemos se nos facilite la planimetría, planos récord, cartografía, levantamientos topográficos, diseños y/o cualquier otra documentación técnica disponible que permita identificar la existencia, ubicación y características de redes de servicios públicos, infraestructura aérea o subterránea y demás elementos que puedan interferir o requerir consideración durante la ejecución de las actividades objeto del proyecto.

Así mismo, solicitamos muy respetuosamente los planos proyectados de la vía que actualmente se encuentra sin pavimentar dentro del área de intervención del proyecto, con el fin de conocer los espacios disponibles para la instalación de postes de los sistemas solares fotovoltaicos de iluminación, así como verificar las condiciones geométricas y de ocupación previstas para dicho corredor vial.

La información solicitada resulta indispensable para el adecuado desarrollo de las labores de interventoría, permitiendo verificar las condiciones actuales del corredor vial, identificar posibles interferencias con infraestructura existente, evaluar riesgos asociados a la ejecución de las obras y garantizar el cumplimiento de los principios de planeación, eficiencia y prevención que rigen la contratación estatal.

Carrera 54D # 135 - 34
Int. 2 Apto 403
Tel. 313 408 3199
Sfé de Bogotá

PROYECTOS TRIPLE O S.A.S.
Nit. 901017241-1

La presente solicitud se realiza en el marco de las actividades de revisión, diagnóstico y verificación previas a la ejecución de las actividades de campo del proyecto, con el fin de contar con los insumos técnicos necesarios para la adecuada planificación, seguimiento y control de las intervenciones a desarrollar.

De igual manera, en caso de que la información requerida repose en otra dependencia o entidad competente, agradecemos se sirvan orientar o gestionar su remisión para los fines anteriormente expuestos.

Agradecemos la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a su amable respuesta.

Cordialmente,

LUZ NEILA DÍAZ MOGOLLÓN
Representante Legal
PROYECTOS TRIPLE O S.A.S.
NIT 901.017.241-1
Interventoría Contrato No. 019 de 2026
Correo: tripleosas@hotmail.com
Celular: 3156094315

ENERGÍA INTEGRAL ANDINA.

www.eia.com.co


Yopal, 4 de junio de 2026


Señores
CUSIANAGAS S.A.S. E.S.P.
Correo electrónico: correspondenciacusianagas@grupodellano.com
Att: Ing Jerson Leonardo Suarez

Asunto: Solicitud de planimetría de red de gas existente, protocolos de contingencia y contactos de atención para proyecto de iluminación solar en La Pedrera

Cordial saludo,

Energía Integral Andina S.A. en calidad de contratista encargado de la ejecución del contrato 019 de 2019 suscrito con Asosupro para la instalación de sistemas de iluminación solar en la zona de La Pedrera, nos permitimos solicitar de manera respetuosa su colaboración con el suministro de la información técnica relacionada con la infraestructura de gas natural existente en el área de intervención que a continuación se describe.

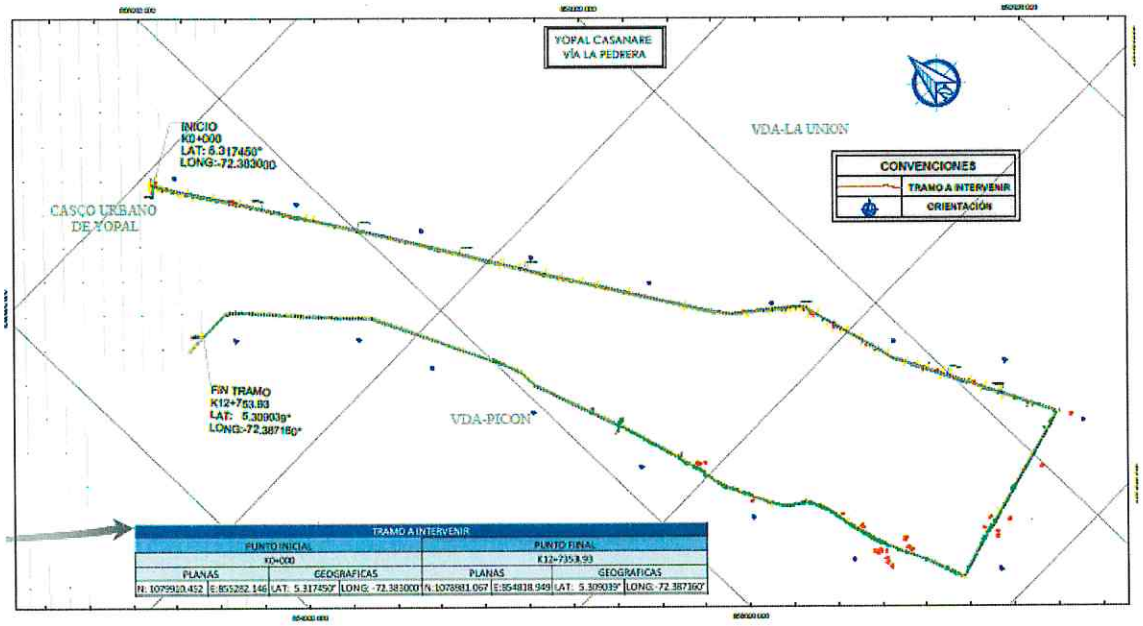

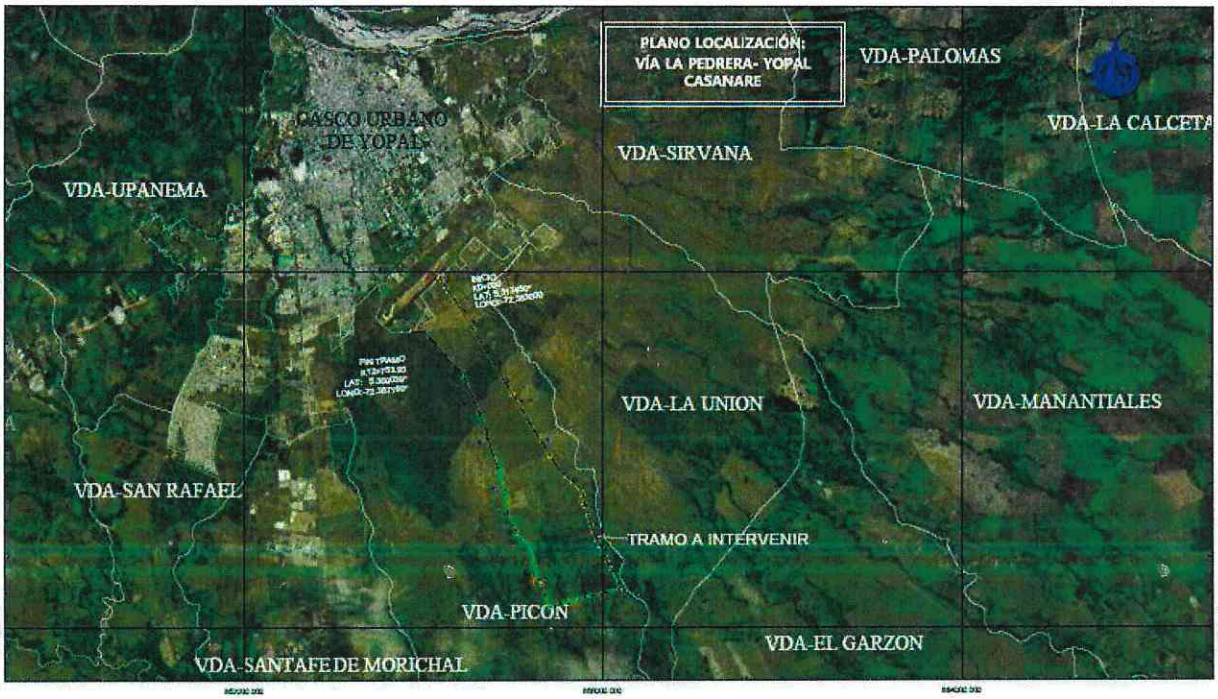

Actualmente, el proyecto contempla la instalación de aproximadamente cuatrocientos veinticinco (425) postes para alumbrado con sistemas solares, actividad que requiere la ejecución de excavaciones y movimientos de terreno en diferentes sectores de la zona.

En este sentido, y con el propósito de garantizar la seguridad de las personas, la integridad de la infraestructura existente y la adecuada planificación de las actividades constructivas, agradecemos nos sea suministrada la siguiente información:

- Planimetría, cartografía o planos actualizados de las redes de gas natural existentes dentro del área de influencia del proyecto.
- Información técnica relevante sobre servidumbres, franjas de seguridad, restricciones de intervención y demás consideraciones que deban ser tenidas en cuenta durante la ejecución de las obras.
- Procedimientos, protocolos y planes de contingencia establecidos por su organización para la atención de emergencias o incidentes asociados a la infraestructura de gas.

- Directorio de contactos operativos y de emergencia para el reporte oportuno de novedades, hallazgos, afectaciones o situaciones de riesgo que eventualmente puedan presentarse durante el desarrollo de los trabajos.

La información solicitada permitirá implementar las medidas preventivas y de control necesarias para mitigar riesgos operacionales, proteger la infraestructura existente y asegurar la ejecución segura y eficiente del proyecto.

Agradecemos de antemano su valiosa colaboración y quedamos atentos a cualquier información adicional que requieran para atender la presente solicitud.
Cordialmente,

Carlos Arturo Naranjo Amaya
Gerente de Proyectos
Energía Integral Andina S.A.

ENERGÍA INTEGRAL ANDINA.

www.eia.com.co


Yopal, 8 de junio de 2026


Señores
ENERCA S.A E.S.P.
Correo electrónico: correspondencia@enerca.com.co
Att: Ing Gustavo Parra

Asunto: Solicitud de cartografía de red de gas existente, protocolos de contingencia y contactos de atención para proyecto de iluminación solar en La Pedrera

Cordial saludo,

Energía Integral Andina S.A. en calidad de contratista encargado de la ejecución del contrato 019 de 2019 suscrito con Asosupro para la instalación de sistemas de iluminación solar en la zona de La Pedrera, nos permitimos solicitar de manera respetuosa su colaboración con el suministro de la información técnica relacionada con la infraestructura de gas natural existente en el área de intervención que a continuación se describe.

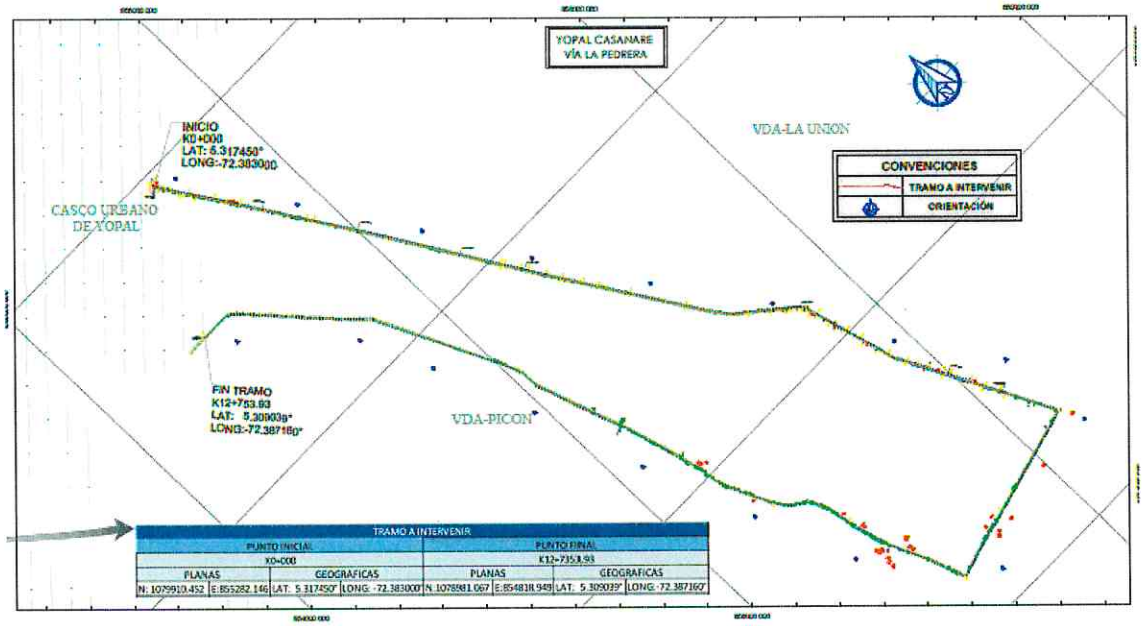

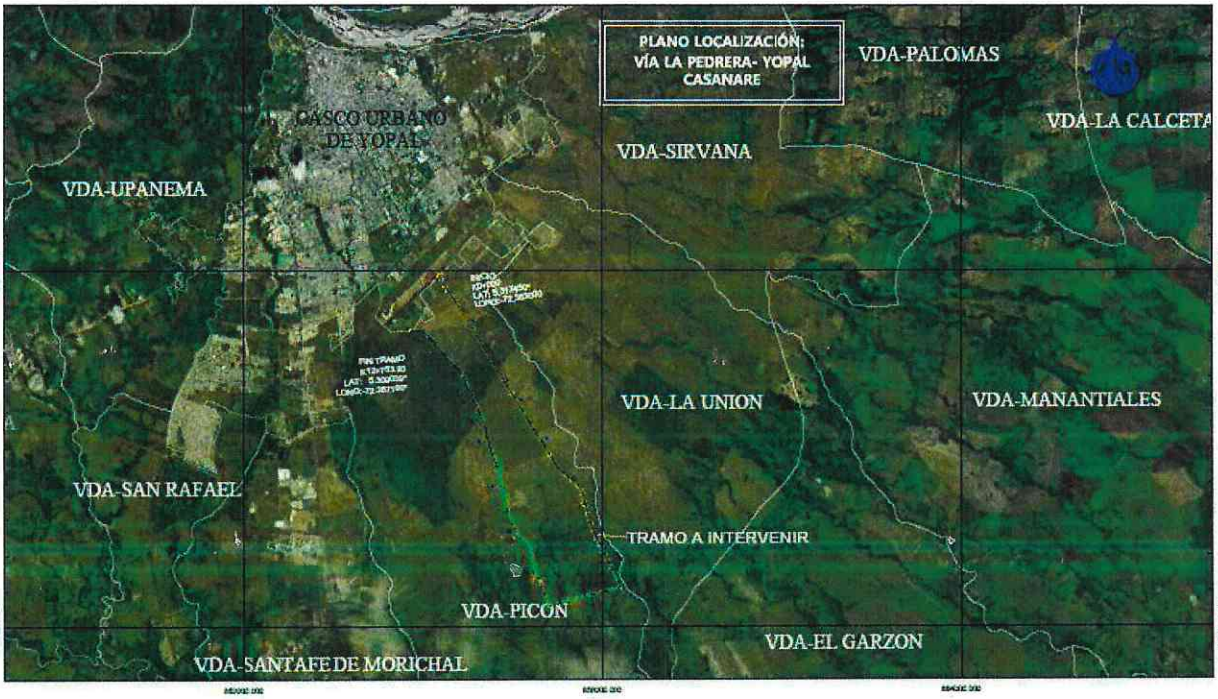

Actualmente, el proyecto contempla la instalación de aproximadamente cuatrocientos veinticinco (425) postes para alumbrado con sistemas solares, actividad que requiere la ejecución de excavaciones y movimientos de terreno en diferentes sectores de la zona.

En este sentido, y con el propósito de garantizar la seguridad de las personas, la integridad de la infraestructura existente y la adecuada planificación de las actividades constructivas, agradecemos nos sea suministrada la siguiente información:

- Planimetría, cartografía o planos actualizados de las redes de gas natural existentes dentro del área de influencia del proyecto.
- Información técnica relevante sobre servidumbres, franjas de seguridad, restricciones de intervención y demás consideraciones que deban ser tenidas en cuenta durante la ejecución de las obras.
- Procedimientos, protocolos y planes de contingencia establecidos por su organización para la atención de emergencias o incidentes asociados a la infraestructura de gas.

- Directorio de contactos operativos y de emergencia para el reporte oportuno de novedades, hallazgos, afectaciones o situaciones de riesgo que eventualmente puedan presentarse durante el desarrollo de los trabajos.

La información solicitada permitirá implementar las medidas preventivas y de control necesarias para mitigar riesgos operacionales, proteger la infraestructura existente y asegurar la ejecución segura y eficiente del proyecto.

Agradecemos de antemano su valiosa colaboración y quedamos atentos a cualquier información adicional que requieran para atender la presente solicitud.
Cordialmente,

Carlos Arturo Naranjo Amaya
Gerente de Proyectos
Energía Integral Andina S.A.

ENERGÍA INTEGRAL ANDINA.

www.eia.com.co

EIA-002-26
Referencia

Bogotá, 17 de junio de 2026

Arquitecta:
LINA MELISA ROJAS VALBUENA
Supervisora
ASOSUPRO

Asunto: Radicación de documentos para trámite de anticipo del Contrato No. 019 de 2026

Cordial saludo,


Me permito remitir para su revisión y aprobación documentos correspondientes al anticipo del Contrato No. 019 de 2026, cuyo objeto es la implementación de sistemas solares fotovoltaicos de iluminación en la vía La Pedrera del municipio de Yopal, Casanare, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos contractuales establecidos y proceder con el inicio de la ejecución del contrato.

Agradezco la atención prestada y quedo atento a sus comentarios y a la aprobación

Atentamente,

Daniel León Garzón

Director de Proyecto



ENERGÍA INTEGRAL ANDINA.

www.eia.com.co

EIA-001-26
Referencia

Bogotá, 16 de junio de 2026

Arquitecta:
LINA MELISA ROJAS VALBUENA
Supervisora
ASOSUPRO

Asunto: Solicitud de aprobación de pólizas actualizadas de acuerdo al Acta de Inicio del Contrato No. 019 de 2026

Cordial saludo,

Me permito remitir para su revisión y aprobación las pólizas actualizadas de acuerdo al Acta Inicio del Contrato No. 019 de 2026, cuyo objeto es la implementación de sistemas solares fotovoltaicos de iluminación en la vía La Pedrera del municipio de Yopal, Casanare, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos contractuales establecidos y proceder con el inicio de la ejecución del contrato.

Agradezco la atención prestada y quedo atento a sus comentarios y a la aprobación

Atentamente,

Daniel León Garzón

Director de Proyecto

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

GARANTÍA ÚNICA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA 801056816
CERTIFICADO GU246984
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO

SUCURSAL: C. ANDINO USUARIO: KDMORA TIPO CERTIFICADO: Endoso FECHA EXPEDICION: DD 16 MM 06 AAAA 2026

TOMADOR/GARANTIZADO	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD:	SAN ANDRES
E-MAIL:	GRACIELA.RODRIGUEZ@EISA.COM.CO	TELÉFONO:	6684343
ASEGURADO:	ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO	C.C. O NIT:	901445387 3
DIRECCIÓN:	CL 32 39 11 BRR barzal alto	CIUDAD: VILLAVICENCIO	TEL. 3108708920
BENEFICIARIO:	ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO	C.C. O NIT:	901445387 3
DIRECCIÓN:	CL 32 39 11 BRR barzal alto	CIUDAD: VILLAVICENCIO	TEL. 3108708920

VIGENCIA		VALOR ASEGURADO EN PESOS		
DESDE DD 23 MM 04 AAAA 2026	HASTA DD 08 MM 03 AAAA 2032	ANTERIOR	ESTA MODIFICACIÓN	NUEVA
		6,443,879,648.40	0.00	6,443,879,648.40

INTERMEDIARIO		COASEGURO				PRIMA		
%PART	NOMBRE	COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRM:	MONEDA	VALORES
100.00	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS SAR LTDA ASESORES DE SEGU					PRIMA NETA	PESOS	
						CARGOS DE EMISIÓN	PESOS	
						IVA	PESOS	
						TOTAL		

AMPAROS	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta	VALOR ASEGURADO ANTERIOR EN PESOS	VALOR ASEGURADO NUEVO EN PESOS	VALOR PRIMA EN PESOS	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE Mínimo	DEDUCIBLE Hr
Cumplimiento	09-06-2026	08-09-2027	1,073,979,941.40	1,073,979,941.40				
Anticipo	09-06-2026	08-09-2027	2,684,949,853.50	2,684,949,853.50				
Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09-06-2026	08-03-2030	536,989,970.70	536,989,970.70				
Estabilidad de la obra	08-03-2027	08-03-2032	1,073,979,941.40	1,073,979,941.40				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	09-06-2026	08-03-2029	1,073,979,941.40	1,073,979,941.40				

OBJETO DE LA GARANTIA:

OBJETO DE MOFICICACIÓN: POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO CON FECHA DE JUNIO 09,2026.
DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE MOFICICACIÓN: DE ACUERDO CON LO REQUERIDO, SE MODIFICA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO.
DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR, CONTINUAN VIGENTES.

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO N° 019 DE 2026, CUYO OBJETO ES:

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.

ASEGURADO / BENEFICIARIOS: ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO" IDENTIFICADA CON EL NIT 901.445.387-3 Y EL MUNICIPIO DE YOPAL.

STA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA. LAS CARÁTULAS ENVIADAS VIA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL, CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LOS CANALES DE ATENCIÓN QUE SE ENCUENTAN EN LA PÁGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO, ***VER NOTA*** EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETANDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ÁRTICULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES. LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS. LA PRESENTE GARANTIA NO EXPIRARA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDA CON FUNDAMENTO EN ELLA O POR REVOCACION UNILATERAL POR PARTE DEL TOMADOR O DE LA COMPAÑIA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL NUMERAL 19 DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993. AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL. EL PRESENTE CERTIFICADO DE SEGUROS SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA 801056816 Y CERTIFICADO GU246762

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

(415)7709998911901(8020)0000000000

TOMADOR

María Juana Herrera Rodríguez
CC: 52.420.596

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

SU-FO-01-02

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE - ORIGINAL - ASEGURADO

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

GARANTÍA ÚNICA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA 801056816
CERTIFICADO GU246984
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO

SUCURSAL: C. ANDINO USUARIO: KDMORA TIPO CERTIFICADO: Endoso FECHA EXPEDICION: DD 16 MM 06 AAAA 2026

TOMADOR/GARANTIZADO	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD:	SAN ANDRES
E-MAIL:	GRACIELA.RODRIGUEZ@EISA.COM.CO	TELÉFONO:	6684343
ASEGURADO:	ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO	C.C. O NIT:	901445387 3
DIRECCIÓN:	CL 32 39 11 BRR barzal alto	CIUDAD: VILLAVICENCIO	TEL. 3108708920
BENEFICIARIO:	ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO	C.C. O NIT:	901445387 3
DIRECCIÓN:	CL 32 39 11 BRR barzal alto	CIUDAD: VILLAVICENCIO	TEL. 3108708920

VIGENCIA		VALOR ASEGURADO EN PESOS		
DD MM AAAA	DD MM AAAA	ANTERIOR	ESTA MODIFICACIÓN	NUEVA
DESDE 23 04 2026	HASTA 08 03 2032	6,443,879,648.40	0.00	6,443,879,648.40

INTERMEDIARIO		COASEGURO				PRIMA		
%PART	NOMBRE	COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRM:	MONEDA	VALORES
100.00	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS SAR LTDA ASESORES DE SEGU					PRIMA NETA	PESOS	
						CARGOS DE EMISIÓN	PESOS	
						IVA	PESOS	
						TOTAL		

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA. LAS CARÁTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL, CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LOS CANALES DE ATENCIÓN QUE SE ENCUENTAN EN LA PÁGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO, ***VER NOTA*** EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETANDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ARTICULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES. LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS. LA PRESENTE GARANTIA NO EXPIRARA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDA CON FUNDAMENTO EN ELLA O POR REVOCACION UNILATERAL POR PARTE DEL TOMADOR O DE LA COMPAÑIA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL NUMERAL 19 DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993. AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL. EL PRESENTE CERTIFICADO DE SEGUROS SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA 801056816 Y CERTIFICADO GU246762

(415)7709998911901(8020)0000000000

TOMADOR

María Juana Herrera Rodríguez
CC: 52.420.596

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SU-FO-01-02

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE - ORIGINAL - ASEGURADO

Dirección para notificaciones: Calle 82 Nº 11 - 37 Piso 7 - Bogotá, D.C.- Colombia

Fecha de Impresion: Tue, 16 Jun 2026 13:59:06

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

GARANTÍA ÚNICA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA 801056816
CERTIFICADO GU246984
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO

SUCURSAL: C. ANDINO USUARIO: KDMORA TIPO CERTIFICADO: Endoso FECHA EXPEDICION: DD 16 MM 06 AAAA 2026

TOMADOR/GARANTIZADO	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD:	SAN ANDRES
E-MAIL:	GRACIELA.RODRIGUEZ@EISA.COM.CO	TELÉFONO:	6684343
ASEGURADO:	ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO	C.C. O NIT:	901445387 3
DIRECCIÓN:	CL 32 39 11 BRR barzal alto	CIUDAD: VILLAVICENCIO	TEL. 3108708920
BENEFICIARIO:	ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO	C.C. O NIT:	901445387 3
DIRECCIÓN:	CL 32 39 11 BRR barzal alto	CIUDAD: VILLAVICENCIO	TEL. 3108708920

VIGENCIA		VALOR ASEGURADO EN PESOS		
	DD MM AAAA			
DESDE	23 04 2026	ANTERIOR	ESTA MODIFICACIÓN	NUEVA
HASTA	08 03 2032	6,443,879,648.40	0.00	6,443,879,648.40

INTERMEDIARIO		COASEGURO				PRIMA		
%PART	NOMBRE	COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRM:	MONEDA	VALORES
100.00	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS SAR LTDA ASESORES DE SEGU					PRIMA NETA	PESOS	
						CARGOS DE EMISIÓN	PESOS	
						IVA	PESOS	
						TOTAL		

AMPAROS	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta	VALOR ASEGURADO ANTERIOR EN PESOS	VALOR ASEGURADO NUEVO EN PESOS	VALOR PRIMA EN PESOS	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE Mínimo	DEDUCIBLE Hr
Cumplimiento	09-06-2026	08-09-2027	1,073,979,941.40	1,073,979,941.40				
Anticipo	09-06-2026	08-09-2027	2,684,949,853.50	2,684,949,853.50				
Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09-06-2026	08-03-2030	536,989,970.70	536,989,970.70				
Estabilidad de la obra	08-03-2027	08-03-2032	1,073,979,941.40	1,073,979,941.40				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	09-06-2026	08-03-2029	1,073,979,941.40	1,073,979,941.40				

OBJETO DE LA GARANTIA:

OBJETO DE MOFICICACIÓN: POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO CON FECHA DE JUNIO 09,2026.
DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE MOFICICACIÓN: DE ACUERDO CON LO REQUERIDO, SE MODIFICA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO.
DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR, CONTINUAN VIGENTES.

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO N° 019 DE 2026, CUYO OBJETO ES:

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.

ASEGURADO / BENEFICIARIOS: ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO" IDENTIFICADA CON EL NIT 901.445.387-3 Y EL MUNICIPIO DE YOPAL.

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA. LAS CARÁTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL, CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LOS CANALES DE ATENCIÓN QUE SE ENCUENTAN EN LA PÁGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO, ***VER NOTA*** EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETANDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ÁRTICULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES. LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS. LA PRESENTE GARANTIA NO EXPIRARA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDA CON FUNDAMENTO EN ELLA O POR REVOCACION UNILATERAL POR PARTE DEL TOMADOR O DE LA COMPAÑIA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL NUMERAL 19 DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993. AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: 1) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL. EL PRESENTE CERTIFICADO DE SEGUROS SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA 801056816 Y CERTIFICADO GU246762

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TOMADOR

(415)7709998911901(8020)0000000000

María Juana Herrera Rodríguez
CC: 52.420.596

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

SU-FO-01-02

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

GARANTÍA ÚNICA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA 801056816
CERTIFICADO GU246984
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO

SUCURSAL: C. ANDINO USUARIO: KDMORA TIPO CERTIFICADO: Endoso FECHA EXPEDICION: DD 16 MM 06 AAAA 2026

TOMADOR/GARANTIZADO	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD:	SAN ANDRES
E-MAIL:	GRACIELA.RODRIGUEZ@EISA.COM.CO	TELÉFONO:	6684343
ASEGURADO:	ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO	C.C. O NIT:	901445387 3
DIRECCIÓN:	CL 32 39 11 BRR barzal alto	CIUDAD: VILLAVICENCIO	TEL. 3108708920
BENEFICIARIO:	ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO	C.C. O NIT:	901445387 3
DIRECCIÓN:	CL 32 39 11 BRR barzal alto	CIUDAD: VILLAVICENCIO	TEL. 3108708920

VIGENCIA		VALOR ASEGURADO EN PESOS		
DESDE DD 23 MM 04 AAAA 2026	HASTA DD 08 MM 03 AAAA 2032	ANTERIOR	ESTA MODIFICACIÓN	NUEVA
		6,443,879,648.40	0.00	6,443,879,648.40

INTERMEDIARIO		COASEGURO				PRIMA		
%PART	NOMBRE	COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRM:	MONEDA	VALORES
100.00	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS SAR LTDA ASESORES DE SEGU					PRIMA NETA	PESOS	
						CARGOS DE EMISIÓN	PESOS	
						IVA	PESOS	
						TOTAL		

STA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA. LAS CARÁTULAS ENVIADAS ÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL, CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LOS CANALES DE ATENCIÓN QUE SE ENCUENTAN EN LA PÁGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO, ***VER NOTA*** EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETANDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ÁRTICULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES. LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS. LA PRESENTE GARANTIA NO EXPIRARA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDA CON FUNDAMENTO EN ELLA O POR REVOCACION UNILATERAL POR PARTE DEL TOMADOR O DE LA COMPAÑIA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL NUMERAL 19 DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993. AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL. EL PRESENTE CERTIFICADO DE SEGUROS SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA 801056816 Y CERTIFICADO GU246762

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

(415)7709998911901(8020)0000000000

TOMADOR

María Juana Herrera Rodríguez
CC: 52.420.596

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

SU-FO-01-02

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

GARANTÍA ÚNICA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA 801056816
CERTIFICADO GU246984
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO

SUCURSAL: C. ANDINO USUARIO: KDMORA TIPO CERTIFICADO: Endoso FECHA EXPEDICION: DD 16 MM 06 AAAA 2026

TOMADOR/GARANTIZADO	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD:	SAN ANDRES
E-MAIL:	GRACIELA.RODRIGUEZ@EISA.COM.CO	TELÉFONO:	6684343
ASEGURADO:	ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO	C.C. O NIT:	901445387 3
DIRECCIÓN:	CL 32 39 11 BRR barzal alto	CIUDAD: VILLAVICENCIO	TEL. 3108708920
BENEFICIARIO:	ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO	C.C. O NIT:	901445387 3
DIRECCIÓN:	CL 32 39 11 BRR barzal alto	CIUDAD: VILLAVICENCIO	TEL. 3108708920

VIGENCIA		VALOR ASEGURADO EN PESOS		
DESDE DD 23 MM 04 AAAA 2026	HASTA DD 08 MM 03 AAAA 2032	ANTERIOR	ESTA MODIFICACIÓN	NUEVA
		6,443,879,648.40	0.00	6,443,879,648.40

INTERMEDIARIO		COASEGURO				PRIMA		
%PART	NOMBRE	COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRM:	MONEDA	VALORES
100.00	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS SAR LTDA ASESORES DE SEGU					PRIMA NETA	PESOS	
						CARGOS DE EMISIÓN	PESOS	
						IVA	PESOS	
						TOTAL		

AMPAROS	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta	VALOR ASEGURADO ANTERIOR EN PESOS	VALOR ASEGURADO NUEVO EN PESOS	VALOR PRIMA EN PESOS	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE Mínimo	DEDUCIBLE Hr
Cumplimiento	09-06-2026	08-09-2027	1,073,979,941.40	1,073,979,941.40				
Anticipo	09-06-2026	08-09-2027	2,684,949,853.50	2,684,949,853.50				
Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09-06-2026	08-03-2030	536,989,970.70	536,989,970.70				
Estabilidad de la obra	08-03-2027	08-03-2032	1,073,979,941.40	1,073,979,941.40				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	09-06-2026	08-03-2029	1,073,979,941.40	1,073,979,941.40				

OBJETO DE LA GARANTIA:

OBJETO DE MOFICICACIÓN: POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO CON FECHA DE JUNIO 09,2026.
DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE MOFICICACIÓN: DE ACUERDO CON LO REQUERIDO, SE MODIFICA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO.
DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR, CONTINUAN VIGENTES.

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO N° 019 DE 2026, CUYO OBJETO ES:

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.

ASEGURADO / BENEFICIARIOS: ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO" IDENTIFICADA CON EL NIT 901.445.387-3 Y EL MUNICIPIO DE YOPAL.

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA. LAS CARÁTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL, CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LOS CANALES DE ATENCIÓN QUE SE ENCUENTAN EN LA PÁGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO, ***VER NOTA*** EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETANDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ÁRTICULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES. LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS. LA PRESENTE GARANTIA NO EXPIRARA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDA CON FUNDAMENTO EN ELLA O POR REVOCACION UNILATERAL POR PARTE DEL TOMADOR O DE LA COMPAÑIA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL NUMERAL 19 DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993. AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL. EL PRESENTE CERTIFICADO DE SEGUROS SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA 801056816 Y CERTIFICADO GU246762

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

(415)7709998911901(8020)0000000000

TOMADOR

María Juana Herrera Rodriguez
CC: 52.420.596

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

SU-FO-01-02

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE - SEGUNDA COPIA - INTERMEDIARIO

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

GARANTÍA ÚNICA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA 801056816
CERTIFICADO GU246984
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO

SUCURSAL: C. ANDINO USUARIO: KDMORA TIPO CERTIFICADO: Endoso FECHA EXPEDICION: DD 16 MM 06 AAAA 2026

TOMADOR/GARANTIZADO	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD:	SAN ANDRES
E-MAIL:	GRACIELA.RODRIGUEZ@EISA.COM.CO	TELÉFONO:	6684343
ASEGURADO:	ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO	C.C. O NIT:	901445387 3
DIRECCIÓN:	CL 32 39 11 BRR barzal alto	CIUDAD: VILLAVICENCIO	TEL. 3108708920
BENEFICIARIO:	ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO	C.C. O NIT:	901445387 3
DIRECCIÓN:	CL 32 39 11 BRR barzal alto	CIUDAD: VILLAVICENCIO	TEL. 3108708920

VIGENCIA		VALOR ASEGURADO EN PESOS		
DESDE DD 23 MM 04 AAAA 2026	HASTA DD 08 MM 03 AAAA 2032	ANTERIOR	ESTA MODIFICACIÓN	NUEVA
		6,443,879,648.40	0.00	6,443,879,648.40

INTERMEDIARIO		COASEGURO				PRIMA		
%PART	NOMBRE	COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRM:	MONEDA	VALORES
100.00	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS SAR LTDA ASESORES DE SEGU					PRIMA NETA	PESOS	
						CARGOS DE EMISIÓN	PESOS	
						IVA	PESOS	
						TOTAL		

STA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA. LAS CARÁTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL, CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LOS CANALES DE ATENCIÓN QUE SE ENCUENTAN EN LA PÁGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO, ***VER NOTA*** EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETANDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ÁRTICULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-RÉGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES. LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS. LA PRESENTE GARANTIA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDA CON FUNDAMENTO EN ELLA O POR REVOCACION UNILATERAL POR PARTE DEL TOMADOR O DE LA COMPAÑIA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL NUMERAL 19 DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993. AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL. EL PRESENTE CERTIFICADO DE SEGUROS SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA 801056816 Y CERTIFICADO GU246762

(415)7709998911901(8020)0000000000

TOMADOR

María Juana Herrera Rodriguez
CC: 52.420.598

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SU-FO-01-02

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE - SEGUNDA COPIA - INTERMEDIARIO

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

GARANTÍA ÚNICA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA 801056816
CERTIFICADO GU246984
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO

SUCURSAL: C. ANDINO USUARIO: KDMORA TIPO CERTIFICADO: Endoso FECHA EXPEDICION: DD 16 MM 06 AAAA 2026

TOMADOR/GARANTIZADO	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD:	SAN ANDRES
E-MAIL:	GRACIELA.RODRIGUEZ@EISA.COM.CO	TELÉFONO:	6684343
ASEGURADO:	ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO	C.C. O NIT:	901445387 3
DIRECCIÓN:	CL 32 39 11 BRR barzal alto	CIUDAD: VILLAVICENCIO	TEL. 3108708920
BENEFICIARIO:	ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO	C.C. O NIT:	901445387 3
DIRECCIÓN:	CL 32 39 11 BRR barzal alto	CIUDAD: VILLAVICENCIO	TEL. 3108708920

VIGENCIA		VALOR ASEGURADO EN PESOS		
DESDE DD 23 MM 04 AAAA 2026	HASTA DD 08 MM 03 AAAA 2032	ANTERIOR 6,443,879,648.40	ESTA MODIFICACIÓN 0.00	NUEVA 6,443,879,648.40

INTERMEDIARIO		COASEGURO				PRIMA		
%PART	NOMBRE	COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRM:	MONEDA	VALORES
100.00	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS SAR LTDA ASESORES DE SEGU					PRIMA NETA	PESOS	
						CARGOS DE EMISIÓN	PESOS	
						IVA	PESOS	
						TOTAL		

AMPAROS	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta	VALOR ASEGURADO ANTERIOR EN PESOS	VALOR ASEGURADO NUEVO EN PESOS	VALOR PRIMA EN PESOS	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE Mínimo	DEDUCIBLE Hr
Cumplimiento	09-06-2026	08-09-2027	1,073,979,941.40	1,073,979,941.40				
Anticipo	09-06-2026	08-09-2027	2,684,949,853.50	2,684,949,853.50				
Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09-06-2026	08-03-2030	536,989,970.70	536,989,970.70				
Estabilidad de la obra	08-03-2027	08-03-2032	1,073,979,941.40	1,073,979,941.40				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	09-06-2026	08-03-2029	1,073,979,941.40	1,073,979,941.40				

OBJETO DE LA GARANTIA:

OBJETO DE MOFICICACIÓN: POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO CON FECHA DE JUNIO 09,2026.
DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE MOFICICACIÓN: DE ACUERDO CON LO REQUERIDO, SE MODIFICA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO.
DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR, CONTINUAN VIGENTES.

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO N° 019 DE 2026, CUYO OBJETO ES:

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.

ASEGURADO / BENEFICIARIOS: ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO" IDENTIFICADA CON EL NIT 901.445.387-3 Y EL MUNICIPIO DE YOPAL.

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA. LAS CARÁTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL, CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LOS CANALES DE ATENCIÓN QUE SE ENCUENTAN EN LA PÁGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO, ***VER NOTA*** EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETANDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ÁRTICULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES. LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS. LA PRESENTE GARANTIA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDA CON FUNDAMENTO EN ELLA O POR REVOCACION UNILATERAL POR PARTE DEL TOMADOR O DE LA COMPAÑIA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL NUMERAL 19 DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993. AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL. EL PRESENTE CERTIFICADO DE SEGUROS SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA 801056816 Y CERTIFICADO GU246762

(415)7709998911901(8020)0000000000

TOMADOR

María Juana Herrera Rodríguez
CC: 52.420.598

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SU-FO-01-02

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

GARANTÍA ÚNICA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA 801056816
CERTIFICADO GU246984
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO

SUCURSAL: C. ANDINO USUARIO: KDMORA TIPO CERTIFICADO: Endoso FECHA EXPEDICION: DD 16 MM 06 AAAA 2026

TOMADOR/GARANTIZADO	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD:	SAN ANDRES
E-MAIL:	GRACIELA.RODRIGUEZ@EISA.COM.CO	TELÉFONO:	6684343
ASEGURADO:	ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO	C.C. O NIT:	901445387 3
DIRECCIÓN:	CL 32 39 11 BRR barzal alto	CIUDAD: VILLAVICENCIO	TEL. 3108708920
BENEFICIARIO:	ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO	C.C. O NIT:	901445387 3
DIRECCIÓN:	CL 32 39 11 BRR barzal alto	CIUDAD: VILLAVICENCIO	TEL. 3108708920

VIGENCIA		VALOR ASEGURADO EN PESOS		
	DD MM AAAA	ANTERIOR	ESTA MODIFICACIÓN	NUEVA
DESDE	23 04 2026	6,443,879,648.40	0.00	6,443,879,648.40
HASTA	08 03 2032			

INTERMEDIARIO		COASEGURO				PRIMA		
%PART	NOMBRE	COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRM:	MONEDA	VALORES
100.00	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS SAR LTDA ASESORES DE SEGU					PRIMA NETA	PESOS	
						CARGOS DE EMISIÓN	PESOS	
						IVA	PESOS	
						TOTAL		

STA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA. LAS CARÁTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL, CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LOS CANALES DE ATENCIÓN QUE SE ENCUENTAN EN LA PÁGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO, ***VER NOTA*** EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETANDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ÁRTICULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES. LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS. LA PRESENTE GARANTIA NO EXPIRARA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDA CON FUNDAMENTO EN ELLA O POR REVOCACION UNILATERAL POR PARTE DEL TOMADOR O DE LA COMPAÑIA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL NUMERAL 19 DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993. AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL. EL PRESENTE CERTIFICADO DE SEGUROS SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA 801056816 Y CERTIFICADO GU246762

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

(415)7709998911901(8020)0000000000

TOMADOR

María Juana Herrera Rodriguez
CC: 52.420.596

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

SU-FO-01-02

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE - TERCERA COPIA - SUCURSAL/OFICINA EXPEDIDORA

CONFIANZA

Swiss Re Corporate Solutions

NIT: 860.070.374-9

Referencia para pago electrónico: 0000000000

Nit: 860533206 **DV:** 8

Tomador: ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A. QUE PODRA ABREVIARSE E I A S.A

Póliza: 801056816 **Certificado:** GU246984 **SUCURSAL:** C. ANDINO

Valor Póliza:$ 0

FECHA DE DD MM AAAA

Canales de Pago:

- PSE en nuestra pagina web www.confianza.com.co en Pagos Confianza PC, registrese con c.c. o nit y el dígito de verificación, seleccione la opción: PSE/tarjeta de crédito.

- En entidades bancarias y corresponsales: (con código de barras, presentando este cupón)

Bancos:
BBVA Davivienda Banco de Bogotá

Corresponsales bancarios:
Corresponsales bancarios de Bancolombia
Grupo Éxito-Carulla
Surtimax
Olímpica
Movilred
Grupo Gelsa
Corresponsal Daviplata-punto red
Otros consúltelos en nuestra página web.
Copidrogas
Red Cerca
EDEQ
Full recarga

CANTIDAD DE CHEQUES	COD. BANCO	CHEQUE No.	VALOR
		CHEQUES $	
		EFECTIVO $	
		(*) TOTAL	

(415)7709998911901(8020)0000000000

IMPORTANTE:

- Si se requiere pagar más de una póliza, genere su cupón de pago en www.confianza.com.co en Pagos Confianza PC, registrese con c.c. o nit y el dígito de verificación y seleccione las pólizas en la opción: Cupón de pagos.
- Es importante que esté actualizado su correo electrónico ya que a este le llegará su recibo de caja en línea, si paga por estos medios.
- No se reciben pagos mixtos.
(*) el valor a pagar puede ser menor o igual al valor de la póliza. No se reciben valores mayores al estipulado en este cupón.

- CLIENTE -

Dirección para notificaciones: Calle 82 Nº 11 - 37 Piso 7 - Bogotá, D.C.- Colombia. centrodecontacto@confianza.com.co

CONFIANZA

Swiss Re Corporate Solutions

NIT: 860.070.374-9

Referencia para pago electrónico: 0000000000

Nit: 860533206 **DV:** 8

Tomador: ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A. QUE PODRA ABREVIARSE E I A S.A

Póliza: 801056816 **Certificado:** GU246984 **SUCURSAL:** C. ANDINO

Valor Póliza:$ 0

FECHA DE DD MM AAAA

Canales de Pago:

- PSE en nuestra pagina web www.confianza.com.co en Pagos Confianza PC, registrese con c.c. o nit y el dígito de verificación, seleccione la opción: PSE/tarjeta de crédito.

- En entidades bancarias y corresponsales: (con código de barras, presentando este cupón)

Bancos:
BBVA Davivienda Banco de Bogotá

Corresponsales bancarios:
Corresponsales bancarios de Bancolombia
Grupo Éxito-Carulla
Surtimax
Olímpica
Movilred
Grupo Gelsa
Corresponsal Daviplata-punto red
Otros consúltelos en nuestra página web.
Copidrogas
Red Cerca
EDEQ
Full recarga

CANTIDAD DE CHEQUES	COD. BANCO	CHEQUE No.	VALOR
		CHEQUES $	
		EFECTIVO $	
		(*) TOTAL	

(415)7709998911901(8020)0000000000

IMPORTANTE:

- Si se requiere pagar más de una póliza, genere su cupón de pago en www.confianza.com.co en Pagos Confianza PC, registrese con c.c. o nit y el dígito de verificación y seleccione las pólizas en la opción: Cupón de pagos.
- Es importante que esté actualizado su correo electrónico ya que a este le llegará su recibo de caja en línea, si paga por estos medios.
- No se reciben pagos mixtos.
(*) el valor a pagar puede ser menor o igual al valor de la póliza. No se reciben valores mayores al estipulado en este cupón.

- BANCO -

Dirección para notificaciones: Calle 82 Nº 11 - 37 Piso 7 - Bogotá, D.C.- Colombia. centrodecontacto@confianza.com.co

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA 802091981
CERTIFICADO RE19045
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO

SUCURSAL: C. ANDINO USUARIO: KDMORA TIPO CERTIFICADO: Endoso FECHA EXPEDICION: DD 16 MM 06 AAAA 2026

TOMADOR	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD:	SAN ANDRES
E-MAIL:	GRACIELA.RODRIGUEZ@EISA.COM.CO	TELÉFONO:	6684343
ASEGURADO:	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD: SAN ANDRES	TEL. 6684343
BENEFICIARIO:	TERCEROS AFECTADOS	C.C. O NIT:	0000000000
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	TEL.

VIGENCIA		VALOR ASEGURADO EN PESOS		
DESDE DD 23 MM 04 AAAA 2026	HASTA DD 08 MM 03 AAAA 2027	ANTERIOR	ESTA MODIFICACIÓN	NUEVA
		700,362,000.00	0.00	700,362,000.00

INTERMEDIARIO		COASEGURO				PRIMA		
%PART	NOMBRE	COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRM:	MONEDA	VALORES
100.00	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS SAR LTDA ASESORES DE SEGU					PRIMA NETA	PESOS	
						CARGOS DE EMISIÓN	PESOS	
						IVA	PESOS	
						TOTAL		

AMPAROS	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta	VALOR ASEGURADO ANTERIOR EN PESOS	VALOR ASEGURADO NUEVO EN PESOS	VALOR PRIMA EN PESOS	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE Mínimo	DEDUCIBLE Hr
Predios Labores Operaciones / Vigencia	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	0
Predios Labores Operaciones / Evento	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Perjuicios Patrim Lucro Cesante / Vigencia	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Perjuicios Patrim Lucro Cesante / Evento	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Perjuicios Extrapatrimoniales / Vigencia	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Perjuicios Extrapatrimoniales / Evento	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Gastos Judiciales de Defensa / Vigencia	23-04-2026	08-03-2027	140,072,400.00	140,072,400.00		10	7,000,000.00	
Gastos Judiciales de Defensa / Evento	23-04-2026	08-03-2027	140,072,400.00	140,072,400.00		10	7,000,000.00	
Gastos Médicos de Urgencia / Vigencia	23-04-2026	08-03-2027	140,072,400.00	140,072,400.00				
Gastos Médicos de Urgencia / Evento	23-04-2026	08-03-2027	140,072,400.00	140,072,400.00				
Resp Civil Patronal / vigencia	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Resp Civil Patronal / Evento	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Resp Civil Contratistas Y Subcont / Vigencia	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Resp Civil Contratistas Y Subcont / Evento	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Resp Civil Vehículos Prop Y No Prop / Vigencia	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	100,000.00	
Resp Civil Vehículos Prop Y No Prop / Evento	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	

OBJETO DE LA PÓLIZA:

OBJETO DE MOFICICACIÓN: POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO CON FECHA DE JUNIO 09,2026.
DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

EXCLUSIÓN DE TRANSCCIONES PROHÍBIDAS, EMBARGOS Y SANCIONES ECONÓMICAS: LA COMPAÑÍA NO PROVEERA COBERTURA NI ESTARÁ OBLIGADA A PAGAR NINGUNA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO EN VIRTUD DE ESTA PÓLIZA SI LA PROVISIÓN DE DICHA COBERTURA, O EL PAGO DE DICHA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO PUDIERE EXPONER A LA COMPAÑIA A ALGUNA SANCIÓN, PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN CONFORME A LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O SANCIONES COMERCIALES O ECONÓMICAS, LEYES O NORMATIVAS DE CUALQUIER JURISDICCIÓN APLICABLE A LA COMPAÑÍA.

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA. ***LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO.*** LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO SE DEBERA HACERA MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACION DE LA VIGENCIA DE LA POLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA. LAS CARÁTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL. CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LOS CANALES DE ATENCIÓN QUE SE ENCUENTAN EN LA PÁGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO, ***VER NOTA*** EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETANDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ÁRTICULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES. LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS. AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL. EL PRESENTE CERTIFICADO DE SEGUROS SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA 802091981 Y CERTIFICADO RE18993

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TOMADOR

(415)7709998911901(8020)0000000000

María Juana Herrera Rodriguez
CC: 52.420.596

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

SU-FO-10-01

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE - ORIGINAL - ASEGURADO

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA 802091981
CERTIFICADO RE19045
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO

SUCURSAL: C. ANDINO USUARIO: KDMORA TIPO CERTIFICADO: Endoso FECHA EXPEDICION: DD 16 MM 06 AAAA 2026

TOMADOR	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD:	SAN ANDRES
E-MAIL:	GRACIELA.RODRIGUEZ@EISA.COM.CO	TELÉFONO:	6684343
ASEGURADO:	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD: SAN ANDRES	TEL. 6684343
BENEFICIARIO:	TERCEROS AFECTADOS	C.C. O NIT:	0000000000
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	TEL.

VIGENCIA		VALOR ASEGURADO EN PESOS		
DESDE DD 23 MM 04 AAAA 2026	HASTA DD 08 MM 03 AAAA 2027	ANTERIOR	ESTA MODIFICACIÓN	NUEVA
		700,362,000.00	0.00	700,362,000.00

INTERMEDIARIO		COASEGURO				PRIMA		
%PART	NOMBRE	COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRM:	MONEDA	VALORES
100.00	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS SAR LTDA ASESORES DE SEGU					PRIMA NETA	PESOS	
						CARGOS DE EMISIÓN	PESOS	
						IVA	PESOS	
						TOTAL		

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y DE ACUERDO A REQUERIMIENTO, SE ACLARA:

ASEGURADO/BENEFICIARIO: ASOCIACI¿N SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO", IDENTIFICADA CON EL NIT 901.445.387-3, EL MUNICIPIO DE YOPAL Y EL CONTRATISTA.

INDEMNIZAR LOS DA¿OS Y/O PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES, SIEMPRE QUE DERIVEN DE UN DA¿O F¿SICO Y/O MATERIAL IMPUTABLES AL TOMADOR Y/O ASEGURADO DE LA P¿LIZA, Y CAUSADOS POR LESIONES, MUERTE Y/O DA¿OS A LA PROPIEDAD DE TERCEROS, Y DERIVADOS DE LA EJECUCI¿N DEL CONTRATO N.¿ 019 DE 2026, CUYO OBJETO ES:

IMPLEMENTACI¿N DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACI¿N EN LA V¿A LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.

ASEGURADO/BENEFICIARIO: ASOCIACI¿N SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO", IDENTIFICADA CON EL NIT 901.445.387-3 Y EL CONTRATISTA.

SISTEMA BASE DE COBERTURA POR OCURRENCIA.

AMPARO DE BIENES BAJO CUIDADO, TENENCIA Y CONTROL
SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR HURTO SIMPLE NI CALIFICADO, AS¿ COMO TAMPOCO LOS DA¿OS A LOS BIENES COMO TAL.

AMPAROS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS Y RC CRUZADA
OPERAN EN EXCESO DE LA P¿LIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL INDIVIDUAL, CONTRATADA O NO, POR CADA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA, CON UN L¿MITE M¿NIMO POR EVENTO DE $50.000.000. ESTOS AMPAROS APLICAN SIEMPRE QUE EL ASEGURADO PRINCIPAL SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE.

EXCLUSIÓN DE TRANSCCIONES PROHÍBIDAS, EMBARGOS Y SANCIONES ECONÓMICAS: LA COMPAÑÍA NO PROVEERA COBERTURA NI ESTARÁ OBLIGADA A PAGAR NINGUNA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO EN VIRTUD DE ESTA PÓLIZA SI LA PROVISIÓN DE DICHA COBERTURA, O EL PAGO DE DICHA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO PUDIERE EXPONER A LA COMPAÑIA A ALGUNA SANCIÓN, PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN CONFORME A LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O SANCIONES COMERCIALES O ECONÓMICAS, LEYES O NORMATIVAS DE CUALQUIER JURISDICCIÓN APLICABLE A LA COMPAÑÍA.

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA. ***LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO.*** LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO SE DEBERA HACERA MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACION DE LA VIGENCIA DE LA POLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA. LAS CARÁTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL. CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LOS CANALES DE ATENCIÓN QUE SE ENCUENTAN EN LA PÁGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO, ***VER NOTA*** EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETANDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ÁRTICULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES. LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS. AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL. EL PRESENTE CERTIFICADO DE SEGUROS SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA 802091981 Y CERTIFICADO RE18993

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

(415)7709998911901(8020)0000000000

TOMADOR

María Juana Herrera Rodriguez
CC: 52.420.596

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

SU-FO-10-01

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE - ORIGINAL - ASEGURADO

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA 802091981
CERTIFICADO RE19045
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO

SUCURSAL: C. ANDINO USUARIO: KDMORA TIPO CERTIFICADO: Endoso FECHA EXPEDICION: DD 16 MM 06 AAAA 2026

TOMADOR	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD:	SAN ANDRES
E-MAIL:	GRACIELA.RODRIGUEZ@EISA.COM.CO	TELÉFONO:	6684343
ASEGURADO:	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD: SAN ANDRES	TEL. 6684343
BENEFICIARIO:	TERCEROS AFECTADOS	C.C. O NIT:	0000000000
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	TEL.

VIGENCIA			VALOR ASEGURADO EN PESOS		
	DD MM AAAA	DD MM AAAA	ANTERIOR	ESTA MODIFICACIÓN	NUEVA
DESDE	23 04 2026	HASTA 08 03 2027	700,362,000.00	0.00	700,362,000.00

INTERMEDIARIO		COASEGURO				PRIMA		
%PART	NOMBRE	COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRM:	MONEDA	VALORES
100.00	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS SAR LTDA ASESORES DE SEGU					PRIMA NETA	PESOS	
						CARGOS DE EMISIÓN	PESOS	
						IVA	PESOS	
						TOTAL		

AMPARO DE VEH¿CULOS PROPIOS O NO PROPIOS
OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DE LA P¿LIZA DE AUTOM¿VIL, CONTRATADA O NO, CON L¿MITES M¿NIMOS POR EVENTO DE $100.000.000 / $100.000.000 / $200.000.000. EN CASO DE SINIESTRO, SE DEBE DEMOSTRAR LA RELACI¿N QUE EXISTE ENTRE EL VEH¿CULO SINIESTRADO Y EL CONTRATO AMPARADO BAJO LA P¿LIZA.

CL¿USULA DE GARANT¿A:
EL CONTRATISTA DEBE IMPLEMENTAR TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS PARA PREVENIR CUALQUIER CLASE DE ACCIDENTES A TERCEROS, COMO LO ES LA DEBIDA SE¿ALIZACI¿N, AVISOS, LOS RESPECTIVOS CERRAMIENTOS, DEMARCACI¿N DE LA OBRA, DEBIDO ESTUDIO DE LOS TRAZAMIENTOS DE RUTAS ALTERNAS Y DE LAS RUTAS INMEDIATAMENTE ADYACENTES A LA OBRA.

NOTA:
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PRESENTE P¿LIZA NO AMPARA LAS FALLAS Y/O INTERRUPCIONES EN LOS SERVICIOS P¿BLICOS, AS¿ COMO TAMPOCO LOS DA¿OS CONSECUENCIALES DERIVADOS DE DICHAS INTERRUPCIONES. EL TOMADOR ASEGURADO SE COMPROMETE A QUE SUS EMPLEADOS CUMPLAN ESTRICTAMENTE CON EL REGLAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

SEGUIR TODAS Y CADA UNA DE LAS DISPOSICIONES CONSIGNADAS EN EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PROTECCI¿N CONTRA CA¿DAS EN TRABAJO EN ALTURAS, RESOLUCI¿N 1409 DE 2012; DISPONER DE UN COORDINADOR, TRABAJADOR Y CERTIFICADO DE COMPETENCIA DE TRABAJO EN ALTURAS, DEBIDAMENTE CERTIFICADO SEG¿N LO ESTABLECIDO EN LA LEY COLOMBIANA.

EXCLUSIÓN DE TRANSCCIONES PROHÍBIDAS, EMBARGOS Y SANCIONES ECONÓMICAS: LA COMPAÑÍA NO PROVEERA COBERTURA NI ESTARÁ OBLIGADA A PAGAR NINGUNA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO EN VIRTUD DE ESTA PÓLIZA SI LA PROVISIÓN DE DICHA COBERTURA, O EL PAGO DE DICHA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO PUDIERE EXPONER A LA COMPAÑIA A ALGUNA SANCIÓN, PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN CONFORME A LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O SANCIONES COMERCIALES O ECONÓMICAS, LEYES O NORMATIVAS DE CUALQUIER JURISDICCIÓN APLICABLE A LA COMPAÑÍA.

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA. ***LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO.*** LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO SE DEBERA HACERA MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACION DE LA VIGENCIA DE LA POLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, LAS CARÁTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL, CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LOS CANALES DE ATENCIÓN QUE SE ENCUENTAN EN LA PÁGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO, ***VER NOTA*** EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETANDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ÁRTICULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES. LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS. AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL. EL PRESENTE CERTIFICADO DE SEGUROS SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA 802091981 Y CERTIFICADO RE18993

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

(415)7709998911901(8020)0000000000

TOMADOR

María Juana Herrera Rodríguez
CC: 52.420.598

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

SU-FO-10-01

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE - ORIGINAL - ASEGURADO

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA 802091981
CERTIFICADO RE19045
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO

SUCURSAL: C. ANDINO USUARIO: KDMORA TIPO CERTIFICADO: Endoso FECHA EXPEDICION: DD 16 MM 06 AAAA 2026

TOMADOR	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD:	SAN ANDRES
E-MAIL:	GRACIELA.RODRIGUEZ@EISA.COM.CO	TELÉFONO:	6684343
ASEGURADO:	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD: SAN ANDRES	TEL. 6684343
BENEFICIARIO:	TERCEROS AFECTADOS	C.C. O NIT:	0000000000
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	TEL.

VIGENCIA		VALOR ASEGURADO EN PESOS		
DD MM AAAA	DD MM AAAA	ANTERIOR	ESTA MODIFICACIÓN	NUEVA
DESDE 23 04 2026	HASTA 08 03 2027	700,362,000.00	0.00	700,362,000.00

INTERMEDIARIO		COASEGURO				PRIMA		
%PART	NOMBRE	COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRM:	MONEDA	VALORES
100.00	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS SAR LTDA ASESORES DE SEGU					PRIMA NETA	PESOS	
						CARGOS DE EMISIÓN	PESOS	
						IVA	PESOS	
						TOTAL		

AMPAROS	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta	VALOR ASEGURADO ANTERIOR EN PESOS	VALOR ASEGURADO NUEVO EN PESOS	VALOR PRIMA EN PESOS	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE Mínimo	DEDUCIBLE Hr
Predios Labores Operaciones / Vigencia	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	0
Predios Labores Operaciones / Evento	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Perjuicios Patrim Lucro Cesante / Vigencia	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Perjuicios Patrim Lucro Cesante / Evento	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Perjuicios Extrapatrimoniales / Vigencia	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Perjuicios Extrapatrimoniales / Evento	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Gastos Judiciales de Defensa / Vigencia	23-04-2026	08-03-2027	140,072,400.00	140,072,400.00		10	7,000,000.00	
Gastos Judiciales de Defensa / Evento	23-04-2026	08-03-2027	140,072,400.00	140,072,400.00		10	7,000,000.00	
Gastos Médicos de Urgencia / Vigencia	23-04-2026	08-03-2027	140,072,400.00	140,072,400.00				
Gastos Médicos de Urgencia / Evento	23-04-2026	08-03-2027	140,072,400.00	140,072,400.00				
Resp Civil Patronal / vigencia	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Resp Civil Patronal / Evento	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Resp Civil Contratistas Y Subcont / Vigencia	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Resp Civil Contratistas Y Subcont / Evento	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Resp Civil Vehículos Prop Y No Prop / Vigencia	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	100,000.00	
Resp Civil Vehículos Prop Y No Prop / Evento	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	

OBJETO DE LA PÓLIZA:

OBJETO DE MOFICICACIÓN: POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO CON FECHA DE JUNIO 09,2026.
DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

EXCLUSIÓN DE TRANSCCIONES PROHÍBIDAS, EMBARGOS Y SANCIONES ECONÓMICAS: LA COMPAÑÍA NO PROVEERA COBERTURA NI ESTARÁ OBLIGADA A PAGAR NINGUNA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO EN VIRTUD DE ESTA PÓLIZA SI LA PROVISIÓN DE DICHA COBERTURA, O EL PAGO DE DICHA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO PUDIERE EXPONER A LA COMPAÑÍA A ALGUNA SANCIÓN, PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN CONFORME A LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O SANCIONES COMERCIALES O ECONÓMICAS, LEYES O NORMATIVAS DE CUALQUIER JURISDICCIÓN APLICABLE A LA COMPAÑÍA.

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA. ***LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO.*** LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO SE DEBERA HACERA MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACION DE LA VIGENCIA DE LA POLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA. LAS CARÁTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL, CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LOS CANALES DE ATENCIÓN QUE SE ENCUENTAN EN LA PÁGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO, ***VER NOTA*** EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETANDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ÁRTICULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES. LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS. AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL. EL PRESENTE CERTIFICADO DE SEGUROS SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA 802091981 Y CERTIFICADO RE18993

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

(415)7709998911901(8020)0000000000

TOMADOR

María Juana Herrera Rodriguez
CC: 52.420.596

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

SU-FO-10-01

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA 802091981
CERTIFICADO RE19045
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO

SUCURSAL: C. ANDINO USUARIO: KDMORA TIPO CERTIFICADO: Endoso FECHA EXPEDICION: DD 16 MM 06 AAAA 2026

TOMADOR	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD:	SAN ANDRES
E-MAIL:	GRACIELA.RODRIGUEZ@EISA.COM.CO	TELÉFONO:	6684343
ASEGURADO:	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD: SAN ANDRES	TEL. 6684343
BENEFICIARIO:	TERCEROS AFECTADOS	C.C. O NIT:	0000000000
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	TEL.

VIGENCIA			VALOR ASEGURADO EN PESOS		
	DD MM AAAA	DD MM AAAA	ANTERIOR	ESTA MODIFICACIÓN	NUEVA
DESDE	23 04 2026	HASTA 08 03 2027	700,362,000.00	0.00	700,362,000.00

INTERMEDIARIO		COASEGURO				PRIMA		
%PART	NOMBRE	COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRM:	MONEDA	VALORES
100.00	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS SAR LTDA ASESORES DE SEGU					PRIMA NETA	PESOS	
						CARGOS DE EMISIÓN	PESOS	
						IVA	PESOS	
						TOTAL		

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y DE ACUERDO A REQUERIMIENTO, SE ACLARA:

ASEGURADO/BENEFICIARIO: ASOCIACI¿N SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO", IDENTIFICADA CON EL NIT 901.445.387-3, EL MUNICIPIO DE YOPAL Y EL CONTRATISTA.

INDEMNIZAR LOS DA¿OS Y/O PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES, SIEMPRE QUE DERIVEN DE UN DA¿O F¿SICO Y/O MATERIAL IMPUTABLES AL TOMADOR Y/O ASEGURADO DE LA P¿LIZA, Y CAUSADOS POR LESIONES, MUERTE Y/O DA¿OS A LA PROPIEDAD DE TERCEROS, Y DERIVADOS DE LA EJECUCI¿N DEL CONTRATO N.¿ 019 DE 2026, CUYO OBJETO ES:

IMPLEMENTACI¿N DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACI¿N EN LA V¿A LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.

ASEGURADO/BENEFICIARIO: ASOCIACI¿N SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO", IDENTIFICADA CON EL NIT 901.445.387-3 Y EL CONTRATISTA.

SISTEMA BASE DE COBERTURA POR OCURRENCIA.

AMPARO DE BIENES BAJO CUIDADO, TENENCIA Y CONTROL
SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR HURTO SIMPLE NI CALIFICADO, AS¿ COMO TAMPOCO LOS DA¿OS A LOS BIENES COMO TAL.

AMPAROS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS Y RC CRUZADA
OPERAN EN EXCESO DE LA P¿LIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL INDIVIDUAL, CONTRATADA O NO, POR CADA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA, CON UN L¿MITE M¿NIMO POR EVENTO DE $50.000.000. ESTOS AMPAROS APLICAN SIEMPRE QUE EL ASEGURADO PRINCIPAL SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE.

EXCLUSIÓN DE TRANSCCIONES PROHÍBIDAS, EMBARGOS Y SANCIONES ECONÓMICAS: LA COMPAÑÍA NO PROVEERA COBERTURA NI ESTARÁ OBLIGADA A PAGAR NINGUNA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO EN VIRTUD DE ESTA PÓLIZA SI LA PROVISIÓN DE DICHA COBERTURA, O EL PAGO DE DICHA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO PUDIERE EXPONER A LA COMPAÑÍA A ALGUNA SANCIÓN, PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN CONFORME A LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O SANCIONES COMERCIALES O ECONÓMICAS, LEYES O NORMATIVAS DE CUALQUIER JURISDICCIÓN APLICABLE A LA COMPAÑÍA.

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA. ***LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO.*** LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO SE DEBERA HACERA MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACION DE LA VIGENCIA DE LA POLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA. LAS CARÁTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL, CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LOS CANALES DE ATENCIÓN QUE SE ENCUENTAN EN LA PÁGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO, ***VER NOTA*** EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETANDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ÁRTICULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES. LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS. AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL. EL PRESENTE CERTIFICADO DE SEGUROS SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA 802091981 Y CERTIFICADO RE18993

TOMADOR

(415)7709998911901(8020)0000000000

María Juana Herrera Rodriguez
CC: 52.420.598

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SU-FO-10-01

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA 802091981
CERTIFICADO RE19045
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO

SUCURSAL: C. ANDINO USUARIO: KDMORA TIPO CERTIFICADO: Endoso FECHA EXPEDICION: DD 16 MM 06 AAAA 2026

TOMADOR	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD:	SAN ANDRES
E-MAIL:	GRACIELA.RODRIGUEZ@EISA.COM.CO	TELÉFONO:	6684343
ASEGURADO:	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD: SAN ANDRES	TEL. 6684343
BENEFICIARIO:	TERCEROS AFECTADOS	C.C. O NIT:	0000000000
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	TEL.

VIGENCIA		VALOR ASEGURADO EN PESOS		
	DD MM AAAA	ANTERIOR	ESTA MODIFICACIÓN	NUEVA
DESDE	23 04 2026	700,362,000.00	0.00	700,362,000.00
HASTA	08 03 2027			

INTERMEDIARIO		COASEGURO				PRIMA		
%PART	NOMBRE	COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRM:	MONEDA	VALORES
100.00	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS SAR LTDA ASESORES DE SEGU					PRIMA NETA	PESOS	
						CARGOS DE EMISIÓN	PESOS	
						IVA	PESOS	
						TOTAL		

AMPARO DE VEH¿CULOS PROPIOS O NO PROPIOS
OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DE LA P¿LIZA DE AUTOM¿VIL, CONTRATADA O NO, CON L¿MITES M¿NIMOS POR EVENTO DE $100.000.000 / $100.000.000 / $200.000.000. EN CASO DE SINIESTRO, SE DEBE DEMOSTRAR LA RELACI¿N QUE EXISTE ENTRE EL VEH¿CULO SINIESTRADO Y EL CONTRATO AMPARADO BAJO LA P¿LIZA.

CL¿USULA DE GARANT¿A:
EL CONTRATISTA DEBE IMPLEMENTAR TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS PARA PREVENIR CUALQUIER CLASE DE ACCIDENTES A TERCEROS, COMO LO ES LA DEBIDA SE¿ALIZACI¿N, AVISOS, LOS RESPECTIVOS CERRAMIENTOS, DEMARCACI¿N DE LA OBRA, DEBIDO ESTUDIO DE LOS TRAZAMIENTOS DE RUTAS ALTERNAS Y DE LAS RUTAS INMEDIATAMENTE ADYACENTES A LA OBRA.

NOTA:
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PRESENTE P¿LIZA NO AMPARA LAS FALLAS Y/O INTERRUPCIONES EN LOS SERVICIOS P¿BLICOS, AS¿ COMO TAMPOCO LOS DA¿OS CONSECUENCIALES DERIVADOS DE DICHAS INTERRUPCIONES. EL TOMADOR ASEGURADO SE COMPROMETE A QUE SUS EMPLEADOS CUMPLAN ESTRICTAMENTE CON EL REGLAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

SEGUIR TODAS Y CADA UNA DE LAS DISPOSICIONES CONSIGNADAS EN EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PROTECCI¿N CONTRA CA¿DAS EN TRABAJO EN ALTURAS, RESOLUCI¿N 1409 DE 2012; DISPONER DE UN COORDINADOR, TRABAJADOR Y CERTIFICADO DE COMPETENCIA DE TRABAJO EN ALTURAS, DEBIDAMENTE CERTIFICADO SEG¿N LO ESTABLECIDO EN LA LEY COLOMBIANA.

EXCLUSIÓN DE TRANSCCIONES PROHÍBIDAS, EMBARGOS Y SANCIONES ECONÓMICAS: LA COMPAÑÍA NO PROVEERA COBERTURA NI ESTARÁ OBLIGADA A PAGAR NINGUNA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO EN VIRTUD DE ESTA PÓLIZA SI LA PROVISIÓN DE DICHA COBERTURA, O EL PAGO DE DICHA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO PUDIERE EXPONER A LA COMPAÑIA A ALGUNA SANCIÓN, PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN CONFORME A LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O SANCIONES COMERCIALES O ECONÓMICAS, LEYES O NORMATIVAS DE CUALQUIER JURISDICCIÓN APLICABLE A LA COMPAÑÍA.

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA. ***LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO.*** LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO SE DEBERA HACERA MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACION DE LA VIGENCIA DE LA POLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA. LAS CARÁTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL, CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LOS CANALES DE ATENCIÓN QUE SE ENCUENTAN EN LA PÁGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO, ***VER NOTA*** EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETANDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ÁRTICULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES. LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS. AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL. EL PRESENTE CERTIFICADO DE SEGUROS SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA 802091981 Y CERTIFICADO RE18993

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

(415)7709998911901(8020)0000000000

TOMADOR

María Juana Herrera Rodríguez
CC: 52.420.596

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

SU-FO-10-01

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA 802091981
CERTIFICADO RE19045
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO

SUCURSAL: C. ANDINO USUARIO: KDMORA TIPO CERTIFICADO: Endoso FECHA EXPEDICION: DD 16 MM 06 AAAA 2026

TOMADOR	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD:	SAN ANDRES
E-MAIL:	GRACIELA.RODRIGUEZ@EISA.COM.CO	TELÉFONO:	6684343
ASEGURADO:	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD: SAN ANDRES	TEL. 6684343
BENEFICIARIO:	TERCEROS AFECTADOS	C.C. O NIT:	0000000000
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	TEL.

VIGENCIA		VALOR ASEGURADO EN PESOS		
DD MM AAAA	DD MM AAAA	ANTERIOR	ESTA MODIFICACIÓN	NUEVA
DESDE 23 04 2026	HASTA 08 03 2027	700,362,000.00	0.00	700,362,000.00

INTERMEDIARIO		COASEGURO				PRIMA		
%PART	NOMBRE	COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRM:	MONEDA	VALORES
100.00	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS SAR LTDA ASESORES DE SEGU					PRIMA NETA	PESOS	
						CARGOS DE EMISIÓN	PESOS	
						IVA	PESOS	
						TOTAL		

AMPAROS	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta	VALOR ASEGURADO ANTERIOR EN PESOS	VALOR ASEGURADO NUEVO EN PESOS	VALOR PRIMA EN PESOS	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE Mínimo	DEDUCIBLE Hr
Predios Labores Operaciones / Vigencia	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	0
Predios Labores Operaciones / Evento	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Perjuicios Patrim Lucro Cesante / Vigencia	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Perjuicios Patrim Lucro Cesante / Evento	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Perjuicios Extrapatrimoniales / Vigencia	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Perjuicios Extrapatrimoniales / Evento	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Gastos Judiciales de Defensa / Vigencia	23-04-2026	08-03-2027	140,072,400.00	140,072,400.00		10	7,000,000.00	
Gastos Judiciales de Defensa / Evento	23-04-2026	08-03-2027	140,072,400.00	140,072,400.00		10	7,000,000.00	
Gastos Médicos de Urgencia / Vigencia	23-04-2026	08-03-2027	140,072,400.00	140,072,400.00				
Gastos Médicos de Urgencia / Evento	23-04-2026	08-03-2027	140,072,400.00	140,072,400.00				
Resp Civil Patronal / vigencia	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Resp Civil Patronal / Evento	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Resp Civil Contratistas Y Subcont / Vigencia	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Resp Civil Contratistas Y Subcont / Evento	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Resp Civil Vehículos Prop Y No Prop / Vigencia	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	100,000.00	
Resp Civil Vehículos Prop Y No Prop / Evento	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	

OBJETO DE LA PÓLIZA:

OBJETO DE MOFICICACIÓN: POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO CON FECHA DE JUNIO 09,2026.
DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

EXCLUSIÓN DE TRANSCCIONES PROHÍBIDAS, EMBARGOS Y SANCIONES ECONÓMICAS: LA COMPAÑÍA NO PROVEERA COBERTURA NI ESTARÁ OBLIGADA A PAGAR NINGUNA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO EN VIRTUD DE ESTA PÓLIZA SI LA PROVISIÓN DE DICHA COBERTURA, O EL PAGO DE DICHA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO PUDIERE EXPONER A LA COMPAÑÍA A ALGUNA SANCIÓN, PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN CONFORME A LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O SANCIONES COMERCIALES O ECONÓMICAS, LEYES O NORMATIVAS DE CUALQUIER JURISDICCIÓN APLICABLE A LA COMPAÑÍA.

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA. ***LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO.*** LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO SE DEBERA HACERA MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACION DE LA VIGENCIA DE LA POLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA. LAS CARÁTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL. CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LOS CANALES DE ATENCIÓN QUE SE ENCUENTAN EN LA PÁGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO, ***VER NOTA*** EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETANDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ÁRTICULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES. LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS. AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL. EL PRESENTE CERTIFICADO DE SEGUROS SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA 802091981 Y CERTIFICADO RE18993

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TOMADOR

(415)7709998911901(8020)0000000000

María Juana Herrera Rodríguez
CC: 52.420.598

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

SU-FO-10-01

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE - SEGUNDA COPIA - INTERMEDIARIO

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA 802091981
CERTIFICADO RE19045
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO

SUCURSAL: C. ANDINO USUARIO: KDMORA TIPO CERTIFICADO: Endoso FECHA EXPEDICION: DD 16 MM 06 AAAA 2026

TOMADOR	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD:	SAN ANDRES
E-MAIL:	GRACIELA.RODRIGUEZ@EISA.COM.CO	TELÉFONO:	6684343
ASEGURADO:	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD: SAN ANDRES	TEL. 6684343
BENEFICIARIO:	TERCEROS AFECTADOS	C.C. O NIT:	0000000000
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	TEL.

VIGENCIA			VALOR ASEGURADO EN PESOS		
	DD MM AAAA	DD MM AAAA	ANTERIOR	ESTA MODIFICACIÓN	NUEVA
DESDE	23 04 2026	HASTA 08 03 2027	700,362,000.00	0.00	700,362,000.00

INTERMEDIARIO		COASEGURO				PRIMA		
%PART	NOMBRE	COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRM:	MONEDA	VALORES
100.00	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS SAR LTDA ASESORES DE SEGU					PRIMA NETA	PESOS	
						CARGOS DE EMISIÓN	PESOS	
						IVA	PESOS	
						TOTAL		

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y DE ACUERDO A REQUERIMIENTO, SE ACLARA:

ASEGURADO/BENEFICIARIO: ASOCIACI¿N SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO", IDENTIFICADA CON EL NIT 901.445.387-3, EL MUNICIPIO DE YOPAL Y EL CONTRATISTA.

INDEMNIZAR LOS DA¿OS Y/O PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES, SIEMPRE QUE DERIVEN DE UN DA¿O F¿SICO Y/O MATERIAL IMPUTABLES AL TOMADOR Y/O ASEGURADO DE LA P¿LIZA, Y CAUSADOS POR LESIONES, MUERTE Y/O DA¿OS A LA PROPIEDAD DE TERCEROS, Y DERIVADOS DE LA EJECUCI¿N DEL CONTRATO N.¿ 019 DE 2026, CUYO OBJETO ES:

IMPLEMENTACI¿N DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACI¿N EN LA V¿A LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.

ASEGURADO/BENEFICIARIO: ASOCIACI¿N SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO", IDENTIFICADA CON EL NIT 901.445.387-3 Y EL CONTRATISTA.

SISTEMA BASE DE COBERTURA POR OCURRENCIA.

AMPARO DE BIENES BAJO CUIDADO, TENENCIA Y CONTROL
SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR HURTO SIMPLE NI CALIFICADO, AS¿ COMO TAMPOCO LOS DA¿OS A LOS BIENES COMO TAL.

AMPAROS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS Y RC CRUZADA
OPERAN EN EXCESO DE LA P¿LIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL INDIVIDUAL, CONTRATADA O NO, POR CADA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA, CON UN L¿MITE M¿NIMO POR EVENTO DE $50.000.000. ESTOS AMPAROS APLICAN SIEMPRE QUE EL ASEGURADO PRINCIPAL SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE.

EXCLUSIÓN DE TRANSCCIONES PROHÍBIDAS, EMBARGOS Y SANCIONES ECONÓMICAS: LA COMPAÑÍA NO PROVEERA COBERTURA NI ESTARÁ OBLIGADA A PAGAR NINGUNA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO EN VIRTUD DE ESTA PÓLIZA SI LA PROVISIÓN DE DICHA COBERTURA, O EL PAGO DE DICHA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO PUDIERE EXPONER A LA COMPAÑIA A ALGUNA SANCIÓN, PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN CONFORME A LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O SANCIONES COMERCIALES O ECONÓMICAS, LEYES O NORMATIVAS DE CUALQUIER JURISDICCIÓN APLICABLE A LA COMPAÑÍA.

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA. ***LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO.*** LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO SE DEBERA HACERA MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACION DE LA VIGENCIA DE LA POLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, LAS CARÁTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL, CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LOS CANALES DE ATENCIÓN QUE SE ENCUENTAN EN LA PÁGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO, ***VER NOTA*** EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETANDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ÁRTICULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES. LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS. AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL. EL PRESENTE CERTIFICADO DE SEGUROS SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA 802091981 Y CERTIFICADO RE18993

(415)7709998911901(8020)0000000000

TOMADOR

María Juana Herrera Rodriguez
CC: 52.420.596

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SU-FO-10-01

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA 802091981
CERTIFICADO RE19045
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO

SUCURSAL: C. ANDINO USUARIO: KDMORA TIPO CERTIFICADO: Endoso FECHA EXPEDICION: DD 16 MM 06 AAAA 2026

TOMADOR	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD:	SAN ANDRES
E-MAIL:	GRACIELA.RODRIGUEZ@EISA.COM.CO	TELÉFONO:	6684343
ASEGURADO:	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD: SAN ANDRES	TEL. 6684343
BENEFICIARIO:	TERCEROS AFECTADOS	C.C. O NIT:	0000000000
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	TEL.

VIGENCIA			VALOR ASEGURADO EN PESOS		
	DD MM AAAA	DD MM AAAA	ANTERIOR	ESTA MODIFICACIÓN	NUEVA
DESDE	23 04 2026	HASTA 08 03 2027	700,362,000.00	0.00	700,362,000.00

INTERMEDIARIO		COASEGURO				PRIMA		
%PART	NOMBRE	COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRM:	MONEDA	VALORES
100.00	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS SAR LTDA ASESORES DE SEGU					PRIMA NETA	PESOS	
						CARGOS DE EMISIÓN	PESOS	
						IVA	PESOS	
						TOTAL		

AMPARO DE VEH¿CULOS PROPIOS O NO PROPIOS
OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DE LA P¿LIZA DE AUTOM¿VIL, CONTRATADA O NO, CON L¿MITES M¿NIMOS POR EVENTO DE $100.000.000 / $100.000.000 / $200.000.000. EN CASO DE SINIESTRO, SE DEBE DEMOSTRAR LA RELACI¿N QUE EXISTE ENTRE EL VEH¿CULO SINIESTRADO Y EL CONTRATO AMPARADO BAJO LA P¿LIZA.

CL¿USULA DE GARANT¿A:
EL CONTRATISTA DEBE IMPLEMENTAR TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS PARA PREVENIR CUALQUIER CLASE DE ACCIDENTES A TERCEROS, COMO LO ES LA DEBIDA SE¿ALIZACI¿N, AVISOS, LOS RESPECTIVOS CERRAMIENTOS, DEMARCACI¿N DE LA OBRA, DEBIDO ESTUDIO DE LOS TRAZAMIENTOS DE RUTAS ALTERNAS Y DE LAS RUTAS INMEDIATAMENTE ADYACENTES A LA OBRA.

NOTA:
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PRESENTE P¿LIZA NO AMPARA LAS FALLAS Y/O INTERRUPCIONES EN LOS SERVICIOS P¿BLICOS, AS¿ COMO TAMPOCO LOS DA¿OS CONSECUENCIALES DERIVADOS DE DICHAS INTERRUPCIONES. EL TOMADOR ASEGURADO SE COMPROMETE A QUE SUS EMPLEADOS CUMPLAN ESTRICTAMENTE CON EL REGLAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

SEGUIR TODAS Y CADA UNA DE LAS DISPOSICIONES CONSIGNADAS EN EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PROTECCI¿N CONTRA CA¿DAS EN TRABAJO EN ALTURAS, RESOLUCI¿N 1409 DE 2012; DISPONER DE UN COORDINADOR, TRABAJADOR Y CERTIFICADO DE COMPETENCIA DE TRABAJO EN ALTURAS, DEBIDAMENTE CERTIFICADO SEG¿N LO ESTABLECIDO EN LA LEY COLOMBIANA.

EXCLUSIÓN DE TRANSCCIONES PROHÍBIDAS, EMBARGOS Y SANCIONES ECONÓMICAS: LA COMPAÑÍA NO PROVEERA COBERTURA NI ESTARÁ OBLIGADA A PAGAR NINGUNA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO EN VIRTUD DE ESTA PÓLIZA SI LA PROVISIÓN DE DICHA COBERTURA, O EL PAGO DE DICHA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO PUDIERE EXPONER A LA COMPAÑIA A ALGUNA SANCIÓN, PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN CONFORME A LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O SANCIONES COMERCIALES O ECONÓMICAS, LEYES O NORMATIVAS DE CUALQUIER JURISDICCIÓN APLICABLE A LA COMPAÑÍA.

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA. ***LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO.*** LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO SE DEBERA HACERA MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACION DE LA VIGENCIA DE LA POLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA. LAS CARÁTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL. CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LOS CANALES DE ATENCIÓN QUE SE ENCUENTAN EN LA PÁGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO, ***VER NOTA*** EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETANDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ÁRTICULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES. LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS. AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL. EL PRESENTE CERTIFICADO DE SEGUROS SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA 802091981 Y CERTIFICADO RE18993

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TOMADOR

(415)7709998911901(8020)0000000000

María Juana Herrera Rodríguez
CC: 52.420.596

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

SU-FO-10-01

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE - SEGUNDA COPIA - INTERMEDIARIO

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA 802091981
CERTIFICADO RE19045
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO

SUCURSAL: C. ANDINO USUARIO: KDMORA TIPO CERTIFICADO: Endoso FECHA EXPEDICION: DD 16 MM 06 AAAA 2026

TOMADOR	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD:	SAN ANDRES
E-MAIL:	GRACIELA.RODRIGUEZ@EISA.COM.CO	TELÉFONO:	6684343
ASEGURADO:	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD: SAN ANDRES	TEL. 6684343
BENEFICIARIO:	TERCEROS AFECTADOS	C.C. O NIT:	0000000000
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	TEL.

VIGENCIA		VALOR ASEGURADO EN PESOS		
DESDE DD 23 MM 04 AAAA 2026	HASTA DD 08 MM 03 AAAA 2027	ANTERIOR	ESTA MODIFICACIÓN	NUEVA
		700,362,000.00	0.00	700,362,000.00

INTERMEDIARIO		COASEGURO				PRIMA		
%PART	NOMBRE	COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRM:	MONEDA	VALORES
100.00	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS SAR LTDA ASESORES DE SEGU					PRIMA NETA	PESOS	
						CARGOS DE EMISIÓN	PESOS	
						IVA	PESOS	
						TOTAL		

AMPAROS	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta	VALOR ASEGURADO ANTERIOR EN PESOS	VALOR ASEGURADO NUEVO EN PESOS	VALOR PRIMA EN PESOS	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE Mínimo	DEDUCIBLE Hr
Predios Labores Operaciones / Vigencia	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	0
Predios Labores Operaciones / Evento	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Perjuicios Patrim Lucro Cesante / Vigencia	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Perjuicios Patrim Lucro Cesante / Evento	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Perjuicios Extrapatrimoniales / Vigencia	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Perjuicios Extrapatrimoniales / Evento	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Gastos Judiciales de Defensa / Vigencia	23-04-2026	08-03-2027	140,072,400.00	140,072,400.00		10	7,000,000.00	
Gastos Judiciales de Defensa / Evento	23-04-2026	08-03-2027	140,072,400.00	140,072,400.00		10	7,000,000.00	
Gastos Médicos de Urgencia / Vigencia	23-04-2026	08-03-2027	140,072,400.00	140,072,400.00				
Gastos Médicos de Urgencia / Evento	23-04-2026	08-03-2027	140,072,400.00	140,072,400.00				
Resp Civil Patronal / vigencia	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Resp Civil Patronal / Evento	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Resp Civil Contratistas Y Subcont / Vigencia	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Resp Civil Contratistas Y Subcont / Evento	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Resp Civil Vehículos Prop Y No Prop / Vigencia	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	100,000.00	
Resp Civil Vehículos Prop Y No Prop / Evento	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	

OBJETO DE LA PÓLIZA:

OBJETO DE MOFICICACIÓN: POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO CON FECHA DE JUNIO 09,2026.
DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

EXCLUSIÓN DE TRANSCCIONES PROHÍBIDAS, EMBARGOS Y SANCIONES ECONÓMICAS: LA COMPAÑÍA NO PROVEERA COBERTURA NI ESTARÁ OBLIGADA A PAGAR NINGUNA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO EN VIRTUD DE ESTA PÓLIZA SI LA PROVISIÓN DE DICHA COBERTURA, O EL PAGO DE DICHA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO PUDIERE EXPONER A LA COMPAÑÍA A ALGUNA SANCIÓN, PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN CONFORME A LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O SANCIONES COMERCIALES O ECONÓMICAS, LEYES O NORMATIVAS DE CUALQUIER JURISDICCIÓN APLICABLE A LA COMPAÑÍA.

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA. ***LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO.*** LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO SE DEBERA HACERA MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACION DE LA VIGENCIA DE LA POLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA. LAS CARÁTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL. CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LOS CANALES DE ATENCIÓN QUE SE ENCUENTAN EN LA PÁGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO, ***VER NOTA*** EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETANDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ÁRTICULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES. LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS. AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL. EL PRESENTE CERTIFICADO DE SEGUROS SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA 802091981 Y CERTIFICADO RE18993

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

(415)7709998911901(8020)0000000000

TOMADOR

María Juana Herrera Rodríguez
CC: 52.420.596

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

SU-FO-10-01

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE - TERCERA COPIA - SUCURSAL/OFICINA EXPEDIDORA

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA 802091981
CERTIFICADO RE19045
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO

SUCURSAL: C. ANDINO USUARIO: KDMORA TIPO CERTIFICADO: Endoso FECHA EXPEDICION: DD 16 MM 06 AAAA 2026

TOMADOR	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD:	SAN ANDRES
E-MAIL:	GRACIELA.RODRIGUEZ@EISA.COM.CO	TELÉFONO:	6684343
ASEGURADO:	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD: SAN ANDRES	TEL. 6684343
BENEFICIARIO:	TERCEROS AFECTADOS	C.C. O NIT:	0000000000
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	TEL.

VIGENCIA		VALOR ASEGURADO EN PESOS		
DESDE DD 23 MM 04 AAAA 2026	HASTA DD 08 MM 03 AAAA 2027	ANTERIOR	ESTA MODIFICACIÓN	NUEVA
		700,362,000.00	0.00	700,362,000.00

INTERMEDIARIO		COASEGURO				PRIMA		
%PART	NOMBRE	COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRM:	MONEDA	VALORES
100.00	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS SAR LTDA ASESORES DE SEGU					PRIMA NETA	PESOS	
						CARGOS DE EMISIÓN	PESOS	
						IVA	PESOS	
						TOTAL		

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y DE ACUERDO A REQUERIMIENTO, SE ACLARA:

ASEGURADO/BENEFICIARIO: ASOCIACI¿N SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO", IDENTIFICADA CON EL NIT 901.445.387-3, EL MUNICIPIO DE YOPAL Y EL CONTRATISTA.

INDEMNIZAR LOS DA¿OS Y/O PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES, SIEMPRE QUE DERIVEN DE UN DA¿O F¿SICO Y/O MATERIAL IMPUTABLES AL TOMADOR Y/O ASEGURADO DE LA P¿LIZA, Y CAUSADOS POR LESIONES, MUERTE Y/O DA¿OS A LA PROPIEDAD DE TERCEROS, Y DERIVADOS DE LA EJECUCI¿N DEL CONTRATO N.¿ 019 DE 2026, CUYO OBJETO ES:

IMPLEMENTACI¿N DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACI¿N EN LA V¿A LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.

ASEGURADO/BENEFICIARIO: ASOCIACI¿N SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO", IDENTIFICADA CON EL NIT 901.445.387-3 Y EL CONTRATISTA.

SISTEMA BASE DE COBERTURA POR OCURRENCIA.

AMPARO DE BIENES BAJO CUIDADO, TENENCIA Y CONTROL
SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR HURTO SIMPLE NI CALIFICADO, AS¿ COMO TAMPOCO LOS DA¿OS A LOS BIENES COMO TAL.

AMPAROS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS Y RC CRUZADA
OPERAN EN EXCESO DE LA P¿LIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL INDIVIDUAL, CONTRATADA O NO, POR CADA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA, CON UN L¿MITE M¿NIMO POR EVENTO DE $50.000.000. ESTOS AMPAROS APLICAN SIEMPRE QUE EL ASEGURADO PRINCIPAL SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE.

EXCLUSIÓN DE TRANSCCIONES PROHÍBIDAS, EMBARGOS Y SANCIONES ECONÓMICAS: LA COMPAÑÍA NO PROVEERA COBERTURA NI ESTARÁ OBLIGADA A PAGAR NINGUNA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO EN VIRTUD DE ESTA PÓLIZA SI LA PROVISIÓN DE DICHA COBERTURA, O EL PAGO DE DICHA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO PUDIERE EXPONER A LA COMPAÑIA A ALGUNA SANCIÓN, PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN CONFORME A LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O SANCIONES COMERCIALES O ECONÓMICAS, LEYES O NORMATIVAS DE CUALQUIER JURISDICCIÓN APLICABLE A LA COMPAÑÍA.

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA. ***LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO.*** LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO SE DEBERA HACERA MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACION DE LA VIGENCIA DE LA POLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, LAS CARÁTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL, CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LOS CANALES DE ATENCIÓN QUE SE ENCUENTAN EN LA PÁGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO, ***VER NOTA*** EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETANDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ÁRTICULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES. LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS. AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL. EL PRESENTE CERTIFICADO DE SEGUROS SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA 802091981 Y CERTIFICADO RE18993

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

(415)7709998911901(8020)0000000000

TOMADOR

María Juana Herrera Rodriguez
CC: 52.420.596

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

SU-FO-10-01

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE - TERCERA COPIA - SUCURSAL/OFICINA EXPEDIDORA

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA 802091981
CERTIFICADO RE19045
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO

SUCURSAL: C. ANDINO USUARIO: KDMORA TIPO CERTIFICADO: Endoso FECHA EXPEDICION: DD 16 MM 06 AAAA 2026

TOMADOR	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD:	SAN ANDRES
E-MAIL:	GRACIELA.RODRIGUEZ@EISA.COM.CO	TELÉFONO:	6684343
ASEGURADO:	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD: SAN ANDRES	TEL. 6684343
BENEFICIARIO:	TERCEROS AFECTADOS	C.C. O NIT:	0000000000
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	TEL.

VIGENCIA		VALOR ASEGURADO EN PESOS		
DESDE DD 23 MM 04 AAAA 2026	HASTA DD 08 MM 03 AAAA 2027	ANTERIOR	ESTA MODIFICACIÓN	NUEVA
		700,362,000.00	0.00	700,362,000.00

INTERMEDIARIO		COASEGURO				PRIMA		
%PART	NOMBRE	COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRM:	MONEDA	VALORES
100.00	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS SAR LTDA ASESORES DE SEGU					PRIMA NETA	PESOS	
						CARGOS DE EMISIÓN	PESOS	
						IVA	PESOS	
						TOTAL		

AMPARO DE VEH¿CULOS PROPIOS O NO PROPIOS
OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DE LA P¿LIZA DE AUTOM¿VIL, CONTRATADA O NO, CON L¿MITES M¿NIMOS POR EVENTO DE $100.000.000 / $100.000.000 / $200.000.000. EN CASO DE SINIESTRO, SE DEBE DEMOSTRAR LA RELACI¿N QUE EXISTE ENTRE EL VEH¿CULO SINIESTRADO Y EL CONTRATO AMPARADO BAJO LA P¿LIZA.

CL¿USULA DE GARANT¿A:
EL CONTRATISTA DEBE IMPLEMENTAR TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS PARA PREVENIR CUALQUIER CLASE DE ACCIDENTES A TERCEROS, COMO LO ES LA DEBIDA SE¿ALIZACI¿N, AVISOS, LOS RESPECTIVOS CERRAMIENTOS, DEMARCACI¿N DE LA OBRA, DEBIDO ESTUDIO DE LOS TRAZAMIENTOS DE RUTAS ALTERNAS Y DE LAS RUTAS INMEDIATAMENTE ADYACENTES A LA OBRA.

NOTA:
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PRESENTE P¿LIZA NO AMPARA LAS FALLAS Y/O INTERRUPCIONES EN LOS SERVICIOS P¿BLICOS, AS¿ COMO TAMPOCO LOS DA¿OS CONSECUENCIALES DERIVADOS DE DICHAS INTERRUPCIONES. EL TOMADOR ASEGURADO SE COMPROMETE A QUE SUS EMPLEADOS CUMPLAN ESTRICTAMENTE CON EL REGLAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

SEGUIR TODAS Y CADA UNA DE LAS DISPOSICIONES CONSIGNADAS EN EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PROTECCI¿N CONTRA CA¿DAS EN TRABAJO EN ALTURAS, RESOLUCI¿N 1409 DE 2012; DISPONER DE UN COORDINADOR, TRABAJADOR Y CERTIFICADO DE COMPETENCIA DE TRABAJO EN ALTURAS, DEBIDAMENTE CERTIFICADO SEG¿N LO ESTABLECIDO EN LA LEY COLOMBIANA.

EXCLUSIÓN DE TRANSCCIONES PROHÍBIDAS, EMBARGOS Y SANCIONES ECONÓMICAS: LA COMPAÑÍA NO PROVEERA COBERTURA NI ESTARÁ OBLIGADA A PAGAR NINGUNA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO EN VIRTUD DE ESTA PÓLIZA SI LA PROVISIÓN DE DICHA COBERTURA, O EL PAGO DE DICHA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO PUDIERE EXPONER A LA COMPAÑIA A ALGUNA SANCIÓN, PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN CONFORME A LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O SANCIONES COMERCIALES O ECONÓMICAS, LEYES O NORMATIVAS DE CUALQUIER JURISDICCIÓN APLICABLE A LA COMPAÑÍA.

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA. ***LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO.*** LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO SE DEBERA HACERA MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACION DE LA VIGENCIA DE LA POLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA. LAS CARÁTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL, CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LOS CANALES DE ATENCIÓN QUE SE ENCUENTAN EN LA PÁGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO, ***VER NOTA*** EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETANDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ÁRTICULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES. LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS. AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL. EL PRESENTE CERTIFICADO DE SEGUROS SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA 802091981 Y CERTIFICADO RE18993

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TOMADOR

(415)7709998911901(8020)0000000000

María Juana Herrera Rodríguez
CC: 52.420.596

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

SU-FO-10-01

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE - TERCERA COPIA - SUCURSAL/OFICINA EXPEDIDORA

CONFIANZA

Swiss Re Corporate Solutions

NIT: 860.070.374-9

Referencia para pago electrónico: 0000000000

Nit: 860533206 **DV:** 8

Tomador: ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A. QUE PODRA ABREVIARSE E I A S.A

Póliza: 802091981 **Certificado:** RE19045 **SUCURSAL:** C. ANDINO

Valor Póliza:$ 0

FECHA DE DD MM AAAA

CANTIDAD DE CHEQUES	COD. BANCO	CHEQUE No.	VALOR
		CHEQUES $	
		EFECTIVO $	
		(*) TOTAL	

(415)7709998911901(8020)0000000000

Canales de Pago:

- PSE en nuestra pagina web www.confianza.com.co en Pagos Confianza PC, regístrese con c.c. o nit y el dígito de verificación, seleccione la opción: PSE/tarjeta de crédito.

- En entidades bancarias y corresponsales: (con código de barras, presentando este cupón)

Bancos:
BBVA Davivienda Banco de Bogotá

Corresponsales bancarios:
Corresponsales bancarios de Bancolombia
Grupo Éxito-Carulla
Surtimax
Olímpica
Movilred
Grupo Gelsa
Corresponsal Daviplata-punto red
Otros consúltelos en nuestra página web.
Copidrogas
Red Cerca
EDEQ
Full recarga

IMPORTANTE:

- Si se requiere pagar más de una póliza, genere su cupón de pago en www.confianza.com.co en Pagos Confianza PC, regístrese con c.c. o nit y el dígito de verificación y seleccione las pólizas en la opción: Cupón de pagos.
- Es importante que esté actualizado su correo electrónico ya que a este le llegará su recibo de caja en línea, si paga por estos medios.
- No se reciben pagos mixtos.
(*) el valor a pagar puede ser menor o igual al valor de la póliza. No se reciben valores mayores al estipulado en este cupón.

- CLIENTE -

Dirección para notificaciones: Calle 82 Nº 11 - 37 Piso 7 - Bogotá, D.C.- Colombia. centrodecontacto@confianza.com.co

CONFIANZA

Swiss Re Corporate Solutions

NIT: 860.070.374-9

Referencia para pago electrónico: 0000000000

Nit: 860533206 **DV:** 8

Tomador: ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A. QUE PODRA ABREVIARSE E I A S.A

Póliza: 802091981 **Certificado:** RE19045 **SUCURSAL:** C. ANDINO

Valor Póliza:$ 0

FECHA DE DD MM AAAA

CANTIDAD DE CHEQUES	COD. BANCO	CHEQUE No.	VALOR
		CHEQUES $	
		EFECTIVO $	
		(*) TOTAL	

(415)7709998911901(8020)0000000000

Canales de Pago:

- PSE en nuestra pagina web www.confianza.com.co en Pagos Confianza PC, regístrese con c.c. o nit y el dígito de verificación, seleccione la opción: PSE/tarjeta de crédito.

- En entidades bancarias y corresponsales: (con código de barras, presentando este cupón)

Bancos:
BBVA Davivienda Banco de Bogotá


Corresponsales bancarios:
Corresponsales bancarios de Bancolombia
Grupo Éxito-Carulla
Surtimax
Olímpica
Movilred
Grupo Gelsa
Corresponsal Daviplata-punto red
Otros consúltelos en nuestra página web.
Copidrogas
Red Cerca
EDEQ
Full recarga

IMPORTANTE:

- Si se requiere pagar más de una póliza, genere su cupón de pago en www.confianza.com.co en Pagos Confianza PC, regístrese con c.c. o nit y el dígito de verificación y seleccione las pólizas en la opción: Cupón de pagos.
- Es importante que esté actualizado su correo electrónico ya que a este le llegará su recibo de caja en línea, si paga por estos medios.
- No se reciben pagos mixtos.
(*) el valor a pagar puede ser menor o igual al valor de la póliza. No se reciben valores mayores al estipulado en este cupón.

- BANCO -

Dirección para notificaciones: Calle 82 Nº 11 - 37 Piso 7 - Bogotá, D.C.- Colombia. centrodecontacto@confianza.com.co



ENERGÍA INTEGRAL ANDINA.

www.eia.com.co

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Yopal, 18 de junio de 2026

Señor
CARLOS ARTURO NARANJO AMAYA
Dirección: PROYECTO EN LA PEDRERA
Correo: carlos.naranjo@eiasa.com.co

Asunto: Solicitud de información radicado N° **1037432** del 05 de junio del 2026.

Para **GASES DEL CUSIANA S.A.S E.S.P BIC EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICOS** es de gran importancia proteger su infraestructura de daños por entidades de Orden Nacional, Regional, Empresas de Servicios Públicos, Firmas Contratistas, Personas Naturales o Jurídicas, como consecuencia de excavaciones, perforaciones, construcción de túneles, rellenos, retiro de estructuras superficiales mediante procedimientos mecánicos o explosivos u otras operaciones que impliquen movimiento de tierras.

Así las cosas, teniendo en cuenta la magnitud e impacto del proyecto relacionado con ustedes, recomendamos establecer un canal de comunicación, para de esta manera coordinar las actividades que están inmersas dentro del programa de prevención de daños de CUSIANAGAS S.A. E.S.P. ***LLAME ANTES DE EXCAVAR.***

Realizamos:

- Charla de seguridad al personal operativo/administrativo. Programa de prevención de daños ***LLAME ANTES DE EXCAVAR***
- Visitas y recorridos en campo. *(se coordina con anterioridad- comunicándose al número 311 237 7931)*
- Revisión de planos del tendido de las tuberías en polietileno y acero.
- Coordinación de acompañamiento
- Cualquier inquietud comunicarse al número 311 237 79 31; correo electrónico jamedina@grupodellano.com; Jhon Alexander Medina, Asistente II Distribución y Mantenimiento de CUSIANAGAS S.A. E.S.P.

Cabe resaltar que GASES DEL CUSIANA S.A.S E.S.P. BIC, **amplía su sistema de distribución de gas natural de acuerdo a las necesidades de cada sector y específicamente a solicitud de los potenciales usuarios, en dado caso, se realizará la gestión necesaria de permisos de intervención para las obras que se requieran.**

Cualquier inquietud quedamos atentos a su llamada para poder coordinar y así realizar el respectivo acompañamiento solicitado en campo.

Cordialmente,



JHON ALEXANDER MEDINA
Asistente II Distribución y Mantenimiento

Proyectó: SDA / DISTR
Aprobó: JAM / DISTR

620.07.

Yopal, 18 de junio de 2026

Empresa de energía de casanare S.A.E.S.P.
Radicado: 20260208543
Fecha: 2026-06-18 10:36:07
planeamiento.sistema

Señora
MARIA LINDSEY GONZALES
Solicitante
ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.
KR 19B N 166 73
(+57) 6016684343
comercial@eiasa.com.co
BOGOTA D.C.

ASUNTO Respuesta a radicado 20260105708

Cordial saludo,

En atención a lo solicitado respecto a la cartografía de la red de gas existente, protocolos de contingencia y contactos de atención para el proyecto de iluminación del sector La Pedrera, se remite la información cartográfica disponible correspondiente a las redes de distribución utilizadas para la prestación de los servicios públicos de gas natural en el municipio de Yopal, departamento de Casanare.

De igual manera, se informa que, previo a la ejecución de cualquier actividad que implique intervención, excavación o trabajos en proximidad a las redes de distribución de gas natural o energía eléctrica, deberá notificarse al operador de red ENERCA S.A. E.S.P. con una antelación mínima de setenta y dos (72) horas, con el fin de coordinar las acciones correspondientes y disponer del personal técnico requerido para el acompañamiento, supervisión y atención de cualquier eventualidad que pueda presentarse durante la ejecución de las obras.

En relación con los procedimientos, protocolos y planes de contingencia para la atención de emergencias o incidentes asociados a la infraestructura de gas natural, ENERCA S.A. E.S.P. cuenta con mecanismos de atención orientados a la identificación, evaluación y control de riesgos que puedan afectar la integridad de las redes de distribución. Estos procedimientos contemplan la recepción y atención de reportes de emergencia, la verificación técnica de las condiciones operativas de la infraestructura, el aislamiento de las áreas afectadas cuando sea requerido, la coordinación con organismos de socorro y autoridades competentes, así como la ejecución de las acciones necesarias para restablecer las condiciones seguras de operación y garantizar la continuidad del servicio.

En caso de presentarse una emergencia relacionada con el servicio de gas domiciliario, deberá comunicarse de manera inmediata con la línea de atención de emergencias 115, habilitada por ENERCA S.A. E.S.P. para la recepción y atención de reportes.

En virtud de lo anterior, tomando en cuenta que se ha obrado conforme a la normatividad vigente, que se atendió en debida forma la solicitud presentada, de acuerdo con la Ley 142 de 1994, con la presente se da por contestada la petición.

En consideración con lo anteriormente expuesto, se estará atento a cualquier comunicación referente al tema, manifestando nuestra disposición de atender todas las inquietudes de la comunidad y demás partes interesadas.

Atentamente,

JORGE ERNESTO SOCADAGUI PEREZ
Dir. Ingeniería y Planeamiento

JORGE MARIO HURTADO SANA
Profesional de Apoyo

Proyectó: Jorge Mario Hurtado Sana
Vo. Bo. / Aprobó:: Jorge Ernesto Socadagui Perez

ESTADO DEL TIEMPO

ASOSUPRO
Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso

ESTADO DEL CLIMA

CONTRATO N°	**019 de 2026**	**PROYECTO N°**	**2025850010003**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	019 de 2026
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	Proyectos Triple O S.A.S.

HORAS	DEL 09 AL 30 DE JUNIO 2026																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
07:00 AM - 8:00 AM									0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	
08:00 AM - 9:00 AM									0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	
10:00 AM - 11:00 AM									0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	
11:00 AM - 12:00 M									0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	
12:00 M - 1:00 PM									0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	
1:00 PM - 2:00 PM									0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	
2:00 PM - 3:00 PM									0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	
3:00 PM - 4:00 PM									0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	
4:00 PM - 5:00 PM									0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	
5:00 PM - 6:00 PM									0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	
HORAS PERDIDAS POR LLUVIA									0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	
TOTAL HORAS LLUVIA	0																														

OBSERVACIONES: Durante el periodo reportado no se registraron horas perdidas por lluvia.

FIRMA:


LAURO DANIEL LEÓN GARZÓN
DIRECTOR OBRA


REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

1.1.1 Realizar Preliminares

Replanteo de obra- Actividades de levantamiento topográfico.

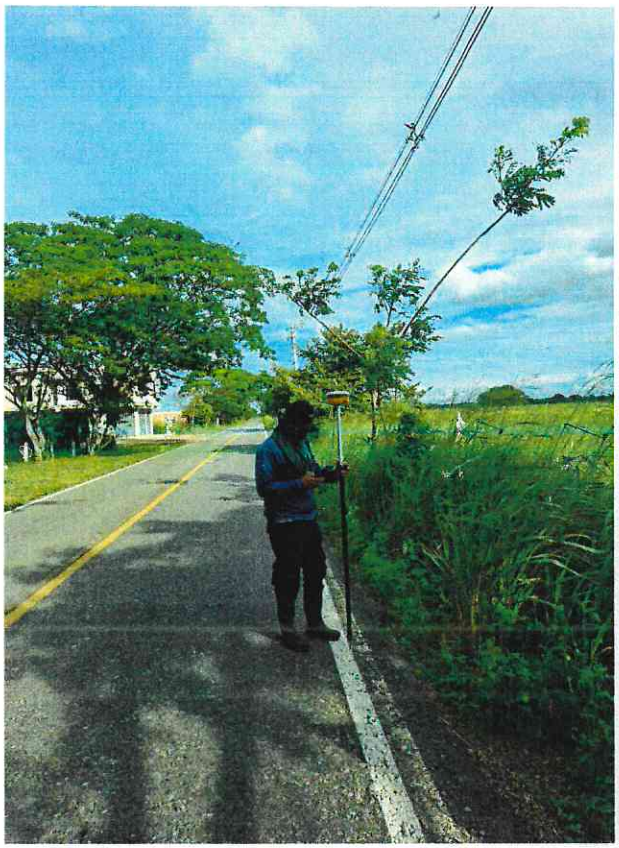

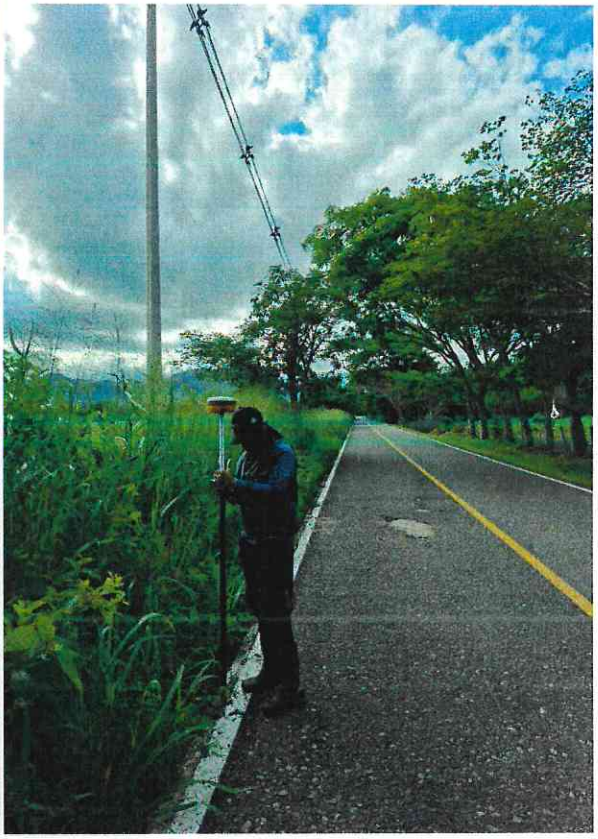

1.1.5 Realizar Plan de Manejo Ambiental-PMA

INFORME MENSUAL No. 01

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003



F(GI)042 ACTA DE REUNIÓN

ACTA N°: 001			
Fecha de Reunión:	AÑO:2026 MES:06 DÍA:26	Lugar:	MEET
Hora de Inicio:	3:00 PM	Hora de Terminación:	4:00PM
Objetivo de la Reunión:	Realizar la socialización del Plan de Manejo Ambiental (PMA) con el personal profesional especializado aprobado para el proyecto, con el fin de dar a conocer los programas, medidas de manejo, responsabilidades y obligaciones ambientales que deberán implementarse durante la ejecución del Contrato		


	ASISTENTES	FIRMA
1	Lauro Daniel León Garzón	
2	Joaquín Vargas Rodriguez	
3	Laura Camila Caballero Roldan	
4	Néstor Raúl Canchón Casas	
5	Sandra Milena Hernández Esguerra	

	ORDEN DEL DÍA
1	Presentación del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

45 Pág | PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE

PROGRAMA No. 2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	
• Replanteo de obra. Excavación manual en material común del sitio para cimentación de postes de alumbrado público solar (incluye retiro y disposición final- instalación de postes. Cimentación de postes. • Suministro e instalación de luminarias solar ELITE III PRO 6M-SL. Incluye (Luminaria LED, Panel solar fotovoltaico y batería, soporte para conexiones, brazo metálico galvanizado y collarín anti vandálico) • Desmovilización de equipos, limpieza de áreas intervenidas y entrega de la obra	• Alteración a las características fisicoquímicas y biológicas del suelo. • Alteración en la oferta y disponibilidad del recurso suelo. • Alteración a la calidad visual del paisaje. • Alteración a la calidad fisicoquímica y bacteriológica del recurso hídrico superficial. • Generación de malos olores.
TIPO DE MEDIDA	ETAPA
Prevención	Construcción
CONDICIÓN ESPECIAL	RESPONSABLES
Frente de Obra en la vía la Pedrera Yopal Casanare, objeto de implementación de Sistemas solares fotovoltaicos de iluminación	• **Administrador del proyecto** Garantizar recursos para la ejecución de este programa y realizar el seguimiento al desarrollo de las actividades programadas. • **Constructor/Ejecutor** Responsable de la ejecución de las medidas diseñadas.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES O ACCIONES A DESARROLLAR		
MEDIDA DE MANEJO	PROCEDIMIENTO	EVALUACIÓN SEGUIMIENTO
• PSM3 Instalación de puntos ecológicos	• Colocar contenedores para residuos reciclables y no reciclables en puntos clave. Ubicación visible, accesible, rotulación clara. 	• Formato de registro mensual de residuos. • Registro fotográfico
• PSM2 Capacitación en separación en la fuente	• Realizar talleres informativos sobre clasificación de residuos a todos los trabajadores	• Registro de la evaluación de comprensión de los conocimientos PMA.



ENERGÍA INTEGRAL ANDINA.

www.eia.com.co

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO



PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE

Energía Integral Andina

Tabla de Contenido

INTRODUCCIÓN 3
1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 4
2. TIEMPO DE EJECUCIÓN 4
3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 5
MAPA DE LOCALIZACIÓN DE A INTERVENIR 5
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6
5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 7
6. GENERALIDADES DE CONSTRUCCIÓN 7
6.1. Estrategia y Coordinación del Frente de Obra 7
6.2. Proceso Constructivo de Ejecución 8
6.2.1. Proceso de Replanteo Topográfico 8
6.2.2. Proceso de Obra Civil 8
6.2.3. Proceso de Instalación 9
6.2.4. Proceso de Certificación 9
7. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN POR ACTIVIDAD 10
Fase I: Replanteo Topográfico y Seguridad (Frente Inicial) 10
1. Localización de Estacas por el Área Topográfica 10
2. Implementación del PMT (Plan de Manejo de Tránsito) y Seguridad 10
Fase II: Obra Civil (Cimentación y Soporte) 11
3. Excavación y Perforación de Huecos (50x50 cm, Profundidad: 1.80 m) 11
4. Creación de Zapata de 10 cm (2500 psi) para Instalación de Poste 11
5. Izaje de Poste de 12 Metros de Altura en Zapatas 12
6. Relleno de Base de Postes en Hueco con Concreto para Retención de Poste 12
7. Limpieza de Área Trabajada 12
Fase III: Instalación y Montaje Electromecánico 13
8. Instalación de Luminarias ya con los Paneles Solares 13
9. Protección de Luminaria 13
10. Recolección de Escombro 13
Fase IV: Pruebas y Certificación (Cierre del Frente) 14
11. Pruebas de Luminarias 14
12. Certificación de Cumplimiento 14
8. CONCLUSIONES 15

INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo describir de manera detallada y técnica los procesos constructivos asociados a las actividades contempladas en el proyecto de infraestructura vial y rural. En él se especifican los procedimientos de ejecución, los recursos requeridos y las condiciones técnicas mínimas que deben cumplirse para garantizar una adecuada implementación de cada una de las unidades de obra, conforme a las exigencias del contrato, los estudios previos, los planos aprobados y las normativas vigentes aplicables en Colombia.

Cada actividad descrita responde a una planificación técnica previa que considera criterios de calidad, seguridad y funcionalidad, así como las recomendaciones derivadas de estudios geotécnicos, estructurales. Se parte del principio de que toda intervención en obra debe comenzar con la revisión exhaustiva de los diseños, memorias de cálculo, especificaciones técnicas, manuales del fabricante y normatividad sectorial, lo que permite definir los medios, métodos y secuencia de trabajo más adecuados según las condiciones del sitio y los objetivos del proyecto.

El documento también contempla la necesidad de contar con personal capacitado, equipos y herramientas en óptimas condiciones, y materiales que cumplan con las especificaciones técnicas exigidas. El adecuado uso de estos recursos y el cumplimiento riguroso de los procedimientos establecidos contribuyen no solo a la calidad del producto final, sino también a la eficiencia en tiempos de ejecución y a la reducción de riesgos técnicos, económicos y de seguridad.

1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN BÁSICA	
OBJETO CONTRATO DE OBRA:	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.
VALOR DEL CONTRATO:	$5.369.899.707
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	$5.369.899.707
CONTRATISTA DE OBRA	Energía Integral Andina S.A.
CORREO ELECTRÓNICO:	gerencia@eiasa.com.co; carlos.naranjo@eiasa.com.co
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	019 de 2026
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	Proyectos Triple O S.A.S.
CORREO ELECTRÓNICO:	Juamclp0315@hotmail.com; tripleosas@hotmail.com

2. TIEMPO DE EJECUCIÓN

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL			
FECHA DE INICIACIÓN:			09/06/2026
PRÓRROGA:			N/A
SUSPENSIÓN:			N/A
TIEMPO:			N/A
REINICIO:			N/A
FECHA DE TERMINACIÓN			08/03/2027
TIEMPO DE EJECUCIÓN			Nueve (9) meses
9	Meses	0	Días

3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO


MUNICIPIO:	YOPAL CASANARE	VEREDA:	Vía La Pedrera
CORREGIMIENTO:	N/A	BARRIO:	Vía La Pedrera
COMUNA:	N/A		

COORDENADAS:

TRAMO A INTERVENIR							
PUNTO INICIAL				PUNTO FINAL			
K0+000				K12+7353,93			
PLANAS		GEOGRAFICAS		PLANAS		GEOGRAFICAS	
N: 1079910.452	E:855282.146	LAT: 5.317450°	LONG: -72.383000°	N:1078981.067	E:854818.949	LAT: 5.309039°	LONG:-72.387160°

MAPA DE LOCALIZACIÓN DE A INTERVENIR



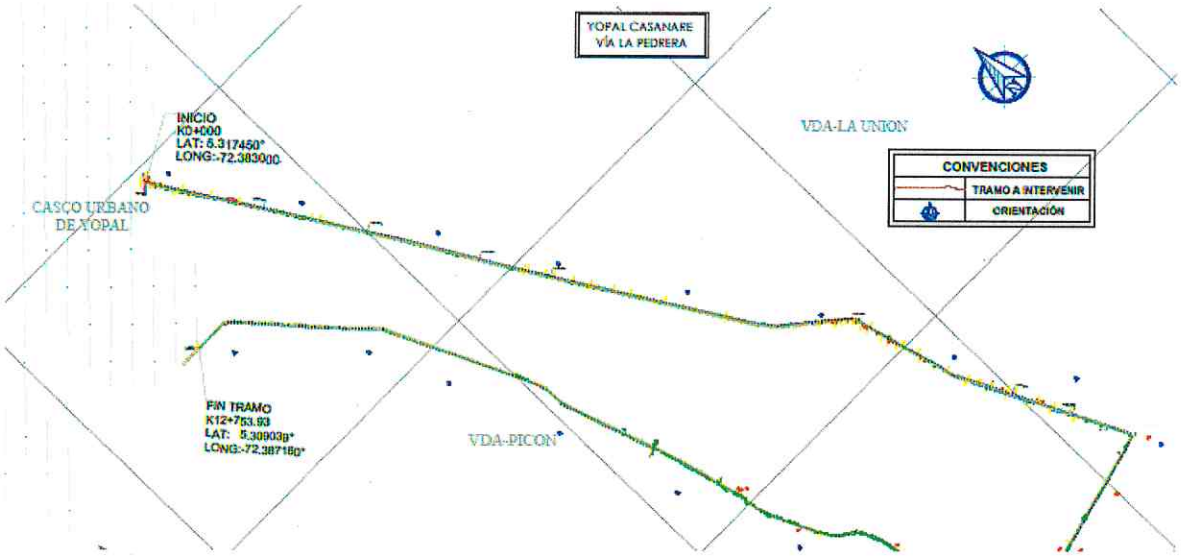

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La alternativa de solución consiste en instalar un sistema de alumbrado público basado en tecnología solar fotovoltaica, mediante luminarias autónomas que captan, almacenan y utilizan la energía solar para la iluminación nocturna de la vía la pedrera del municipio de Yopal, Casanare. Esta solución busca suplir la carencia de infraestructura eléctrica convencional, aprovechando las condiciones de irradiación solar de la región, garantizando así una solución eficiente, sostenible y de bajo impacto ambiental.

Esta solución tecnológica corresponde a un sistema de iluminación solar autónomo de baja potencia, diseñado especialmente para aplicaciones de alumbrado en zonas rurales, senderos peatonales, parques, áreas comunes o vías secundarias con baja densidad vehicular.

Esta alternativa se compone de los siguientes elementos:

- Luminaria LED de 35W, con eficiencia lumínica mayor a 140 lm/W, garantizando un nivel de iluminación adecuado para áreas de baja exigencia.
- Panel solar monocristalino, de alta eficiencia, optimizado para cargas solares diarias promedio y dimensionado para garantizar una autonomía mínima de 44 horas, incluso en días consecutivos con baja radiación solar.
- Batería de Litio $LiFePO_4$, con vida útil estimada de entre 8 y 10 años, diseñada para soportar 2.000 ciclos de descarga al 50%.
- Controlador inteligente con tecnología MPPT, que optimiza la conversión de energía solar, gestiona la carga y descarga de la batería.

5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

El presente documento establece la metodología constructiva y la estrategia operativa para la ejecución del proyecto **"Implementación de sistemas solares fotovoltaicos de iluminación en la vía La Pedrera del municipio de Yopal, Casanare"**.

La estrategia de ejecución se fundamenta en la activación de frentes de obra secuenciales y simultáneos, diseñados estratégicamente para optimizar el rendimiento de los recursos humanos, logísticos y de maquinaria. Asimismo, esta planificación operativa prioriza la mitigación de impactos sobre la movilidad vial y el normal desarrollo de las actividades comerciales y sociales de la comunidad en el área de influencia.

Cada frente de trabajo se desarrollará bajo una secuencia lógica y cronológica de actividades, que abarca desde las obras preliminares y civiles hasta el montaje electromecánico, pruebas y entrega final. Todo el proceso se ejecutará en estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto, los reglamentos técnicos vigentes (RETIE y RETILAP), las normativas de seguridad y salud en el trabajo (SST) y los planes de manejo ambiental establecidos.

6. GENERALIDADES DE CONSTRUCCIÓN

A continuación, se presentan las **generalidades del procedimiento constructivo** para el proyecto de *"Implementación de sistemas solares fotovoltaicos de iluminación en la vía La Pedrera del municipio de Yopal, Casanare"*, estructurado bajo la secuencia técnica requerida:

6.1. Estrategia y Coordinación del Frente de Obra

Una estrategia de **Frente de Obra Móvil y Secuencial**. Al ser una intervención a lo largo de un corredor vial, el frente de obra no es estático; se desplaza a medida que se completan las actividades, operando como una "cadena de producción" en campo.

- **Plan de Manejo de Tránsito (PMT):** Antes de activar cualquier frente de obra, se implementará la señalización e información vial (paleteros, conos, vallas reflectivas) aprobada por la Secretaría de Tránsito de Yopal, garantizando la seguridad de los trabajadores y de los usuarios de la vía La Pedrera.
- **Logística y Acopio Temporal:** Cada frente de obra contará con un vehículo de apoyo para el transporte inmediato de herramientas, agregados para concreto y retiro de escombros, evitando el almacenamiento prolongado de materiales sobre la

berma de la vía.

- **Coordinación de Cuadrillas:** Se organizarán cuadrillas especializadas que avanzan de forma escalonada, evitando que el proceso de obra civil se distancie excesivamente del proceso de replanteo, o que los postes queden izados sin componentes eléctrico.

6.2. Proceso Constructivo de Ejecución

En esta sección se detallan las actividades de los frentes de trabajo y el orden secuencial requerido para su correcta ejecución.

6.2.1. Proceso de Replanteo Topográfico

Este paso inicial garantiza que la localización de cada punto de iluminación sea geométricamente correcta y cumpla con los diseños de iluminación vial y de seguridad.

- **Localización y Referenciación:** Utilizando equipos de precisión (GPS diferencial o Estación Total), se identifican y marcan los puntos exactos donde se ubicará cada luminaria solar en la vía La Pedrera.
- **Verificación de Interferencias:** Se realiza un recorrido de campo para asegurar que no existan redes de servicios públicos subterráneas o aéreas, ni arborización densa que genere sombras sobre los paneles solares (lo que afectaría la eficiencia del sistema).
- **Ajustes de Campo:** En caso de obstrucciones, se realizan las modificaciones de abscisado con la aprobación de la interventoría.

6.2.2. Proceso de Obra Civil

Comprende todas las actividades de adecuación del terreno y construcción de las bases que soportan la infraestructura fotovoltaica.

- **Excavación:** Apertura de fosas para las cimentaciones de los postes. Debido a las condiciones del suelo y el clima de Yopal (lluvias estacionales altas), se debe garantizar el bombeo de agua si es necesario.
- **Cimentación y Concretos:** * Instalación de pernos de anclaje y canastillas de refuerzo en acero según el diseño estructural.
    - Vaciado de concreto para las bases de los postes.
    - Construcción de cajas de inspección y canalizaciones subterráneas para los

sistemas de puesta a tierra (SPT).

- **Obras de Protección:** Construcción de sardineles o pedestales elevados alrededor del poste para proteger la estructura de posibles impactos vehiculares en la vía.

6.2.3. Proceso de Instalación

Etapa mecánica y eléctrica donde se ensamblan e integran los componentes del sistema solar fotovoltaico individual.

- **Armado e Izado del Poste:** Ensamblaje de los tramos del poste (si aplica) e izado y fijación del mismo sobre la base de concreto la cual va con un caja de concreto de 50x50 el cual sostiene el poste.
- **Montaje del Sistema Fotovoltaico:**
  - Instalación de la estructura de soporte del panel solar orientada y calibrada con la inclinación óptima para la latitud de Yopal (para maximizar la captación de radiación).
  - Montaje del panel solar y fijación de la luminaria LED en el brazo del poste.

6.2.4. Proceso de Certificación

Fase final de control de calidad y cumplimiento normativo indispensable para la puesta en marcha oficial del proyecto viales en Colombia.

- **Pruebas de Funcionamiento (Puesta en Marcha):** Verificación de los ciclos de carga diurna y encendido/apagado automático nocturno (mediante fotocelda o programación horaria).
- **Mediciones Técnicas:** Pruebas de resistencia y medición de niveles de iluminación (luxes) sobre la calzada de la vía La Pedrera para constatar el cumplimiento de las normas de iluminación vial.
- **Certificación RETIE y RETILAP:** * Inspección por parte de un organismo acreditado para verificar la conformidad con el **RETIE** (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas).
  - Verificación del cumplimiento del **RETILAP** (Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público), asegurando que el proyecto sea eficiente energéticamente y seguro para los usuarios de la vía.
- **Entrega de As-Built:** Elaboración de planos finales y manuales de operación y mantenimiento para el municipio.

7. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN POR ACTIVIDAD

Se desarrolla detalladamente el proceso constructivo por actividad para el proyecto de la vía La Pedrera (Yopal), estructurado bajo las 12 actividades específicas solicitadas y alineado con las fases técnicas obligatorias.

Fase I: Replanteo Topográfico y Seguridad (Frente Inicial)	
1. Localización de Estacas por el Área Topográfica	**Descripción:** Consiste en la ubicación en campo de los puntos definitivos donde se instalará cada poste, tomando como referencia las estacas y marcas previamente validadas por el equipo de topografía. **Especificación:** Se deben verificar rigurosamente las medidas de la vía La Pedrera (ancho de calzada, berma y zona de retiro) utilizando cinta métrica o distanciómetro. Esto garantiza que la distancia entre el borde de la vía y el poste cumpla con las distancias de seguridad vial y las distancias interpostales calculadas en el diseño fotométrico.
2. Implementación del PMT (Plan de Manejo de Tránsito) y Seguridad	**Descripción:** Activación de las medidas de seguridad industrial y control del tráfico vehicular antes de iniciar cualquier labor física en la vía. **Especificación:** Instalación de señalización temporal de obra (conos, vallas reflectivas, señales de "Hombres en Vía", paleteros) de acuerdo con el PMT aprobado por la Secretaría de Tránsito de Yopal. Todo el personal del frente de obra

	debe contar con sus Elementos de Protección Personal (EPP) obligatorios: casco con barbuquejo, chaleco reflectivo, botas de seguridad y guantes.
Fase II: Obra Civil (Cimentación y Soporte)	
3. Excavación y Perforación de Huecos (50x50 cm, Profundidad: 1.80 m)	**Descripción:** Apertura del terreno en los puntos localizados para alojar la estructura de cimentación del poste. **Especificación:** La excavación se realizará de forma manual o con ayuda de un hoyador mecánico, garantizando una sección cuadrada de 50x50 cm y una profundidad estricta de 1.80 m. En caso de encontrar un nivel freático alto o inestabilidad en las paredes del suelo (común en Yopal), se deberán emplear sistemas de entibado temporal o bombeo de agua.
4. Creación de Zapata de 10 cm (2500 psi) para Instalación de Poste	**Descripción:** Fundición de un solado o base limpia de concreto en el fondo del hueco excavado. **Especificación:** Se vierte una capa de concreto de 10cm de espesor con una resistencia a la compresión de 2500 psi (17.5 MPa). Esta zapata sirve como base nivelada, evita que el poste se hunda directamente en la tierra blanda y aísla la estructura de la humedad directa del suelo antes de la fundición final.

5. Izaje de Poste de 12 Metros de Altura en Zapatas	**Descripción:** Elevación y colocación vertical del poste de 12 metros dentro de la excavación sobre la zapata previamente ejecutada. **Especificación:** Debido a las dimensiones del poste (12 metros de longitud), su peso y su composición de fibra de vidrio, el izaje se realizará de forma manual. Este proceso estará bajo la supervisión constante de la cuadrilla y su líder. Para garantizar la verticalidad, el poste se alineará mediante plomadas de cara y se estabilizará temporalmente con vientos (tensores) para evitar cualquier desplazamiento.
6. Relleno de Base de Postes en Hueco con Concreto para Retención de Poste	**Descripción:** Confinamiento y fijación definitiva del poste mediante el llenado de la excavación. **Especificación:** El espacio libre del hueco de (50x50 cm alrededor del poste) se rellena en su totalidad con concreto estructural de (3000 psi). El concreto se debe vibrar o chuzar adecuadamente para evitar vacíos o colmenas. Se mantiene el poste asegurado hasta que el concreto logre el fraguado inicial que garantice su auto-soporte y estabilidad mecánica contra las cargas de viento.
7. Limpieza de Área Trabajada	**Descripción:** Acondicionamiento ambiental inmediato del punto intervenido tras finalizar las obras civiles pesadas. **Especificación:** Se retiran las herramientas, maderas de formaletas, plásticos y cualquier elemento ajeno a la vía. El suelo circundante se nivela para evitar desniveles peligrosos en la berma de la vía La Pedrera.


Fase III: Instalación y Montaje Electromecánico	
8. Instalación de Luminarias ya con los Paneles Solares	**Descripción:** Montaje del bloque tecnológico superior que compone el sistema de iluminación solar autónomo. **Especificación:** Utilizando una canastilla elevadora o carro canasta (para trabajo en alturas), el personal técnico realiza el montaje del brazo, la luminaria LED de alta eficiencia y la estructura de soporte del panel solar en la punta del poste de 12 metros. Los paneles fotovoltaicos se deben orientar geográficamente hacia el verdadero norte/sur (según el diseño) e inclinarse de acuerdo con la latitud de Casanare para aprovechar la máxima radiación solar. Se conecta el cableado interno hacia el controlador.
9. Protección de Luminaria	**Descripción:** Aseguramiento físico, eléctrico y ambiental de los componentes instalados. **Especificación:** Consiste en la aplicación de sellos herméticos en los prensaestopas y cajas de control para garantizar un índice de protección mínimo IP65 o IP66 contra el ingreso de agua de lluvia y polvo. Asimismo, se incluye una protección en el poste para evitar robo o daños a la infraestructura instalada.
10. Recolección de Escombro	**Descripción:** Retiro y disposición final de la tierra sobrante de la excavación y residuos de concreto. **Especificación:** Toda la tierra que no se utilizó para el lleno o el material de escombro generado se carga en volquetas y se transporta fuera de la vía hacia una

	escombrera autorizada por las autoridades ambientales de Yopal. El frente de obra debe quedar libre de obstáculos visuales o físicos para los vehículos.
Fase IV: Pruebas y Certificación (Cierre del Frente)	
11. Pruebas de Luminarias	**Descripción:** Verificación del correcto funcionamiento del sistema solar e iluminación. **Especificación:** Se realizan pruebas de encendido forzado diurno (simulando la noche tapando el sensor/fotocelda) para comprobar el circuito, el controlador y las baterías. Posteriormente, se hacen mediciones nocturnas con un luxómetro para verificar que el nivel de iluminancia sobre la calzada cumpla con los requerimientos uniformes de visibilidad vial del proyecto.
12. Certificación de Cumplimiento	**Descripción:** Legalización e inspección oficial de la infraestructura instalada bajo el marco normativo colombiano. **Especificación:** Un organismo de inspección acreditado (tercera parte) realiza la auditoría técnica en campo para emitir los dictámenes de conformidad con el RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas) para el sistema de captación/baterías, y el RETILAP (Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público) para los niveles de luz en la vía La Pedrera. Esta certificación es el requisito obligatorio para la recepción final de la obra por parte del municipio.


8. CONCLUSIONES

El procedimiento constructivo del proyecto se consolida como una metodología eficiente, limpia y segura gracias a una planificación logística adaptada al clima de Yopal y al uso de luminarias solares autónomas con panel integrado en la parte superior. Esta configuración tecnológica simplifica drásticamente la obra al prescindir de canalizaciones subterráneas y cableado de red externo, limitando las actividades eléctricas al conexionado interno directo y permitiendo un protocolo de pre-ensamble en tierra que reduce los trabajos en alturas y los riesgos de SST. Finalmente, la ejecución coordinada del vaciado de cimentaciones bajo la norma NSR-10, junto con un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) eficaz para el izaje de los postes en las bermas, garantiza la estabilidad estructural y la puesta en marcha del sistema sin afectar la seguridad ni la movilidad en la vía La Pedrera.

FIRMA



Nombre:LAURO DANIEL LEÓN GARZÓN
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 20641705



ENERGÍA INTEGRAL ANDINA®

www.eia.com.co

ACTA APROBACIÓN DE PERSONAL DE OBRA

ACTA APROBACIÓN PERSONAL OBRA

CONTRATO N°	019 DE 2026	PROYECTO N°	2025850010003

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.
CONTRATISTA DE OBRA:	ENERGÍA INTEGRAL ANDINA S.A.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 019 DE 2026**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	**PROYECTOS TRIPLE O SAS**

Se deja constancia que la Interventoría revisó y aprobó las hojas de vida con sus respectivos soportes, de acuerdo con lo solicitado en los Pliegos de Condiciones del contrato N°019 de 2026.

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	PROFESIÓN	MATRICULA PROFESIONAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECÍFICA	TIPO DE VINCULACIÓN
DIRECTOR DE OBRA	Lauro Daniel León Garzón	Ingeniero Electrónico	20641705	21 años	8 años	Contrato laboral
RESIDENTE DE OBRA	Joaquín Vargas Rodríguez	Ingeniero Electromecánico	BY25007973	30 años	6 años	Contrato laboral
INGENIERO AMBIENTAL	Laura Camila Caballero Roldan	Ingeniera Ambiental	091021-0511508	6 años	5 años	Prestación de servicios
TECNOLOGO ELECTRICISTA	Nestor Raul Canchon Casas	Tecnólogo electricista	25596-80737747	24 años	3 años	Contrato laboral
PROFESIONAL SISOMA	Sandra Milena Hernández Esguerra	Profesional en seguridad y salud en el trabajo	25-01029	12 años	7 años	Contrato laboral


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Villavicencio a los 02 días del mes junio del 2026.

JOSUE NEFTALI VALERO CAMARGO
Firmado digitalmente por JOSUE NEFTALI VALERO CAMARGO
Fecha: 2026.06.04 15:04:12 -05'00'

Firma
Nombre JOSUÉ NEFTALI VALERO CAMARGO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma
Nombre LUZ NEILA DIAZ MOGOLLÓN
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Anexo: Hojas de vida con sus soportes (Certificados de estudio, Tarjeta profesional, Certificado vigencia, certificados laborales, Procuraduría, Contraloría, Policía, Examen médico de ingreso)



ENERGÍA INTEGRAL ANDINA®

www.eia.com.co

CERTIFICADOS ANTECEDENTES CONTRATISTA

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 01 de junio de 2026, a las 15:00:34, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	8605332068
Código de Verificación	8605332068260601150034

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 297167054

PIB
14:06:17

Bogotá DC, 01 de junio del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona ENERGIA INTEGRAL ANDINA S A QUE PODRA ABREVIARSE E I A S A identificado(a) con NIT número 8605332068:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



ENERGÍA INTEGRAL ANDINA.

www.eia.com.co

CERTIFICADOS ANTECEDENTES REPRESENTANTE LEGAL

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 03:25:01 PM horas del 10/07/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **3797710**

Apellidos y Nombres: **VALERO CAMARGO JOSUE NEFTALI**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 10 de julio de 2026, a las 14:55:07, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	3797710
Código de Verificación	3797710260710145507

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 299290005

PIB
14:57:02

Bogotá DC, 10 de julio del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JOSUE NEFTALI VALERO CAMARGO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 3797710:


NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



ENERGÍA INTEGRAL ANDINA.

www.eia.com.co

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO OBRA

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO OBRA

ASOSUPRO
Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003
FECHA DE INICIO:	9/6/2026	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE		
CONTRATISTA DE OBRA :	Energía Integral Andina S.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	019 de 2026		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	Proyectos Triple O S.A.S.		

ACTA:	ACTA DE INICIO DEL 09/06/2026 AL 08/03/2027
CAPITULO:	1.1.1 Realizar preliminares

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.01	Replanteo de Obra	Und

I. MATERIALES

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Larguero de Madera comun	4.00	und	$ 8,970.4050	$ 35,881.6200
2					
				Subtotal	$ 35,881.6200

II. EQUIPOS

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
3	Herramienta menor (5% mano de obra)	1.00	glb	$ 2,450.2300	$ 2,450.2300
4	Estación Total	0.0500	Manual	$ 106,461.6000	$ 5,323.0800
5					
				Subtotal	$ 7,773.3100

III. MANO DE OBRA

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
6	Topógrafo	1.00	Hora	$ 29,658.5900	$ 29,658.5900
7	Cadenero	1.00	Hora	$ 19,345.9800	$ 19,345.9800
				Subtotal	$ 49,004.5700

IV.TRANSPORTE

N°	Descripción	Volumen ó	Distancia	m2 ó Ton/Km	Valor Unitario	Valor Total
8						
					Subtotal	$ -
					Total Costo Directo	$ 92,659.5000
					A (18%)	$ 16,679.0000
					I (2%)	$ 1,853.0000
					U (5%)	$ 4,633.0000
					Valor total Analisis Unitario	$ 115,824.5000

JUSTIFICACIÓN CONTRATISTA

Los valores considerados en los APU corresponden a los precios unitarios establecidos y aprobados en el marco del Contrato N.° 019 de 2026, de acuerdo con las condiciones económicas contractualmente definidas

OBSERVACIÓN INTERVENTORIA

Los valores aprobados corresponden a los montos aplicables al contrato de obra No 019 de 2026 derivado del proceso de contratación LP-018 de 2026

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia

martes, junio 30, 2026

Firma
Nombre: JOSUE NEFTALI VALERO CAMARGO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma
Nombre: LUZ NEILA DIAZ MOGOLLÓN
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 20641705

Firma
Nombre: Esneider Rafael Torres Suarez
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: AT205-90991

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO OBRA

ASOSUPRO
Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003
FECHA DE INICIO:	9/6/2026	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE		
CONTRATISTA DE OBRA :	Energía Integral Andina S.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	019 de 2026		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	Proyectos Triple O S.A.S.		

ACTA:	ACTA DE INICIO DEL 09/06/2026 AL 08/03/2027
CAPITULO:	1.1.1 Realizar preliminares

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.02	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas del sitio (incluye retiro y disposición final)	m2

I. MATERIALES

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Derechos de conformación y/o disposición de materiales sobrantes (Incluye todos los costos inherentes a las posibles obras requeridas en los sitios de disposición de sobrantes)	0.0286	m3	$ 7,926.7500	$ 226.7100
2					
				Subtotal	$ 226.7100

II. EQUIPOS

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Herramienta menor (5% mano de obra)	1.00	glb	$ 110.65	$ 110.6500
2	Guadañadora	0.0286	Mixto	$ 8,671.87	$ 248.0200
3					
				Subtotal	$ 358.6700

III. MANO DE OBRA

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Cuadrilla (1 oficial + 1 ayudante)	0.0572	Hora	$ 38,692.00	$ 2,213.1800
2					
				Subtotal	$ 2,213.1800

IV.TRANSPORTE

N°	Descripción	Volumen ó	Distancia	m2 ó Ton/Km	Valor Unitario	Valor Total
1	Transporte de Materiales sobrantes a escombrera	0.0286	16.70	Km	$ 1,778.9300	$ 849.6500
					Subtotal	$ 849.6500
					Total Costo Directo	$ 3,648.2100
					A (18%)	$ 657.0000
					I (2%)	$ 73.0000
					U (5%)	$ 182.0000
					Valor total Analisis Unitario	$ 4,560.2100

JUSTIFICACIÓN CONTRATISTA
Los valores considerados en los APU corresponden a los precios unitarios establecidos y aprobados en el marco del Contrato N.° 019 de 2026, de acuerdo con las condiciones económicas contractualmente definidas
OBSERVACIÓN INTERVENTORIA
Los valores aprobados corresponden a los montos aplicables al contrato de obra No 019 de 2026 derivado del proceso de contratación LP-018 de 2026

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia

martes, junio 30, 2026

Firma
Nombre: JOSUE NEFTALI VALERO CAMARGO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma
Nombre: LUZ NEILA DIAZ MOGOLLÓN
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 20641705

Firma
Nombre: Esneider Rafael Torres Suarez
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: AT205-90991

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO OBRA

ASOSUPRO
Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003
FECHA DE INICIO:	9/6/2026	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE		
CONTRATISTA DE OBRA :	Energía Integral Andina S.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	019 de 2026		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	Proyectos Triple O S.A.S.		

ACTA:	ACTA DE INICIO DEL 09/06/2026 AL 08/03/2027
CAPITULO:	1.1.2 Realizar Alumbrado público

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.01	Excavación manual en material común del sitio para cimentación de postes de alumbrado público solar (Incluye retiro y disposición final)	m2

I. MATERIALES

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Derechos de conformación y/o disposición de materiales sobrantes (Incluye todos los costos inherentes a las posibles obras requeridas en los sitios de disposición de sobrantes)	1.00	m3	$ 7,926.7500	$ 7,926.7500
2					
				Subtotal	$ 7,926.7500

II. EQUIPOS

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Herramienta menor (10% mano de obra)	1.00	glb	$ 2,086.1000	$ 2,086.1000
2					
3					
				Subtotal	$ 2,086.1000

III. MANO DE OBRA

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Cuadrilla (1 oficial + 2 ayudantes)	0.4000	Hora	$ 52,152.0000	$ 20,860.8000
2					
				Subtotal	$ 20,860.8000

IV.TRANSPORTE

N°	Descripción	Volumen ó	Distancia	m2 ó Ton/Km	Valor Unitario	Valor Total
1	Transporte de Materiales sobrantes a escombrera	1.0000	16.70	Km	$ 1,778.9300	$ 29,708.1300
					Subtotal	$ 29,708.1300
					Total Costo Directo	$ 60,581.7800
					A (18%)	$ 10,905.0000
					I (2%)	$ 1,212.0000
					U (5%)	$ 3,029.0000
					Valor total Analisis Unitario	$ 75,727.7800

JUSTIFICACIÓN CONTRATISTA

Los valores considerados en los APU corresponden a los precios unitarios establecidos y aprobados en el marco del Contrato N.° 019 de 2026, de acuerdo con las condiciones económicas contractualmente definidas

OBSERVACIÓN INTERVENTORIA

Los valores aprobados corresponden a los montos aplicables al contrato de obra No 019 de 2026 derivado del proceso de contratación LP-018 de 2026

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia

martes, junio 30, 2026

Firma
Nombre: JOSUE NEFTALI VALERO CAMARGO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma
Nombre: LUZ NEILA DIAZ MOGOLLÓN
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 20641705

Firma
Nombre: Esneider Rafael Torres Suarez
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: AT205-90991

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO OBRA

ASOSUPRO
Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003
FECHA DE INICIO:	9/6/2026	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE		
CONTRATISTA DE OBRA :	Energía Integral Andina S.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	019 de 2026		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	Proyectos Triple O S.A.S.		

ACTA:	ACTA DE INICIO DEL 09/06/2026 AL 08/03/2027	
CAPITULO:	1.1.2 Realizar Alumbrado público	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.02	Suministró e instalación de poste en fibra de vidrio para alumbrado publico (12 ml 510 kgf)	UND

I. MATERIALES

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Poste En Fibra de Vidrio 12 Metros 510 Kgf Para Redes MT/BT puesto de entrega Yopal Casanare con certificación RETIE y RETILAP	1.00	und	$ 3,244,844.3800	$ 3,244,844.3800
2					
				Subtotal	$ 3,244,844.3800

II. EQUIPOS

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Herramienta menor (10% mano de obra)	1.00	glb	$ 10,535.5000	$ 10,535.5000
2	Grúa Hidráulica	0.5000	Mecánica	$ 153,000.0000	$ 76,500.0000
3					
				Subtotal	$ 87,035.5000

III. MANO DE OBRA

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Cuadrilla (1 Electricista + 3 ayudante)	1.00	Hora	$ 105,355.0000	$ 105,355.0000
2					
				Subtotal	$ 105,355.0000

IV.TRANSPORTE

N°	Descripción	Volumen ó	Distancia	m2 ó Ton/Km	Valor Unitario	Valor Total
1	Transporte de Materiales desde Casco Urbano Yopal (Ferretería/Bodega) hasta lugar de la obra	1.0000	9.14	Km	$ 803.2500	$ 7,341.7100
2	Transporte de Materiales Bogota - Yopal (Camion de dos ejes - sencillo)	1.0000	365.00	Km	$ 803.2500	$ 293,186.2500
					Subtotal	$ 300,527.9600
					Total Costo Directo	$ 3,737,762.8400
					A (18%)	$ 672,797.0000
					I (2%)	$ 74,755.0000
					U (5%)	$ 186,888.0000
					Valor total Analisis Unitario	$ 4,672,202.8400

JUSTIFICACIÓN CONTRATISTA

Los valores considerados en los APU corresponden a los precios unitarios establecidos y aprobados en el marco del Contrato N.° 019 de 2026, de acuerdo con las condiciones económicas contractualmente definidas

OBSERVACIÓN INTERVENTORIA

Los valores aprobados corresponden a los montos aplicables al contrato de obra No 019 de 2026 derivado del proceso de contratación LP-018 de 2026

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia

martes, junio 30, 2026

Firma
Nombre: JOSUE NEFTALI VALERO CAMARGO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma
Nombre: LUZ NEILA DIAZ MOGOLLÓN
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 20641705

Firma
Nombre: Esneider Rafael Torres Suarez
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: AT205-90991

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO OBRA

ASOSUPRO
Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003
FECHA DE INICIO:	9/6/2026	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE		
CONTRATISTA DE OBRA :	Energía Integral Andina S.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	019 de 2026		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	Proyectos Triple O S.A.S.		

ACTA:	ACTA DE INICIO DEL 09/06/2026 AL 08/03/2027
CAPITULO:	1.1.2 Realizar Alumbrado público
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN / UNIDAD
2.03	Cimentación para postes de alumbrado público solar / UND

I. MATERIALES

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Concreto 3000 Psi 210 kg/cm2 (Básico, 5% desperdicio)	0.4500	m3	$ 559,329.0900	$ 251,698.0900
2	Concreto 2500 Psi 175 kg/cm2 (Básico, 5% desperdicio)	0.0250	m3	$ 518,030.3300	$ 12,950.7600
				Subtotal	$ 264,648.8500

II. EQUIPOS

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Herramienta menor (10% mano de obra)	1.00	glb	$ 5,573.5000	$ 5,573.5000
2					
3					
				Subtotal	$ 5,573.5000

III. MANO DE OBRA

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Cuadrilla (1 Electricista + 2 ayudante)	0.5000	Hora	$ 111,469.1900	$ 55,734.6000
2					
				Subtotal	$ 55,734.6000

IV.TRANSPORTE

N°	Descripción	Volumen ó	Distancia	m2 ó Ton/Km	Valor Unitario	Valor Total
1						
2						
					Subtotal	$ -
					Total Costo Directo	$ 325,956.9500
					A (18%)	$ 58,672.0000
					I (2%)	$ 6,519.0000
					U (5%)	$ 16,298.0000
					Valor total Analisis Unitario	$ 407,445.9500

JUSTIFICACIÓN CONTRATISTA

Los valores considerados en los APU corresponden a los precios unitarios establecidos y aprobados en el marco del Contrato N.° 019 de 2026, de acuerdo con las condiciones económicas contractualmente definidas

OBSERVACIÓN INTERVENTORIA

Los valores aprobados corresponden a los montos aplicables al contrato de obra No 019 de 2026 derivado del proceso de contratación LP-018 de 2026

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia

martes, junio 30, 2026

Firma
Nombre: JOSUE NEFTALI VALERO CAMARGO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma
Nombre: LUZ NEILA DIAZ MOGOLLÓN
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 20641705

Firma
Nombre: Esneider Rafael Torres Suarez
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: AT205-90991

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO OBRA

ASOSUPRO
Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003
FECHA DE INICIO:	9/6/2026	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE		
CONTRATISTA DE OBRA :	Energía Integral Andina S.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	019 de 2026		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	Proyectos Triple O S.A.S.		

ACTA:	ACTA DE INICIO DEL 09/06/2026 AL 08/03/2027
CAPITULO:	1.1.2 Realizar Alumbrado público

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.04	**Suministró e instalación de SUNMASTER ELITE III PRO UNI-SL04-1-60 35W Incluye (Luminaria LED, Panel solar fotovoltaico y bateria, soporte para panel solar, controlador solar, gabinete, cable solar para conexiones, brazo metálico galvanizado y collarín anti vandalico)**	UND

I. MATERIALES

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	SUNMASTER ELITE III PRO UNI-SL04-1-60 35W (incluye soporte para panel solar, controlador solar, bateria, cable solar para conexiones)	1.00	und	$ 4,952,597.8000	$ 4,952,597.8000
2	Brazo metálico galvanizado 2,00 metros de soporte para instalacion de luminarias	1.00	und	$ 344,867.4100	$ 344,867.4100
3	Collarín anti vandalico	1.00	und	$ 171,764.6400	$ 171,764.6400
				Subtotal	$ 5,469,229.8500

II. EQUIPOS

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Herramienta menor (10% mano de obra)	1.00	glb	$ 5,573.5000	$ 5,573.5000
2	Grúa Hidráulica	0.5000	Mecánica	$ 153,000.0000	$ 76,500.0000
3					
				Subtotal	$ 82,073.5000

III. MANO DE OBRA

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Cuadrilla (1 Electricista + 2 ayudante)	0.5000	Hora	$ 111,469.1900	$ 55,734.6000
2					
				Subtotal	$ 55,734.6000

IV.TRANSPORTE

N°	Descripción	Volumen ó	Distancia	m2 ó Ton/Km	Valor Unitario	Valor Total
1	Transporte de Materiales desde Casco Urbano Yopal (Ferreteria/Bodega) hasta lugar de la obra	0.5000	9.14	Km	$ 803.2500	$ 3,670.8500
2	Transporte de Materiales Bogota - Yopal (Camion de dos ejes - sencillo)	0.5000	365.00	Km	$ 803.2500	$ 146,593.1300
					Subtotal	$ 150,263.9800
					Total Costo Directo	$ 5,757,301.9300
					A (18%)	$ 1,036,314.0000
					I (2%)	$ 115,146.0000
					U (5%)	$ 287,865.0000
					Valor total Analisis Unitario	$ 7,196,626.9300

JUSTIFICACIÓN CONTRATISTA

Los valores considerados en los APU corresponden a los precios unitarios establecidos y aprobados en el marco del Contrato N.° 019 de 2026, de acuerdo con las condiciones económicas contractualmente definidas

OBSERVACIÓN INTERVENTORIA

Los valores aprobados corresponden a los montos aplicables al contrato de obra No 019 de 2026 derivado del proceso de contratación LP-018 de 2026

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia

martes, junio 30, 2026

Firma
Nombre: JOSUE NEFTALI VALERO CAMARGO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma
Nombre: LUZ NEILA DIAZ MOGOLLÓN
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 20641705

Firma
Nombre: Esneider Rafael Torres Suarez
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: AT205-90991

PROYECTOS TRIPLE O S.A.S.
Nit. 901017241-1

Bogotá D.C., 14 de mayo de 2026

Señores
CONTRATISTAS ENERGÍA INTEGRAL ANDINA
Atn: Carlos A. Naranjo
Gerente de Proyectos
Ciudad

Asunto: Solicitud de fichas técnicas – APUS Pedrera.

Cordial saludo,

En atención al correo recibido, nos permitimos manifestar que los APUS correspondientes al proyecto PEDRERA fueron revisados y validados, encontrándose correctos conforme a lo presentado.

De igual manera, y conforme avance la ejecución del proyecto, podrá requerirse el suministro de las fichas técnicas de las luminarias, así como de los insumos y materiales asociados y/o relacionados dentro de los respectivos APUS, con el propósito de continuar fortaleciendo el proceso de revisión técnica y soporte documental correspondiente.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier inquietud o información adicional requerida.

Atentamente,

LUZ NEILA DIAZ MOGOLLON
CC. 1012320735 de Bogotá
Representante Legal
PROYECTOS TRIPLE O SAS
NIT 901017241-1

Carrera 54D # 135 - 34
Int. 2 Apto 403
Tel. 313 408 3199
Sfé de Bogotá



ENERGÍA INTEGRAL ANDINA.

www.eia.com.co

PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO PMT

PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE

CONTRATISTA
ENERGÍA INTEGRAL ANDINA

CATEGORIA 1

JULIO 2026

TABLA DE CONTENIDO

		Pág
1.	INTRODUCCIÓN.....	3
2.	OBJETIVOS.....	4
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	4
2.2	OBJETIVOS ESPECIFICOS.....	4
3.	PRINCIPIOSFUNDAMENTALES.....	5
4.	MARCO LEGAL.....	6
5.	ALCANCE.....	7
6.	GENERALIDADES DEL PROYECTO.....	8
7.	CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA.....	19
8.	MANEJO DE TRANSPORTE URBANO.....	24
9.	FUNDAMENTOS DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO.....	25
10.	CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS OBRAS A REALIZAR.....	43
11.	ESQUEMAS TIPICOS DE CIERRES PARCIALES CONTROLADOS.....	45
12.	PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO.....	46
13.	AUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO..	47
14.	SUPERVISIÓN AL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO.....	47
15.	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PLAN.....	48
16.	CONDICIONES FINALES.....	48
17.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	49

1. INTRODUCCIÓN

La EMPRESA ENERGÍA INTEGRAL ANDINA presenta a continuación el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) correspondiente a la ejecución del Contrato de Obra Pública No. 019 de 2026, cuyo objeto es la "IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE".

Este plan se establece de manera detallada las estrategias, alternativas operativas y actividades técnicas necesarias para prevenir, mitigar y controlar los impactos que las obras puedan generar sobre las condiciones habituales de movilidad y desplazamiento de los usuarios de las vías.

El PMT contempla medidas dirigidas a peatones, conductores, ciclistas y a la comunidad en general, con especial énfasis en la gestión segura del tránsito en las zonas intervenidas, la señalización adecuada, la regulación de flujos vehiculares y peatonales, y la implementación de acciones informativas y preventivas. Todo lo anterior con el propósito de garantizar, en todo momento, la seguridad vial, la integridad de los ciudadanos y la protección del personal vinculado a la ejecución del proyecto.

De esta manera, el plan busca asegurar que las intervenciones en el espacio público se desarrollen de forma ordenada, eficiente y segura, reduciendo al mínimo las afectaciones a la movilidad y promoviendo condiciones adecuadas de convivencia entre la obra y la dinámica cotidiana del municipio. El proyecto tiene como propósito fortalecer la infraestructura de iluminación en espacios destinados al deporte, la recreación y el uso adecuado del tiempo libre, mediante la instalación de nuevas luminarias, la modernización de tecnologías existentes y la ampliación de la cobertura del sistema. Esta intervención busca mejorar las condiciones de seguridad, accesibilidad y confort para la comunidad, promoviendo el uso activo de estos escenarios en horarios nocturnos y contribuyendo al desarrollo social y la calidad de vida de los habitantes del municipio.

El proyecto **"Implementación de Sistemas Solares Fotovoltaicos de Iluminación en la Vía La Pedrera del Municipio de Yopal, Casanare"** tiene como propósito mejorar las condiciones de seguridad, movilidad y calidad de vida de la comunidad mediante la instalación de un sistema de alumbrado público alimentado con energía solar fotovoltaica. Esta iniciativa busca aprovechar una fuente de energía renovable y limpia para reducir el consumo de electricidad convencional, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y garantizar un servicio de iluminación eficiente y sostenible en un corredor vial de alta importancia para el municipio. Además, el proyecto contribuirá al fortalecimiento de la infraestructura pública, promoverá el uso de tecnologías sostenibles y favorecerá el desarrollo social y económico de la zona, en concordancia con los objetivos de sostenibilidad y transición energética del país.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Dadas las características de las obras a realizar, donde las condiciones particulares de infraestructura vial requieren intervenciones mínimas pero de gran importancia, donde se permitan optimizar el uso de los recursos destinados a la "IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE", por ende se debe Mitigar el impacto generado por afectación del espacio público y en zonas aledañas, sin causar afectación a los demás usuarios de las vías, con el propósito de brindar un ambiente seguro, ordenado, ágil y cómodo, cumplimiento con la normatividad vigente. Además, construir una cultura de movilidad saludable, hábitos saludables y responsabilidad ciudadana.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Brindar a los usuarios de la vía una señalización clara, visible y de fácil comprensión, que les permita tomar decisiones oportunas, seguras y eficientes frente a las condiciones generadas por las actividades propias de la implementación de sistemas solares fotovoltaicos de iluminación en la Vía la Pedrera del Municipio de Yopal.

- ✓ Establecer y socializar protocolos de manejo vial claros y adecuados para los usuarios de las vías, acordes con la dinámica operativa de los diferentes tipos de vehículos que acceden a las zonas de obra, así como de peatones, ciclistas y demás actores viales que interactúan en el área de intervención, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente y de los criterios técnicos aplicables para esta actividad.

- ✓ Implementar una señalización vial con criterios de legibilidad, uniformidad y adecuada percepción por parte de los usuarios, que permita identificar oportunamente las condiciones de la vía y facilite una toma de decisiones segura y eficiente, con el fin de mejorar la movilidad, fortalecer la seguridad vial y contribuir a la reducción de la accidentalidad.

- ✓ Preservar o mejorar las condiciones de seguridad vial, transmitiendo la información de manera adecuada y oportuna a los usuarios las vías que transitan por las zonas de obra y su área de influencia.

- ✓ Evitar en lo posible la restricción, obstrucción o represamiento de flujos vehiculares y peatonales.

3. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Las estrategias para las actividades que se realizaran durante el desarrollo de las obras del proyecto que corresponde a la implementación de sistemas solares fotovoltaicos de iluminación en la vía la pedrera del municipio de Yopal, están representadas y apoyadas en los siguientes principios fundamentales:

- ✓ El PMT forma parte del proceso de cada una de las actividades constructivas de las obras que se realizarán, estas deberán preservar o mejorar las condiciones de seguridad vial, transmitiendo la información de manera adecuada y oportuna a los usuarios de las vías que circulan por las zonas de obra y su área de influencia.

- ✓ La seguridad de los usuarios en las zonas perimetrales de los sectores intervenidos, deben ser un elemento integral y de alta prioridad dentro de las actividades a realizar.

- ✓ Generar el menor impacto en las condiciones habituales de movilidad y seguridad vial evitando exponer a los usuarios vulnerables a situaciones que modifiquen sustancialmente sus rutinas de viaje.

- ✓ Los usuarios de las viales deben ser guiados de manera clara, precisa y ordenada, mediante dispositivos que ayuden a la regulación de tránsito como; auxiliares de tránsito, dispositivos de seguridad que ayuden a su restricción, lo anterior está determinado a las actividades o eventos que se realizaran.

- ✓ Se deben determinar algunos factores que permitan actuar sobre el entorno de las vías y las zonas que utilizaran para realizar las actividades de obras, se deben contemplar los tipos de riesgos, su exposición y todas las acciones que se deben priorizar para mitigar cualquier tipo de accidente o incidente.

- ✓ Con el propósito de asegurar niveles de operación aceptables, se deben realizar inspecciones rutinarias de los elementos de regulación del tránsito por personal idóneo.

- ✓ La utilización de dispositivos de señalización en la zona intervenida deberá garantizar, la seguridad de todos los usuarios de las vías.

- ✓ El responsable de las adecuaciones e instalación de la señalización de obra y su adecuado uso, deberá disponer, como mínimo, una zona y área de seguridad donde se ofrezca como mínimo la seguridad de los trabajadores y demás usuarios de las vías.

4. MARCO LEGAL

a. Código Nacional de Tránsito Terrestre, Ley 769 de 2002, modificado por las le yes 903 de 2004, 1005 de 2006, 1239 de 2008, 1281 de 2009, 1310 de 2009, 1383 de 2010 y 1397 de 2010, y aquellas posteriores que lo complementen, sustituyan, actualicen, modifiquen, o deroguen, el cual tiene como sustento constitucional el derecho fundamental que tiene todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, a circular libremente por el territorio nacional, conforme a lo establecido en el artículo 24 de la Constitución Política de Colombia y en el mandato constitucional, establecido en el numeral 25 del Artículo 150 de la Constitución Política de Colombia, según el cual corresponde al Congreso hacer las leyes mediante las cuales deberá cumplir, entre otras, la función de "unificar las normas sobre policía de tránsito en todo el territorio de la República

- Artículo 101. Normas para realizar trabajos en vía pública.
- Artículo 102. Manejo de escombros. Modificado Artículo 19 Ley 1383 de 2010.
- Artículo 114. De los permisos.
- Artículo 115. Reglamentación de las señales.
- Artículo 119. Jurisdicción y facultades.

b. Resolución 001235 de 2012 del Ministerio de Transporte por la cual se reglamenta el registro de la maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada y se dictan otras disposiciones.

c. Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia, vigente, o aquella que la complemente, sustituya o actualice, título XIV de urbanismo, Capítulo I: Comportamientos que afectan la integridad urbanística.

d. Artículo 135 del Código Nacional de Policía (corregido por el Artículo 10 del Decreto Nacional 555 de 2017): comportamientos contrarios a la integridad urbanística. Literal D) Incumplir cualquiera de las siguientes obligaciones: numerales 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24.

✓ MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL - DISPOSITIVOS UNIFORMES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD VIAL 2024. adoptado por el Ministerio de Transporte mediante la Resolución No. 20243040045005 del 17 de Septiembre de 2024.

e. Demás normas aplicables contenidas en los pliegos de condiciones.

5. ALCANCE

El proyecto comprende el **diseño, suministro, instalación y puesta en funcionamiento de sistemas solares fotovoltaicos destinados al alumbrado de la vía La Pedrera**, en el municipio de Yopal, Casanare, así como la implementación de la señalización vial requerida conforme a la normativa técnica vigente.

Las intervenciones están orientadas a mejorar las condiciones de visibilidad y seguridad para todos los usuarios de la vía, mediante la incorporación de infraestructura de iluminación autosostenible y elementos de señalización que faciliten la identificación oportuna de las condiciones del corredor vial, contribuyendo a la disminución de los factores de riesgo asociados a la circulación nocturna.

El alcance incluye las actividades de localización, instalación, pruebas, puesta en servicio y capacitación básica para la operación y mantenimiento de los sistemas implementados. No contempla la ampliación de la vía, la construcción de nuevas calzadas, la rehabilitación estructural del pavimento ni la modificación del diseño geométrico del corredor vial.

6. GENERALIDADES DEL PROYECTO


El Plan de Manejo de Tránsito, contiene todos los requerimientos establecidos en el capítulo IV del Manual de Señalización Vial, Dispositivos Uniformes para la regulación del Tránsito en Calles, Carreteras de Colombia, adoptado mediante resolución 20243040045005 del 17 de Septiembre de 2024, del Ministerio de Transporte.

El desarrollo de cualquier PMT variará en complejidad entre la aplicación de un esquema a una programación coordinada de trabajos y de desvíos, afectando a una zona mucha más amplia que la obra en sí. Para simplificar el proceso se distinguen 3 categorías y de acuerdo con estas serán requeridos mayores o menores niveles de estudio adicional.

A. METODOLOGIA PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO

Son aquellas en que los espacios de circulación son muy poco afectados por las intervenciones y no hay afectación sobre zonas aledañas. Hay poca o nula intervención en los espacios de circulación peatonal. El impacto de la obra sobre el tránsito de vehículos puede ser mitigado por la misma infraestructura a intervenir sin esperar que los flujos sean desviados. La señalización necesaria se puede lograr siguiendo uno o más de los esquemas incluidos al final de este capítulo, con ningún o pocos ajustes a estos.

De acuerdo al MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL - DISPOSITIVOS UNIFORMES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD VIAL 2024. adoptado por el Ministerio de Transporte mediante la Resolución No. 20243040045005 del 17 de Septiembre de 2024. Según el Capítulo 7, Señalización y medidas de seguridad para obras en la vía, numeral 7 .12.5 Clasificación y categorías de los planes de manejo de tránsito, y teniendo en cuenta las características del evento, este se realizará en la zona Rural del Municipio de Yopal.

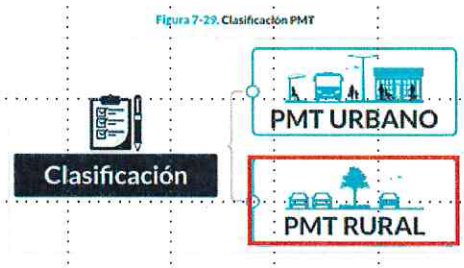

Fuente: Manual de Señalización 2024

De acuerdo a lo anterior, las características y actividades a realizar dentro del objeto del evento, y revisando la categoría del PMT la obra está determinada en la Categoría 1 – Obras de Interferencia Mínimas.

Figura 7-30. Categorías PMT



Fuente: Manual de señalización 2024

Para esta categoría, el área de influencia directa e indirecta es la misma debido al tipo de intervención, y requiere realizar un reconocimiento del área de obras con la identificación de todos los aspectos existentes.

Categoría I. Obras de bajo impacto

Intervenciones o interferencias en la vía o ciclo-infraestructura causadas por actividades, obras civiles, eventos y/o ubicación de materiales o elementos varios en la vía pública o privada abierta al público, en donde los espacios de circulación tanto peatonales como ciclistas y/o vehiculares tienen una mínima afectación. El impacto de la obra sobre el tránsito no requiere desviación de los flujos vehiculares a vías alternas, y el manejo de los flujos peatonales se puede realizar de manera segura en la misma infraestructura.

A continuación, se ilustra los lineamientos del proceso de fases y actividades sucesivas que se deben abordar para la formulación, aprobación, implementación, seguimiento y supervisión de un Plan de Manejo de tránsito, cabe aclara que el contenido esta referenciado como Categoría 1.

Es importante identificar aspectos donde se proyecta realizar la intervención con el fin de presentar una propuesta técnicamente viable, que propenda por el cumplimiento de los principios fundamentales y objetivos del PMT enunciados en el presente capítulo. involucrada, por el alcance geográfico y sus impactos, entre otros.

El área de influencia directa es aquella en donde se reflejarán los impactos directos de la actividad derivados del tipo de actividades a realizar, y puede determinarse tanto en la fase constructiva como en la operativa.

De acuerdo al contenido del documento técnico del Plan de Manejo de Tránsito, y a las características de l proyecto se debe contemplar la Tabla 7-14 del Manuel de señalización 2024, donde se describe los pasos a seguir de acuerdo a la Categoría del PMT, para el caso es de categoría 1, de bajo impacto.

Además, se debe buscar cumplir con el segundo principio fundamental: "la circulación vial debe ser restringida u obstruida lo menos posible". Por esto se debe siempre aplicar la respuesta básica que menos restringa u obstruya la circulación vial.

Figura 7-31. Metodología para la presentación de PMT



Fuente: Manual de señalización 2024

Así mismo, se debe garantizar que la propuesta de señalización de las zonas de obra y de su área de influencia conserven coherencia y consistencia con la jerarquía de la señalización y con la secuencia de implementación, acorde con la dimensión espacial y temporal del comportamiento esperado del tránsito, y por tanto, de las señales y dispositivos de regulación en el marco de los PMT, significando la importancia del mensaje de confianza que se da a los usuarios habituales (ante todo) sobre las condiciones de seguridad vial, y que a pesar de las obras, estos usuarios podrán convivir y transitar por la zona de obra y su área de influencia con total seguridad. Estas cualidades deben regir el PMT como instrumento de nivel operativo, y su materialización.

6.1. Datos del proyecto

En el presente numeral se relaciona la información general de las entidades, profesionales y responsables vinculados al desarrollo del proyecto de construcción, modernización y expansión del sistema de alumbrado público en parques urbanos del municipio de Yopal, departamento de Casanare, priorizados para la vigencia 2026.


Esta información permite identificar los actores institucionales y técnicos encargados de la ejecución, control, seguimiento y supervisión del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), facilitando los procesos de comunicación, coordinación y atención durante el desarrollo de las actividades.

ITEM	DETALLE
Contratante	**ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIOIOS PARA EL PROGRESO – "ASOSUPRO"** Cra 33 # 37 – 31 Villavicencio - Meta
Contratista	**ENERGÍA INTEGRAL ANDINA S.A** Nit 860.533.206-8 R/L Josué Neftali Valero Camargo c.c 3.797.710 Cartagena Carrera 19B # 166-73 Bogotá gerencia@eiasa.com 3004829442 / 3223978424 / 602668343
Interventoría	**PROYECTOS TRIPLE O S.A.S** **Juancip0315@hotamial.com; tripleosas@hotmail.com**
Supervisor	**Lina Melisa Rojas Valbuena**
Objeto Contractual	**IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE**
Modalidad del Proyecto	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 019 de 2026**
Valor del Contrato	**$5.369.899.707**
Fecha Acta de Inicio	**09 – Junio – 2026**
Plazo de Ejecución	**Nueve (9) Meses**
Ubicación del Proyecto	**MUNICIPIO DE YOPAL**

6.2. Localización general y área de influencia del proyecto

El proyecto de **implementación de sistemas solares fotovoltaicos de iluminación en la vía la pedrera del municipio de Yopal,** se desarrollará en la zona Rural del municipio de Yopal, departamento de Casanare.

Ilustración: Delimitación geográfica tramo inicio del PR0000+000 AL PR012+753.93

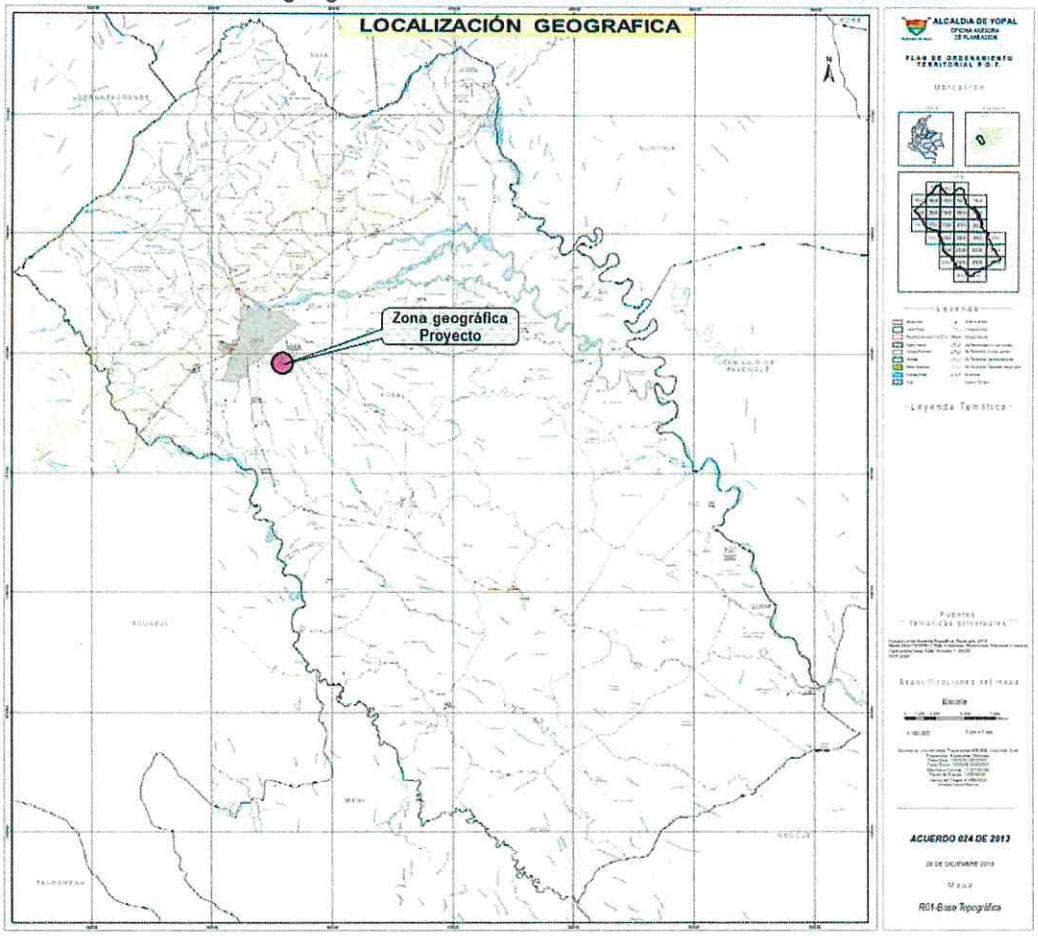

Fuente: Google Earth - Propia

Los tramos a intervenir

TRAMOS A INTERVENIR			
PUNTO INICIAL		PUNTO FINAL	
PR000+000		PR012+753.93	
Lat: 5.317450°	Long: -73.383000°	Lat: 5.309039°	Long: -73.387160°

Las áreas y zonas de influencia del proyecto comprendida en la vía la pedrera del Municipio de Yopal.

Ilustración: Area y Zona de Influencia del Proyecto




Fuente: Google Earth – Propia

6.3. Localización esquemática del área de intervención:

- **Municipio:** Yopal
- **Departamento:** Casanare
- **Zona:** Rural
- **Tipo de intervención:** Postes de iluminación
- **Áreas intervenidas:** Zonas vía Pedrera – Picon

De manera general, las zonas de intervención se encuentran distribuidas en diferentes sectores del casco urbano, en áreas de alta afluencia peatonal, lo que implica la implementación de medidas de manejo orientadas principalmente a la seguridad de peatones y usuarios del espacio público.

Imagen: Municipio de Yopal – Vereda Morichal: Picon – Pedregal - Arenosa

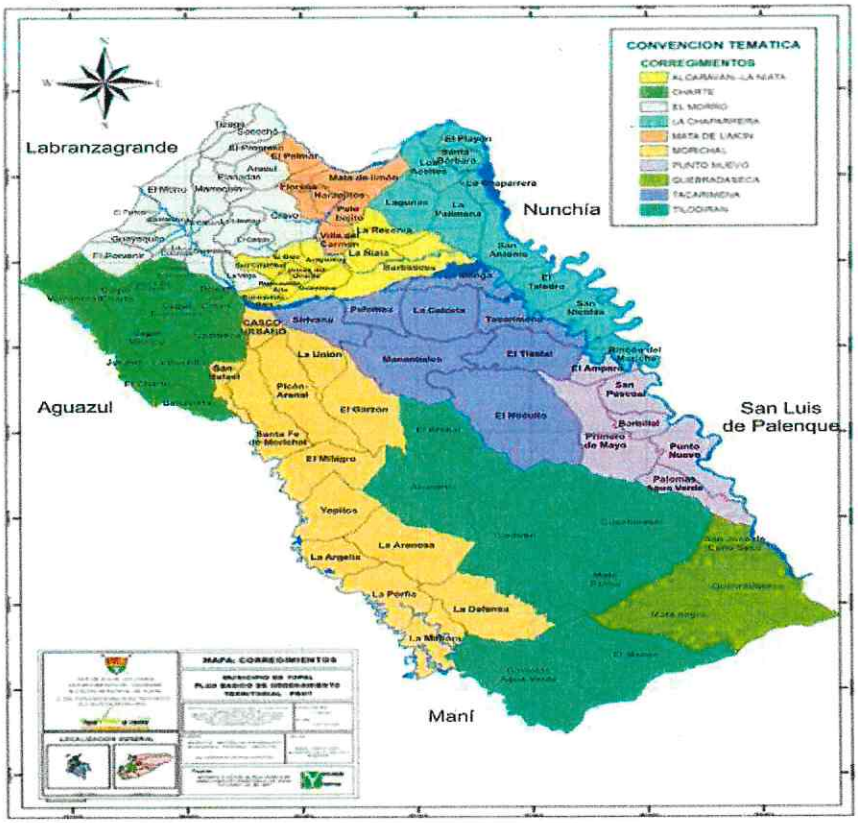


Fuente: Administración Municipal. "Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Yopal"

6.4. Malla Vial Rurales - Veredales

La red vial terciaria consiste en carreteras que conectan la ciudad de Yopal con corregimientos y veredas que no se encuentran cercanos a una red vial primaria ni secundaria. Acorde con el "Plan Vial Del Departamento De Casanare 2010-2019" las vías terciarias a cargo de Yopal solo se encuentran pavimentadas en un 4%, el resto de tramos viales se encuentra en red afirmada y sobre tierra en malas condiciones. Las vías terciarias que parten de Yopal son:


Yopal – Matepantano – Manantiales – El Venado – Punto Nuevo – Palomas – Aguaverde
Yopal – Sirivana – Palomas – Tacarimena – el Amparo – San pascual – BARBILLAL
Yopal – Palmarito – La Unión
Yopal – La Virgen
Yopal – San Rafael – Morichal
Yopal – Morichal – Tilodirán – Mata de Palma – Quebrada Seca
Yopal – Pedrera – Picón – Arenosa
Yopal – Yee del Garzón – Garzón – Alemania
Yopal – Matepantano – Manantial – El Venado
Yopal – Sirivana – Palomas – Yee Vereda La Calceta – Colegio el triunfo – Tacarimena -El Venado.

Ilustración: Vías del proyecto – Yopal – Pedrera - Picon

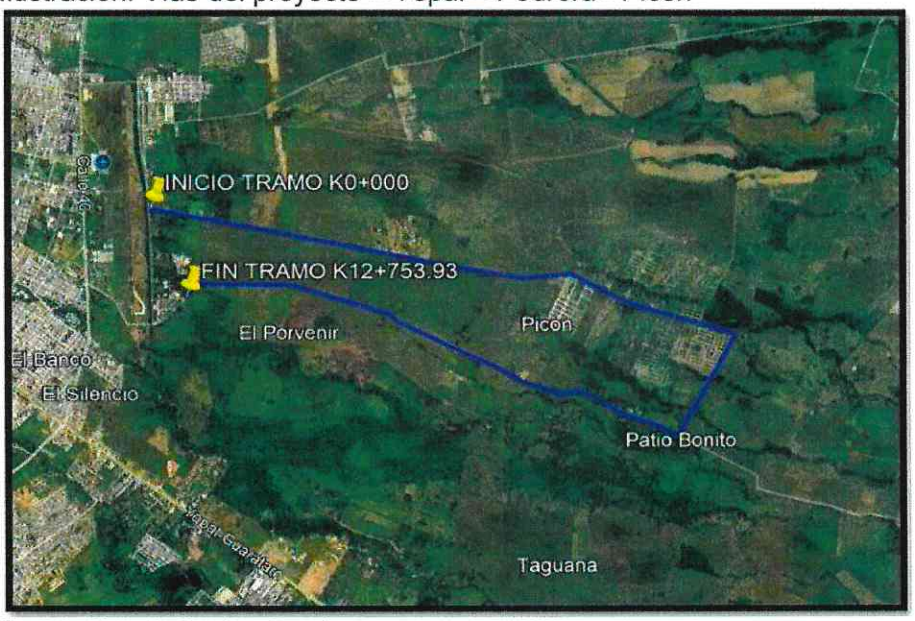

Fuente: Google Earth – Propia

Ilustración: Vías del proyecto – Yopal – Pedrera - Picon

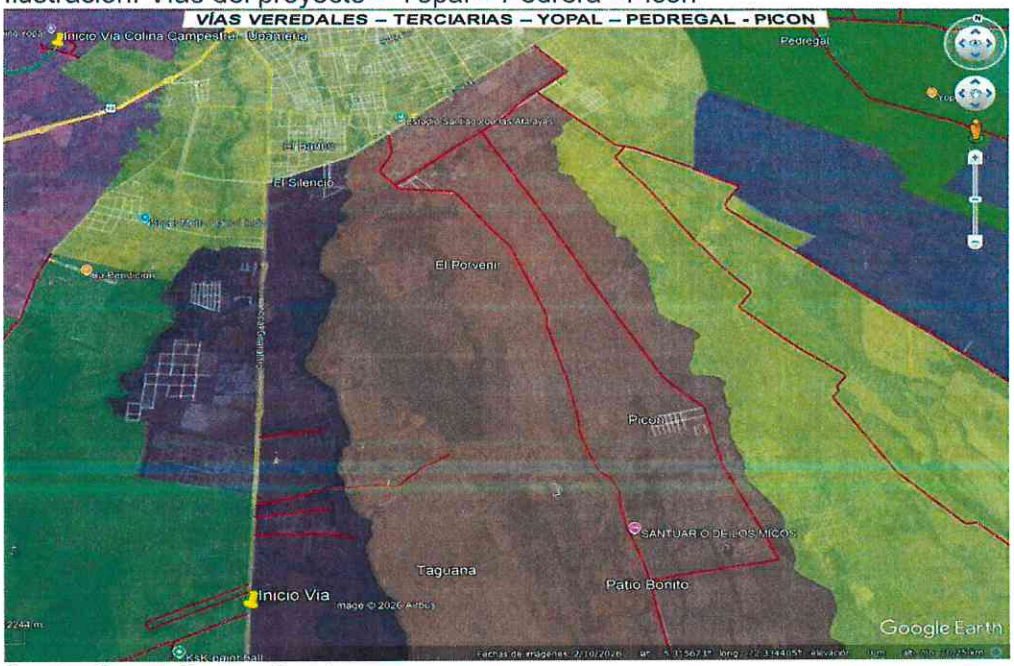

Fuente: Google Earth – Propia

6.4.1. Características del Sistema Vila Rural

Tabla: Características de las Vías del proyecto

Tipo	Nivel	Sección	
		Ancho total	Calzadas y carriles
1	Nacional y departamental		Dos calzadas con separador central, una calzada por sentido, con dos carriles de 3,65 metros de ancho mínimo y bermas en ambos costados de 1,80 metros de ancho.
2			Una calzada bidireccional con dos carriles de 3,65 metros de ancho mínimo y bermas en ambos costados de 1,80 metros de ancho
R1	Rural	Ancho mínimo: 8,30 metros – secundaria (pavimentada)	Una calzada bidireccional. Dos carriles; un carril por sentido de 3,65 metros de ancho, y berma en ambos costados de 0,5 metros de ancho
R2		Ancho mínimo: 7,00 metros – terciaria (en afirmado)	Una calzada bidireccional. Dos carriles; un carril por sentido de 3,00 metros de ancho, y berma en ambos costados de 0,5 metros de ancho
PR1	Acceso a predios rurales	Ancho mínimo: 5,00 metros	Una calzada bidireccional.

Fuente: Administración Municipal. "POT- Documento técnico de soporte. Tomo II Formulación". Yopal. 2013

6.4.2. Estado de la Red Vial Rural

Tabla: Características del Sistema Vial Rural

Tipología	Estado						Total (m)
	Bueno		Regular		Malo		
	Longitud (m)	%	Longitud (m)	%	Longitud (m)	%	
Adoquín	1.051,09	100,00	-	0,00	-	0,00	1.051,09
Asfalto	114.973,20	95,56	5.077,35	4,22	259,72	0,22	120.310,27
Concreto	58.520,84	89,62	6.780,91	10,38	-	0,00	65.301,74
Sin pavimentar	-	0,00	-	0,00	164.207,55	100,00	164.207,55
Total (m)	**174.545,12**	**49.74**	**11.858,26**	3.38	**164.467,27**	46.87	**350.870,65**

Fuente: Administración Municipal. "POT- Documento técnico de soporte. Tomo I Análisis territorial". Yopal. 2013

6.4.3. Recopilación de Información básica


Tabla: Información Básica

Variable	Unidad	Total
1. Extensión y clasificación según el tipo de territorio		
Extensión total	Kilómetros cuadrados	2.595
Área rural	Kilómetros cuadrados	2.583
Participación en total	%	99.5
Área urbana	Kilómetros cuadrados	11.91
Participación en total	%	0.5
2. Aspectos demográficos		
Población total	Habitantes	136.484
Población urbana	Habitantes	121.236
Participación en total	%	89
Población rural	Habitantes	15.248
Participación en total	%	11
Hombres	Habitantes	68.368
Participación en total	%	50.1
Mujeres	Habitantes	68.116
Participación en total	%	49.9
3. Longitud y estado de la malla vial urbana		
Longitud	Kilómetros	350.87
Bueno	Kilómetros	174.54
Participación en total	%	49.7
Regular	Kilómetros	11.86
Participación en total	%	3.4
Malo	Kilómetros	164.47
Participación en total	%	46.9
4. División administrativa del territorio		
Área urbana		
Comunas	Unidades territoriales	6
Barrios	Unidades territoriales	81
Área rural		
Corregimientos	Unidades territoriales	11
Veredas	Unidades territoriales	93

Fuente: Alcaldía Municipal de Yopal, DANE


6.5. Perfiles de Vía

Ilustración: Perfil Longitudinal de la Vía

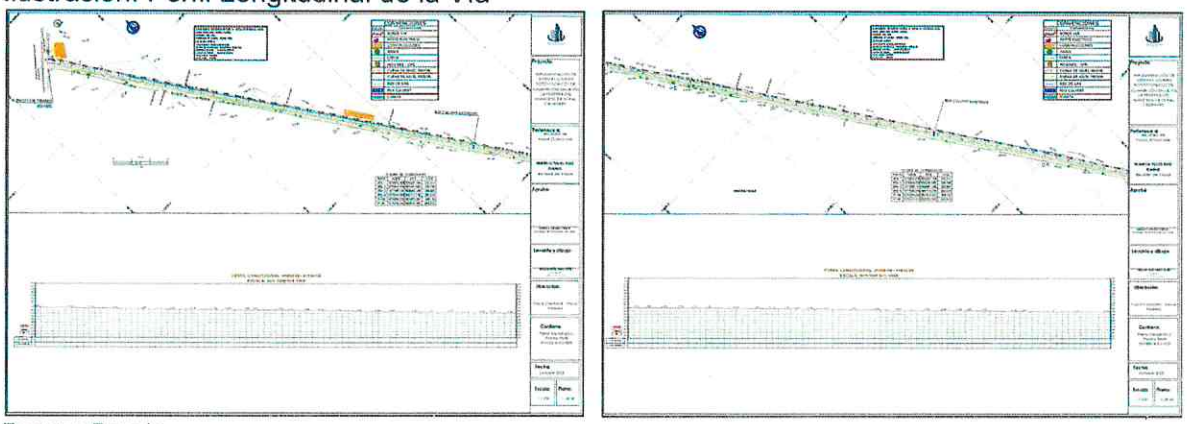

Fuente: Propia

Ilustración: Perfil Longitudinal de la Vía

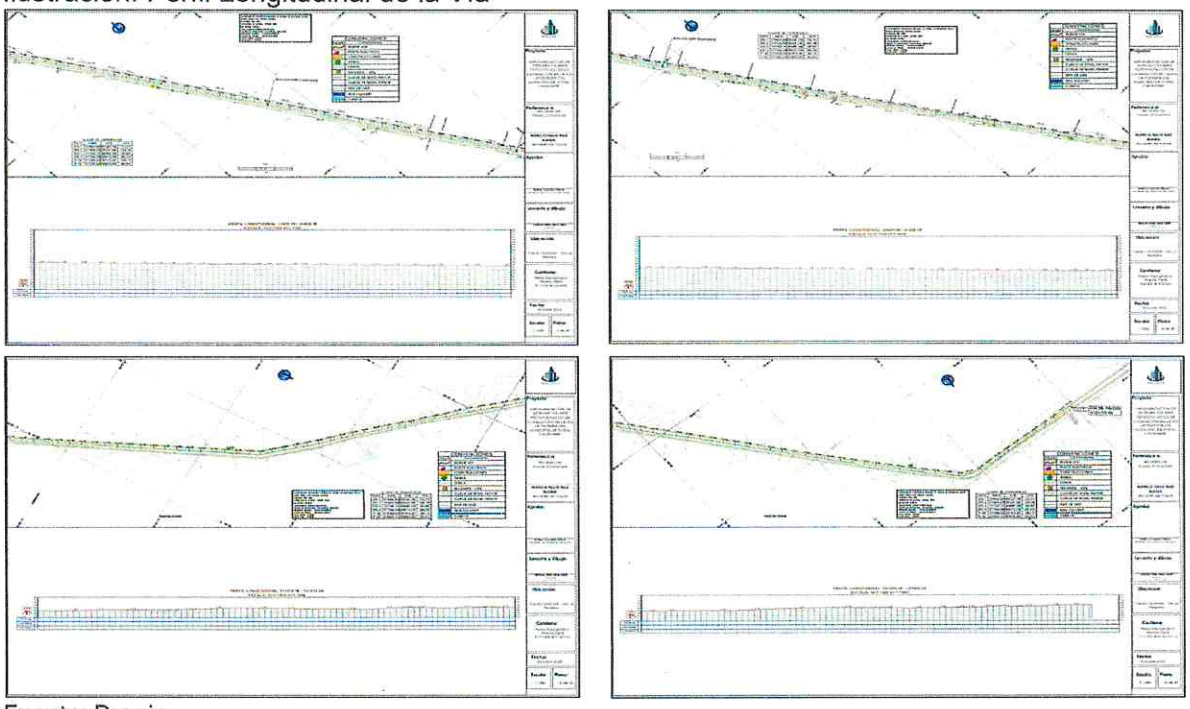

Fuente: Propia

7. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

Etapas de intervención del proceso constructivo

El proyecto de construcción, modernización y expansión del sistema de alumbrado público en parques urbanos del municipio de Yopal se desarrollará mediante intervenciones puntuales y progresivas, organizadas en las siguientes etapas constructivas:

a. **Localización y replanteo:** Corresponde a la identificación en campo de los puntos de intervención, trazado de ubicación de postes, luminarias, canalizaciones y demás elementos del sistema de alumbrado, conforme a los diseños aprobados.

b. **Señalización y alistamiento del área:** Instalación de señalización temporal y dispositivos de control definidos en el PMT, así como el cerramiento y delimitación de las zonas de trabajo para garantizar la seguridad de los usuarios y del personal de obra.

c. **Excavación y Obras civiles**: Ejecución de excavaciones para cimentación de postes, instalación de ductos, canalizaciones eléctricas y cajas de inspección, incluyendo la disposición adecuada del material excavado.


d. **Instalación de infraestructura eléctrica:** Montaje de postes, luminarias, redes eléctricas, tableros de control y demás componentes del sistema de alumbrado público.

e. **Conexión y pruebas:** Realización de conexiones eléctricas, verificación del sistema, pruebas de funcionamiento y ajustes necesarios para garantizar su correcta operación.

f. **Relleno, compactación y recuperación de áreas:** Restitución de las áreas intervenidas mediante relleno de excavaciones, compactación del terreno, reposición de andenes, senderos, zonas verdes o superficies afectadas.

g. **Retiro de señalización y limpieza final:** Desmonte de la señalización temporal, retiro de materiales, limpieza general del área intervenida y entrega del espacio en condiciones óptimas de seguridad y funcionamiento

Ilustración: Esquemas de Area Intervenida y perfiles de Características de obra

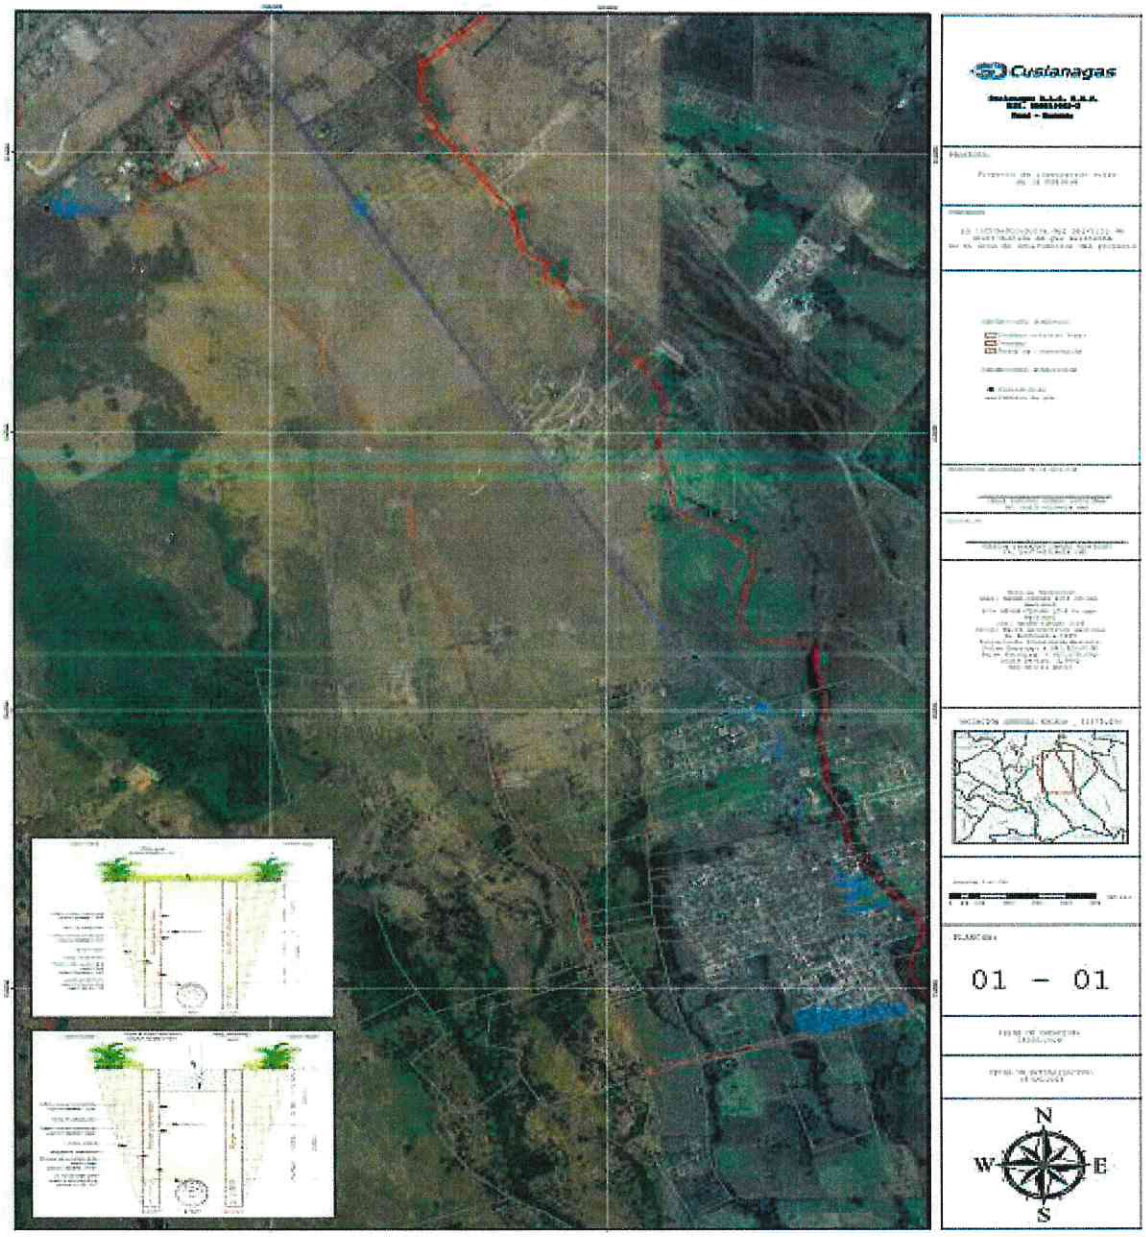

Fuente: Propia

7.1. Cronograma de obra

	"IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE"													
ÍTEM	ACTIVIDAD	INICIO	FIN	DURACIÓN (días)	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo
1	PRELIMINARES													
1,01	Replanteo de obra	9/6/2026	24/7/2026	46										
1,02	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas del sitio (incluye retiro disposición final)	1/8/2026	30/8/2026	30										
2	ALUMBRADO PÚBLICO													
2,01	Excavación manual en material común del sitio para cimentación de postes de alumbrado público solar (incluye retiro y disposición final)	1/9/2026	15/10/2026	45										
2,02	Suministro e instalación de poste en fibra de vidrio para alumbrado público (12mt 510kgf)	1/8/2026	30/1/2027	180										
2,03	Cimentación para postes de alumbrado público solar	15/9/2026	15/12/2026	91										
2,04	Suministro e instalación de luminarias solar ELITE III PRO IN-SL incluye (Luminaria LED, Panel solar fotovoltaico y bateria, soporte para conexiones, brazo metálico galvanizado y collarin anti vandalico)	1/8/2026	30/1/2027	180										
3	INTERVENTORIA	9/6/2026	8/3/2027	270										
4	RETILAP	1/02/2027	14/3/2027	44										
5	PMA	9/6/2026	8/2/2027	240										
6	APOYO A LA SUPERVISIÓN	9/6/2026	8/3/2027	270										

7.2. Fechas y Horario de trabajo

FECHA:
Inicio de las Obras: Por definir
Final de las Obras: Por definir

HORARIOS:
Inicio de Actividades: 07:00 Am
Final de Actividades: 17:00 Pm

7.3. Tipo de Superficie de Pavimento

Las vías donde se realizará el proyecto están determinadas por una superficie en asfalto y afirmado o destapado, su capa de rodadura de pavimento flexible (asfáltico) presenta un estado de conservación regular, el afirmado regular. La calzada cuenta con un ancho aproximado de 7 metros. En cuanto a la señalización, la demarcación horizontal se encuentra desgastada y poco legible, mientras que la señalización vertical la existente se conserva en regular estado.

7.4. Información y divulgación

Para la Implementación del sistema Solares Fotovoltaicos de iluminación en la Vereda La Pedrera del Municipio de Yopal, se implementará una estrategia integral de información, comunicación y divulgación, orientada a garantizar una interacción clara,

oportuna y transparente entre el equipo ejecutor de la obra, la comunidad y las diferentes entidades presentes en el área de influencia.

Esta estrategia contemplará el diseño y ejecución de acciones comunicativas que faciliten el acceso a la información relevante del proyecto, tales como su alcance, cronograma, beneficios, posibles impactos y medidas de manejo. Asimismo, promoverá espacios de participación ciudadana que permitan recoger inquietudes, sugerencias y observaciones de los actores involucrados, fomentando un diálogo bidireccional y constructivo.

De igual manera, se emplearán diversos canales y herramientas de difusión tanto presenciales como digitales con el fin de asegurar una cobertura amplia y efectiva, adaptada a las características socioculturales de la población. Con ello, se busca fortalecer la apropiación social del proyecto, generar confianza en su ejecución y contribuir al desarrollo ordenado y sostenible del municipio.

La información estará enfocada en las condiciones de ejecución de las actividades en los parques Dalel Barón, El Triunfo, Nueva Esperanza y Villa Nariño, así como en las medidas de manejo de tránsito, desvíos y acciones de prevención definidas en el Plan de Manejo de Tránsito (PMT).

Este proceso se desarrollará en dos etapas:

- **Antes del inicio de obra**

- **Durante la ejecución de las obras**

El proyecto tendrá una duración de nueve (9) meses.

La divulgación se realizará a través de los siguientes medios:

- **Socialización directa**

  - Jornadas informativas en campo en los sectores intervenidos
  - Comunicación directa con residentes y comerciantes
  - Registro mediante actas de seguimiento

- **Divulgación general**

  - Esta estrategia contribuirá a fortalecer la participación ciudadana, facilitar la comprensión de las intervenciones y promover una convivencia segura entre la

comunidad, los trabajadores y los usuarios de la vía durante la ejecución del proyecto.

- Uso de medios digitales

- **Socialización del PMT**

  - Previo a la puesta en marcha del PMT para la ejecución de actividades del proyecto, que requiera la modificación del flujo vehicular en las diferentes vías de influencia, se realizará la notificación a la autoridad competente para la debida autorización; Así mismo se realizará la socialización del PMT con los usuarios de las vías y comunidad en general, con el apoyo de SAYOP.

8. MANEJO DE TRANSPORTE URBANO

En el área de influencia del proyecto **"Implementación de Sistemas Solares Fotovoltaicos de Iluminación en la vía La Pedrera del municipio de Yopal, Casanare"** no se presta servicio de transporte público colectivo urbano, debido a que el corredor objeto de intervención corresponde a una zona rural conformada por vías secundarias y terciarias, donde la baja densidad poblacional y la dispersión de las viviendas no hacen viable la operación de este tipo de servicio.

En consecuencia, la movilidad de la población depende principalmente del uso de vehículos particulares, motocicletas, bicicletas y desplazamientos peatonales. Asimismo, por este corredor circulan vehículos destinados al transporte de productos agrícolas y pecuarios, así como transporte escolar y otros vehículos de servicio particular que garantizan la conectividad entre las veredas y el casco urbano del municipio de Yopal.

La ausencia de transporte público colectivo urbano hace que la población tenga una mayor dependencia de estos medios de transporte, especialmente durante las horas de la noche, cuando las condiciones de visibilidad disminuyen significativamente debido a la falta de alumbrado público. Esta situación incrementa el riesgo de accidentes de tránsito y afecta la seguridad de peatones y conductores, limitando además la movilidad nocturna y el acceso oportuno a servicios esenciales.

En este contexto, la implementación de sistemas solares fotovoltaicos para iluminación vial constituye una medida que contribuirá a mejorar las condiciones de seguridad y visibilidad del corredor, favoreciendo la movilidad de los usuarios, independientemente del modo de transporte utilizado, y fortaleciendo la conectividad de las comunidades rurales del sector.

9. FUNDAMENTOS DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

Para la elaboración del Plan de Manejo de Tránsito se han tenido en cuenta los lineamientos descritos en el capítulo 7 de la resolución 20243040045005 del 17 de Septiembre de 2024, del Ministerio de Transporte.

Para las obras a realizar dentro del proyecto, las adecuaciones menores deben cumplir las especificaciones de diseño del manual de Señalización del 2024, para evitar situaciones de riesgo y maniobras conflictivas y ante todo tener la señalización suficiente y necesaria para garantizar la seguridad de los todos los usuarios de las vías.

Las adecuaciones que se implementarán dentro de la zona de influencia, contara con una zona o área para protección de los trabajadores, con presencia de una distribución homogénea con dispositivos de señalización, elementos que estarán localizados estratégicamente dentro de los corredores donde le proyecto tiene influencia.

De acuerdo a las características propias del proyecto, se deben implementar dentro de los accesos de vías establecidos, una intervención de dispositivos de señalización o reguladores de tránsito de acuerdo a las condiciones de las vías, por consiguiente, se deberá programar, aprobar y localizar una señalización adecuada a las condiciones de diseños geométricos de las vías a utilizar para el ingreso y salida de vehículos pesados y livianos.

9.1. FUNCIÓN

Una de las principales funciones de los dispositivos para la regulación del tránsito, es la de indicar a los usuarios las precauciones que debe tener en cuenta, las limitaciones que gobiernan los tramos de circulación y las informaciones estrictamente necesarias, dadas las condiciones específicas de los tramos de vía donde se adelantan las obras.

La velocidad en las vías modernas, al mismo tiempo que el continuo crecimiento del volumen de vehículos que circulan por ellas, son factores que sumados al acelerado cambio en la forma de vida, crean situaciones conflictivas en determinados tramos de las vías, en las cuales es preciso prevenir, reglamentar e informar a los usuarios, por intermedio de las señales de tránsito, sobre la manera correcta de circular con el fin de aumentar la eficiencia, la seguridad y la comodidad de las vías, así como proporcionar una circulación más ágil. Éstas deben ser de fácil interpretación, suministrando a los conductores y peatones los mensajes claves, sin ambigüedades.

9.2. SEÑALES Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN VÍAS CON ZONAS DE OBRA

La habilitación de toda zona de obra en la vía pública o privada abierta al público debe considerar los siguientes tipos de señales y dispositivos de seguridad vial, en concordancia con la señalización existente; sin embargo, las condiciones previstas en las zonas de obra prevalecen sobre las condiciones habituales, así como la señalización debidamente determinada, e incorporada en el marco del PMT aprobado por la autoridad de tránsito competente.

Dichas señales y dispositivos deben conservar su funcionalidad, en jornadas diurnas y nocturnas, derivadas tanto de su condición inicial como del mantenimiento rutinario que se haga de ellas.

9.2.1. Señales Verticales en vías con zonas de obra

De acuerdo con la función que desempeñan, de conformidad con el contenido del Capítulo 2. Señales verticales, estos elementos mantienen su clasificación para las vías o espacios con zonas de obra, y a su codificación se agrega la letra "O" o "PO", al final de dicha codificación o abreviatura.

9.2.1.1. Señales Reglamentarias

Tienen por finalidad notificar y alertar a todos los usuarios, habituales y no habituales de las vías aledañas involucradas en las zonas de obra, las nuevas prioridades en el uso de las mismas, así como las prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones determinadas en el marco de los PMT, u otros instrumentos de regulación y gestión de la demanda.

9.2.1.2. Señales Preventivas

Su propósito es advertir a los usuarios de las vías o zonas urbanas o rurales sobre el cambio de condiciones de circulación, o la existencia y naturaleza de riesgos previsibles y/o situaciones imprevistas que puedan surgir en la vía o en sus zonas adyacentes.

9.2.1.3. Señales Informativas

Tienen como propósito guiar a todos los usuarios de las vías y de las zonas de obra a través de ellas, entregándoles la información necesaria con suficiente anticipación para que puedan circular por ella de la forma más segura, simple y directa posible

9.3. SEÑALES Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE OBRA

Cuando a lo largo de una zona o tramos de vía, es posible permitir la circulación de vehículos en un sentido o dos sentidos, en forma alternada, se debe asegurar que exista una coordinación que evite accidentes y demoras excesivas. Para este caso es importante considerar la utilización de personal con un control de PARE y SIGA

9.3.1. Señales de Canalización

La canalización de las zonas de obra en las vías, entre otras, cumple las funciones de:

- Guiar a los peatones, conductores de vehículos y demás usuarios habituales y no habituales, en forma segura y clara, a través de dicha zona.
- Advertir sobre medidas de mitigación de riesgos previstos y emergentes en las zonas de obra y su área de influencia.
- Proteger a los trabajadores que laboran dentro del área de obra, así como a visitantes y proveedores, de posibles riesgos surgidos por flujos vehiculares

Estas canalizaciones se materializan a través de los elementos presentados en esta sección, los que además de cumplir con los estándares mínimos aquí especificados deben ser de forma, dimensiones y colores uniformes a lo largo de todas las zonas de obra.

El diseño de la canalización debe proveer una transición gradual y suave, ya sea para desplazar el tránsito de un carril hacia otro, para conducirlo a través de un desvío o para reducir el ancho de la vía.

Su propósito es delimitar las áreas habilitadas para la circulación segura de los diferentes tipos de usuarios, así como guiar a los conductores y peatones a través de las zonas de trabajo y segregar las áreas destinadas a la obra propiamente.

También permiten definir las variaciones en la sección transversal de las vías, garantizando un nivel de seguridad adecuado, tanto a los usuarios de la vía como al personal que trabaja en dichas zonas.

9.3.1.1. Manejo del Tránsito en vías o espacios con zonas de obra

Su propósito es regular el paso de vehículos, peatones y demás usuarios en las vías o espacios peatonales con zonas de obra y en aquellos puntos o tramos donde dos o más flujos deben compartir las vías.

9.3.1.2. Elementos para aumentar la visibilidad de trabajadores y vehículos

Se utilizan para asegurar que los trabajadores y vehículos propios de la obra sean visibles y reconocibles apropiadamente con la suficiente antelación por todos los conductores y usuarios tanto de día como de noche, y en condiciones climáticas adversas.

Estos elementos deben cumplir con los requerimientos de retrorreflectividad de los materiales y funcionalidad de los dispositivos, de manera que brinden condiciones seguras a quien los usa.

9.4. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE SEÑALES Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN VÍAS CON ZONAS DE OBRA

9.4.1. MENSAJE

Toda señal, dispositivo o elemento utilizado en las vías con zonas de obra debe transmitir un mensaje inequívoco al usuario de la vía, lo que se logra a través de símbolos y/o leyendas. Estas últimas se componen de palabras y/o números.

Dado que los símbolos se entienden más rápidamente que las leyendas, se recomienda dar prioridad al uso de ellos, los cuales deben corresponder solo a los especificados en este Manual. Si el mensaje está compuesto por un símbolo y una leyenda, ambos deben ser concordantes y coherentes entre sí.

Cuando se utilizan leyendas, éstas se deben construir con las letras, números y especificaciones contenidas en el Capítulo 2. Señales verticales del presente Manual, especialmente en el numeral referente a señales informativas, y en el Capítulo 3, en el caso de demarcaciones. Esta normalización optimiza la legibilidad de las señales.

9.4.2. FORMA, COLOR Y DIMENSIONES

La forma, color y dimensiones mínimas que caracterizan a cada señal facilitan que sean reconocidas y comprendidas por todos los usuarios de la vía. En las siguientes secciones se detallan estas características para cada tipo de señal y dispositivo usado o requerido en vías con zonas de obra.

En particular, el color de fondo anaranjado de las señales preventivas, informativas y elementos de canalización utilizados en zonas de obra indican a los usuarios que su carácter es transitorio.

Los colores de las señales y elementos de canalización deben corresponder a los especificados en las Tablas 2-3. Coordenadas cromáticas (de día) NTC 4739 y 2-4. Coordenadas cromáticas (de noche) NTC 4739, del Capítulo 2. Señales verticales.

9.4.3. RETRORREFLEXIÓN

Las señales y dispositivos de seguridad deben ser visibles en cualquier período del día y bajo toda condición climática. Por ello, se elaboran con materiales apropiados y se someten a procedimientos que aseguren su retrorreflexión en toda su superficie expuesta al tránsito

9.4.4. UBICACIÓN DE SEÑALES Y DISPOSITIVOS

Dadas las características de las obras en particular, estos dispositivos deben estar ubicados apropiadamente y deben ser advertidas a los usuarios con una anticipación tal que les permita reaccionar y maniobrar en forma segura, de tal manera que sean claramente perceptibles para los usuarios de la vía.

9.4.5. SISTEMA DE SOPORTE

El sistema de soporte de las señales y elementos de canalización en zonas de obras debe asegurar que estos se mantengan en la posición correcta ante cargas de viento y que, si inadvertidamente son impactados por un vehículo, no representen un peligro grave para este, para los peatones o para los trabajadores de la obra

Dentro de la Señalización y Dispositivos de Seguridad para obras en la vía, las canalizaciones y señales de obra se pueden materializar a través de diversos elementos, estos dependen también por el tipo de evento o actividad. Para nuestro interés se distinguen las siguientes:

- Conos
- Delineadores Tubulares Compuestos

- Barreras Plásticas (Maletines)
- Auxiliares de Tránsito
- Aviso de Obra (Auxiliares de Tránsito)
- Señal Reglamentaria de Obras - Velocidad Máxima permitida 30 Km/h
- Aviso de Obra, Maquinaría en la Vía

9.5. DISPOSITIVOS DE CANALIZACIÓN

9.5.1. CONOS

Los conos se emplean cuando se requiera delinear carriles temporales de circulación, generalmente dados por la desviación temporal del tránsito por una vía, variación del trazado, ancho y número de carriles o la delimitación de carriles de tránsito que entren a una zona de reglamentación especial durante la instalación de señalización horizontal.

Su altura mínima es de 0,7 m. Sin embargo, esta debe aumentarse en vías con altos volúmenes de tránsito, o en vías donde frecuentemente transiten vehículos pesados (buses y/o camiones) o las velocidades máximas permitidas sean superiores a 60 km/h, como se detalla en la Tabla 7-6.

Tabla 7-6. Altura mínima de conos

Velocidad Máxima Permitida (km/h)	Altura mínima de conos (cm)
≤ a 60	70
> a 60	90

Fuente: Manual de señalziación 2024

La base de los conos debe ser de tamaño, forma y masa suficiente para mantenerlos estables frente a corrientes de aire provocadas por vehículos. La base debe ser de forma poligonal que garantice que, en el caso de caída del cono sobre la superficie de rodadura de la vía, este no ruede fácilmente sobre su base.

Los conos tienen forma de cono truncado, son de color naranja y deben contar con bandas retrorreflectantes blancas en material flexible tipo III o de características de retrorreflexión superior de al menos 10 cm de alto cada una, ubicadas en su parte superior según se muestra en la Figura 7-8. Los de 0,7 m tendrán dos bandas retrorreflectivas y los de mayor altura tendrán tres bandas.

9.6.1. AVISOS DE OBRAS MOVILES (TRIPODE)

Características Básicas

Por las características de la obra y por su duración de la misma, se hace necesario que estas señales sean móviles o fijas, esto lo define el ingeniero a cargo del proyecto, que deberán ser localizadas en sitios estratégicos conforme al manual de señalización 2024 Ministerio de Transporte.

Una de las funciones de estas señales, es reglamentar o advertir sobre peligros o informar acerca de direcciones y destinos. Son esenciales en lugares donde existen regulaciones especiales y en sitios donde los peligros no son de por sí evidentes.

Las señales de obra portátiles, son empleadas cuando se desarrollan obras en la vía deben cumplir con todos los requisitos que se describen en el Capítulo 2 Manuel de señalización 2024, en la sección Generalidades de las Señales Verticales.

Sus características se establecen en:

Forma y Color:

Las señales verticales de tránsito de obra que se emplean en zonas de construcción, rehabilitación, mantenimiento, están incluidas y contempladas en los mismos grupos que el resto de las señales de tránsito.

Los colores de estas señales deben corresponder a las especificaciones del manual de señalización 2024 y NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS DE SEÑALIZACIÓN, NTCs).


Materiales:

Además de lo estipulado en el Capítulo 2, el material de los tableros puede ser en material flexible de policarbonato y/o pvc termoformado, o material sintético; para estos materiales flexibles se debe garantizar la suficiente tensión en los extremos evitando siempre el pandeo y alabeo del tablero.

Dimensiones:

El tamaño de las señales verticales es función de la velocidad máxima permitida en la zona de obras, ya que esta determina las distancias a la que la señal debe ser vista y leída. Por

Figura 7-8. Conos

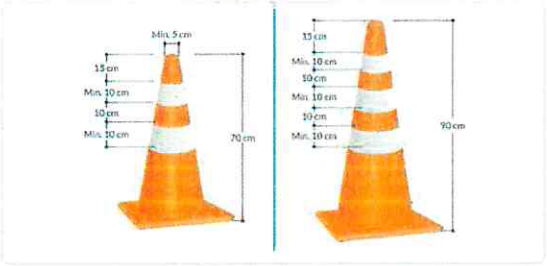

Fuente: Manual de señalización 2024, Ministerio de transporte

9.5.2. DELINEADORES TUBULARES COMPUESTOS


Estos delineadores se utilizan tanto para definir transiciones por angostamiento como para delinear el borde de la calzada, para hacer cerramientos en obras y para el control de peatones. Tienen como mínimo tres franjas de material retrorreflectivo flexible tipo III o de características de retrorreflexión superior, separadas 0,15 m o más; deben contar con un mínimo de dos (2) orificios o pasadores que permitan canalizar cintas plásticas demarcadoras de un mínimo de 0,075 m de ancho y de color predominante amarillo o naranja, que se extiendan a lo largo de la zona señalizada. En la parte inferior deberán anclarse a una base cuya forma garantice la estabilidad del delineador.

Para garantizar la estabilidad y funcionamiento de los delineadores tubulares compuestos, se recomienda una separación máxima entre los tubos de 3 m, debiendo lastrarse sus bases con arena o agua.

Para garantizar la estabilidad y funcionamiento de los delineadores tubulares compuestos, se recomienda una separación máxima entre los tubos de 3 m, debiendo lastrarse sus bases con arena o agua.

Los delineadores tubulares tienen menor área visible que otros dispositivos, por lo que se recomienda utilizarlos en sectores en donde las restricciones de espacio no permitan la colocación de otros dispositivos más visibles.

Figura 7-10. Ejemplo delineador compuesto

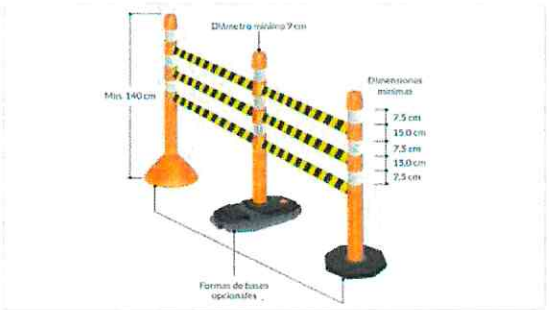

Fuente: Manual de señalización 2024, Ministerio de transporte

9.5.3. BARRERAS PLASTICAS (MALETINES)

Los conos se emplean cuando se requiera delinear carriles temporales de circulación, generalmente dados por la desviación temporal del tránsito por una vía, variación del trazado, ancho y número de carriles o la delimitación de carriles de tránsito que entren a una zona de reglamentación especial o durante la instalación de señalización horizontal.


Estas barreras sirven como elementos de canalización de tránsito en los casos en que sean necesarios definir una variación en el perfil transversal disponible para el tránsito de vehículos.

Para indicar el alineamiento en tramos rectos y curvos

Para aislar excavaciones desde 0.5 m de profundidad

Estos dispositivos deben cumplir con lo referente a ensayos físicos establecidos por la norma NTC 6107-1 vigente, o aquella norma que la complemente, sustituya o actualice

Figura 7-15. Barreras plásticas (maletines)

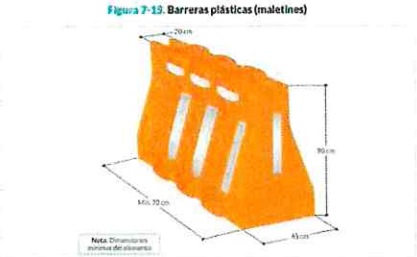

Fuente: Manual de señalización 2024, Ministerio de transporte

9.5.4. CINTA DE SEÑALIZACIÓN:

Son un elemento fundamental a la hora de delimitar zonas de peligro o paso, ya que gracias a sus llamativos colores permiten a los usuarios identificar riesgos, previniendo accidentes.

Figura 7-12. Color de cinta



Fuente: Manual de señalización 2024

9.5.5. AUXILIARES DE TRANSITO:

Son los responsables de la seguridad de todos los usuarios de la vía, persona que controla y regula el tránsito vehicular, estos se localizan estratégicamente para vigilar y orientar a los diferentes usuarios de las vías. Estos deben ser visibles a una distancia mínima segura para todos los usuarios de la vía. Deben ubicarse frente al tránsito que se acerca al área de actividad.

El contratista deberá disponer de personal de apoyo o técnicos viales en la puerta principal del ingreso y salida de vehículos del terminal, es importante la presencia de estos auxiliares de tránsito en la entrada del terminal (acceso entrada), ya que estos tienen como objetivo la organización del ingreso y salida de los vehículos del terminal, ya sea vehículos de carga, tipo volquetas, vehículos de transporte de pasajeros y visitantes.




Fuente: Manual de señalización 2024

9.5.6. CONTROL PARE / SIGA:

En este sistema de control de tránsito, personal de la obra, trabajadores comúnmente llamados Auxiliares de Tránsito, otorgan el derecho de paso alternado, utilizando la Paleta portátil PARE / SIGA.

a. Señal SRO-04 PARE/SIGA

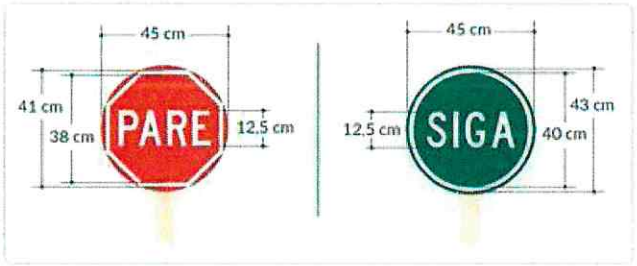

Fuente: Manual de señalización 2024

9.6. SEÑALES DE OBRA

La señalización que se implementara en obra debe cumplir con las especificaciones establecidas en el Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte (2024) en el cual se resalta que los elementos de señalización a utilizar por obras, tales como señales preventivas, señales reglamentarias, señales informativas, barreras, conos, canecas, cinta reflectiva y demás elementos de señalización deberán cumplir con las especificaciones establecidas en dicho manual.

El contratista deberá utilizar elementos que permitan delimitar claramente el área de trabajo, delimitar las áreas de circulación vehicular, prevenir el ingreso o circulación de vehículos y personas ajenas a la obra, proteger a los trabajadores de posibles accidentes con vehículos.

En caso de requerir la ejecución de trabajos nocturnos o en condiciones de baja visibilidad los elementos de señalización deberán cumplir con las Especificaciones Generales de Construcción del Instituto Nacional de Vías vigente, y con el Manual de Señalización Vial, en cuanto a:

- Reflectividad de todas las señales de tránsito
- Reflectividad de todos los elementos de direccionamiento (tales como, barricadas, canecas, barreras plásticas, entre otros.)

ello, las dimensiones mínimas de cada señal reglamentaria y de prevención de peligro, se han definido según los siguientes cuatro tramos de velocidades máximas permitidas:

- **Menor o igual a 50 km/h**
- *60 ó 70 km/h*
- 80 ó 90 km/h
- Mayor a 90 km/h

Retroreflexión:

Los materiales retrorreflectivos de los tableros de las señales verticales reglamentarias, preventivas e informativas utilizadas en zonas de obras deben cumplir siempre con los niveles mínimos de retrorreflexión que se entregan en el Capítulo 2 del Manual de señalización 2024 Ministerio de Transporte.

Ubicación:

Para que las señales puedan ser percibidas por los conductores es preciso que éstas se ubiquen dentro de su cono de atención, esto es, dentro de 10° respecto de su eje visual, evitando instalarlas muy alejadas de la calzada, demasiado elevadas o muy bajo respecto del nivel de esta. Ver Figura 4-4.

Altura:


La altura de la señal debe asegurar su visibilidad. Por ello la elevación correcta queda definida, en primer lugar, por los factores que podrían afectar dicha visibilidad, como altura de vehículos en circulación, alto de la vegetación existente o la presencia de cualquier otro obstáculo. En segundo lugar, debe considerarse la geometría horizontal y vertical de la vía.

Cuando se trate de señales ubicadas sobre soportes portátiles, la altura mínima de la señal medida desde la superficie de rodadura hasta el borde inferior de la señal, debe ser de 1,5 metros y la altura máxima medida desde el borde de la superficie de rodadura hasta el borde inferior de la señal debe ser de 2,2 metros



Señales Portátiles

Figura 2-10. Esquema de soporte móvil

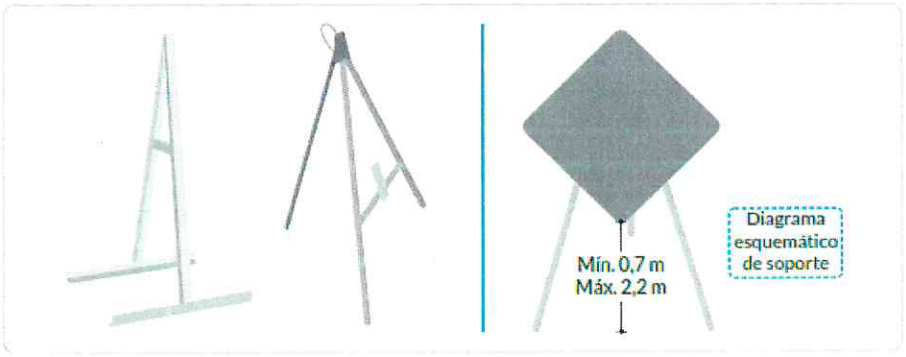

Fuente: Manual de señalización 2024

9.6.2. AVISO DE OBRA - INICIO DE OBRA Y FIN DE OBRA

Esta señal informa del inicio de los trabajos en la vía o zona adyacente a ella, con el mensaje "INICIO DE OBRA". Igualmente, se instalará otra señal con las mismas características, pero indicando el sitio de finalización de la obra, con la leyenda "FIN DE OBRA".

Figura 7-7. Señales informativas de obra

Señales informativas transitorias que guían al usuario a través de un desvío



Fuente: Manual de Señalización 2024

9.6.3. AVISO DE OBRA, SEÑALES AUXILIARES DE TRÁNSITO – SPO-03

Esta señal se utiliza para advertir que más adelante el tránsito por la zona de obras es controlado por un auxiliar de tránsito que utilizará señales manuales tipo "banderero". Por motivos de seguridad de este trabajador, la velocidad máxima permitida en el sector que se ubica el auxiliar de tránsito no debe superar los 50 km/h. En zonas de obras con velocidades máximas superiores, deben adoptarse medidas para disminuir la velocidad gradualmente, hasta 50 km/h, por lo menos 200 m antes en vías rurales y 100 m en urbanas.

Esta señal deber ser de color naranja fluorescente. La señal debe ubicarse por lo menos 350 m antes del punto de control en vías rurales y 120 m en urbanas, recomendándose que sea reiterada antes del punto donde el auxiliar de tránsito (banderero) se ubique.

Figura 7-5. Señales preventivas propias de obra y señales de obra *(continuación)*



Fuente: Manual de señalización 2024, Ministerio de transporte.

9.6.4. TRABAJOS EN LA VÍA – SPO-01

Esta señal es de obligatoria instalación y se utiliza para advertir a los conductores que las condiciones de tránsito se modifican más adelante por la realización de obras en la vía.

Se debe ubicar antes del área de transición o canalización, a una distancia que depende de la velocidad máxima permitida antes de la zona de trabajo, y de aquella autorizada en la zona misma y otras variables, como tiempo de reacción.

Tabla 7-1b. Distancias mínimas recomendadas para SPO-01

Velocidad Máxima Permitida antes de zonas de obra (km/h)	Distancia (D) mínima entre señal TRABAJOS EN LA VÍA (SPO-01) e inicio área de transición o canalización (m)	
	Vías rurales	Vías urbanas
≤ a 40	100	30
50	150	60
60	200	-
70	270	-
80	350	-
90	400	-
100	500	-
110	550	-
112	650	-

Fuente: Manual de señalización 2024, Ministerio de transporte

Figura 7-5. Señales preventivas propias de obra y señales de obra *(continuación)*



Fuente: Manual de señalización 2024, Ministerio de transporte

9.6.5. ANGOSTAMIENTO A LA DERECHA – SPO-05

Esta señal debe ser usada para advertir un estrechamiento al costado derecho de la calzada. Cuando dicho estrechamiento implique la eliminación de uno o más carriles, puede utilizarse

la leyenda "A XXX CARRIL (ES)" que indica el número de carriles disponibles más adelante en la vía.

Figura 7-5. Señales preventivas propias de obra y señales de obra *(continuación)*



9.6.6. SENDEROS PEATONALES – SIO-24

Si es necesario establecer senderos peatonales se instalarán según las necesidades del proyecto, es decir según las necesidades específicas de la intervención en el corredor peatonal.
Para la implementación de senderos peatonales se ha tomado en cuenta:

- Diseñar la ruta según el área a intervenir
- Definir necesidades de señalización tales como: Balizas, Cinta, tela para cerramiento, señales verticales, etc.



Fuente: Manual de señalización 2024, Ministerio de transporte

9.7. SEÑAL REGLAMENTARIA PARA OBRAS

9.7.1. VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA 30 KM/H

Esta señal se utiliza para indicar la velocidad máxima a la que pueden circular los vehículos a partir del lugar donde esté instalada.



Fuente: Manual de señalización 2024, Ministerio de transporte

9.7.2. SRO – 02 DESVÍO:

Esta señal debe utilizarse para notificar a los conductores la dirección a seguir por el cierre de un tramo vial o franja de la sección transversal. La señal deberá ubicarse en la parte frontal de las barricadas o elementos de regulación (barreras plásticas) y la flecha debe indicar el sentido del desvío. Esta señal podrá acompañarse de señales informativas SIO-07.



Fuente: Manual de señalización 2024, Ministerio de transporte

Ilustración - Dispositivos para la canalización del tránsito más frecuentes

Señales Informativas




Señales Reglamentarias



Dispositivos para la Canalización del Tránsito



Señales Preventivas

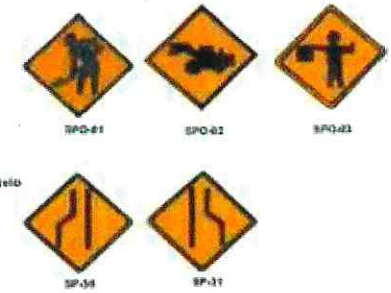


10. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS OBRAS A REALIZAR

- **Tipo de interferencia:** Teniendo en cuenta que las áreas de influencia que van a ser sobre perímetros de las vías veredales de Yopal – La Pedrera – Picon – La arenosa, las afectaciones son menores, sus ocupaciones son menor y de baja afectación de tráfico, se considera que el tipo de obra a realizarse es de interferencia baja.

- **Uso del suelo Rural**: De acuerdo al Plan Básico De Ordenamiento Territorial, el uso del suelo para las zonas a intervenir es, Rural – Veredal.

Ilustración: Suelo Rural y Subrural de Yopal

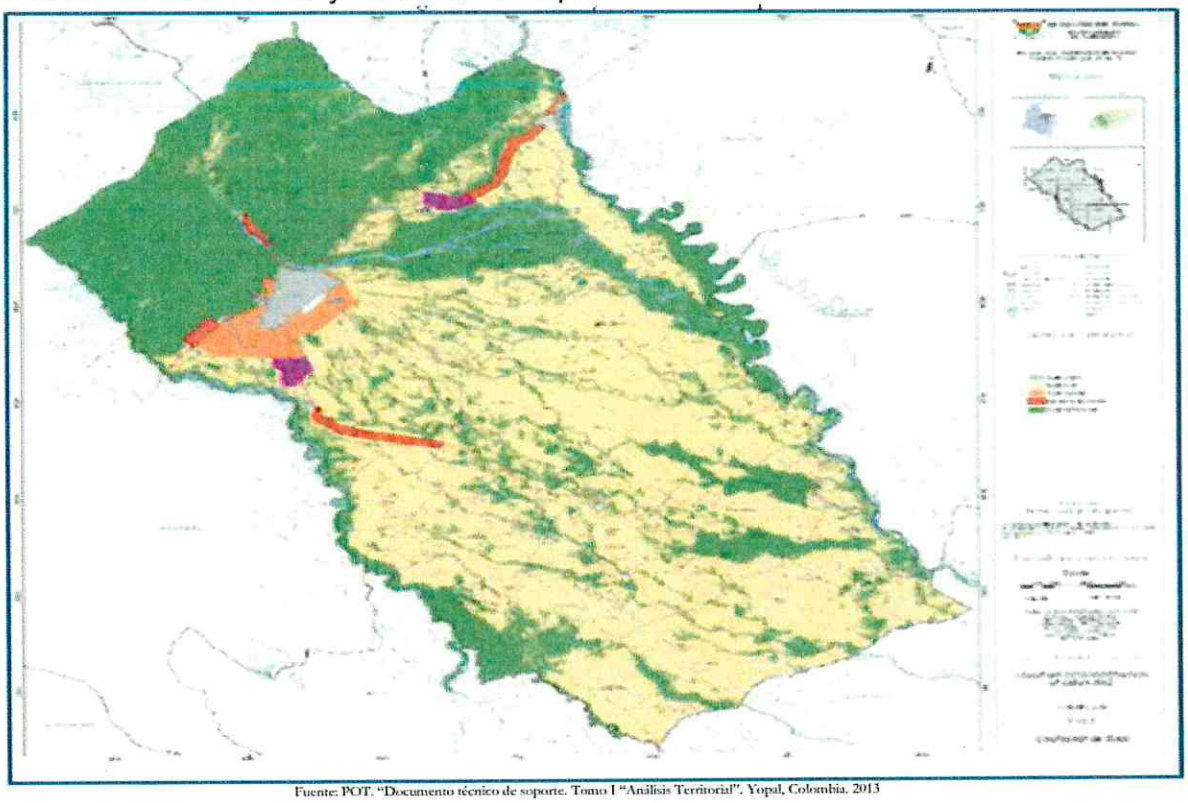

Fuente: POT. "Documento técnico de soporte. Tomo I "Análisis Territorial". Yopal, Colombia. 2013

- **Restricciones especiales de tránsito**: No se realizarán, sus afectaciones son mínimas

- **Dispositivos de regulación de tránsito:** En los sectores a intervenir, se tendrá a consideración las establecidas por el Manual de Señalización 2024, donde se utilizarán dispositivos de canalización, además, señalización vertical de obra.


- **Sitios especiales:** No se encuentran sitios especiales en las áreas de influencia.

- **Cierres viales.** Se proyecta efectuar cierres informados de manera regulada.

En el periodo de ejecución del contrato, se realizará en horario de 7:00 am a 5:00 pm. en los que menos interferencia se genera con la comunidad de la zona de influencia, para que, de esta manera, no se presenten inconvenientes entre los vehículos y peatones que circulan por la zona, con los trabajadores que están involucrados con la obra

11. ESQUEMAS TIPICOS DE CIERRES PARCIALES CONTROLADOS

Imagen: Plano General de los sectores a intervenir

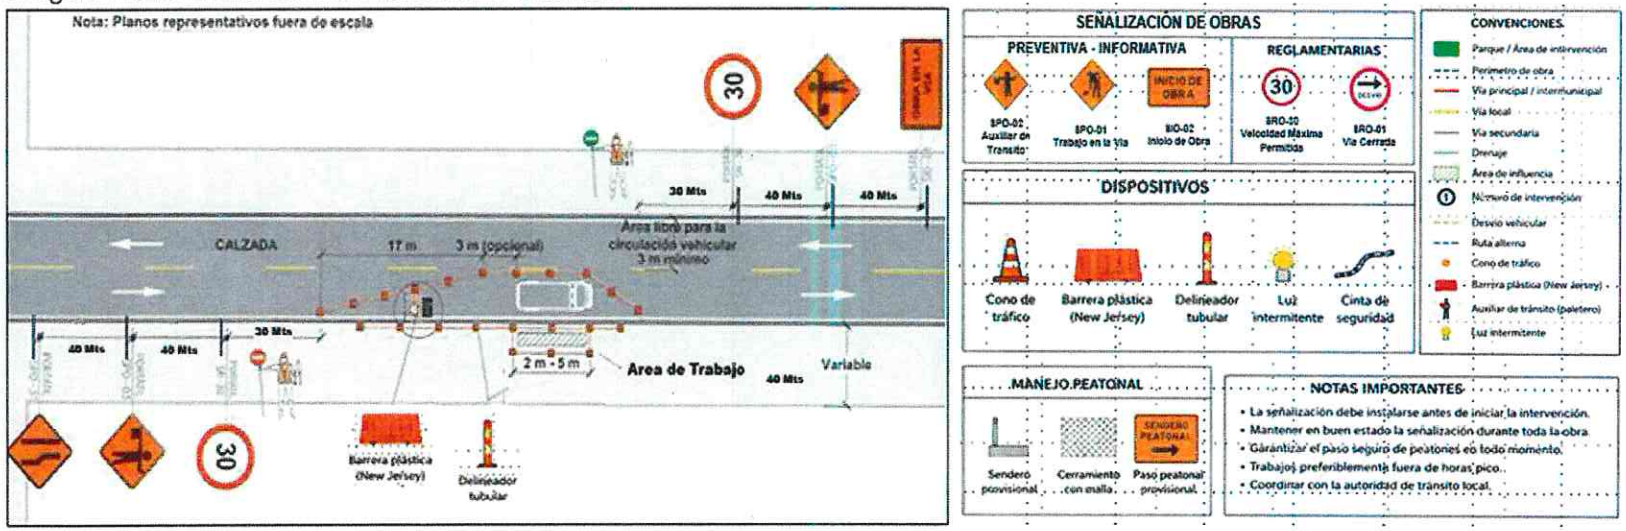

Fuente: Propia

12. PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO

Divulgación.

El responsable de la actividad deberá informar de manera oportuna a la comunidad sobre la ejecución de las actividades del proyecto, con el fin de garantizar el conocimiento previo de las intervenciones y reducir posibles afectaciones a la movilidad y al entorno.

Esta divulgación podrá realizarse mediante medios como avisos informativos en el sector, redes sociales institucionales, volantes, comunicación directa con residentes y establecimientos del área de influencia, o a través de otros mecanismos de difusión que permitan una adecuada socialización de las actividades, fechas, horarios y posibles restricciones temporales.

Plan de Coordinación.

Se establecerá un esquema de coordinación operativo en el cual se definirán los responsables de la ejecución de las actividades, incluyendo el personal técnico, operativo y de apoyo. Asimismo, se asignarán funciones específicas, responsabilidades y canales de comunicación claros entre los integrantes del equipo de trabajo.

Este plan permitirá garantizar una adecuada articulación durante el desarrollo de las labores, asegurando la toma de decisiones oportuna, la gestión de contingencias y el cumplimiento de las medidas de seguridad, tránsito y manejo ambiental establecidas para la intervención.

Disponibilidad e instalación de elementos.

Previo al inicio de las actividades, el responsable de las actividades del proyecto deberá verificar la disponibilidad, estado y correcta instalación de todos los elementos necesarios para la ejecución segura de los trabajos. Esto incluye personal operativo, elementos de protección personal (EPP), dispositivos de señalización vial, elementos de control de tránsito y equipos requeridos para la intervención.

Una vez verificado el cumplimiento de estas condiciones, se autorizará el inicio de las actividades, garantizando que se cuente con las condiciones mínimas de seguridad para trabajadores, peatones y demás actores viales presentes en el área de influencia.

13. AUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

El contratista que realizara las actividades de las obras llevará seguimiento y cumplimiento de los pasos del plan de manejo de tránsito, harán el respectivo seguimiento, definirán los correctivos y verificarán que el personal a cargo cumpla con su rol y responsabilidad para que se ajuste las zonas y áreas donde se realizará las intervenciones.

Este documento técnico está sujeto a cambios que se pueden dar en la vía, que no afecten la seguridad vial y la movilidad de la ciudad. La responsabilidad de implementar todas las recomendaciones aquí descritas corresponde al contratista que realizará el proyecto de la construcción de la planta.

El proceso de revisión, autorización y seguimiento del PMT estará a cargo del contratista y de la Autoridad de Tránsito competente del Municipio de Yopal, donde se pretende ejecutar la obra o de la entidad responsable de la infraestructura vial, según corresponda.

La definición del impacto, que indica el marco de actuación del PMT y sus objetivos, estará a cargo del responsable de la obra teniendo en cuenta el numeral ***7.12.5. Clasificación y categorías de los planes de manejo de tránsito***.

14. SUPERVISIÓN AL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

El organizador del proyecto llevará seguimiento y cumplimiento de los pasos del plan de manejo de tránsito, harán el respectivo seguimiento, definirán los correctivos y verificarán que el personal a cargo del cierre parcial de vías y las instalaciones de las señales de obra se localicen de acuerdo a la intervención, cumpla con su rol y responsabilidad para que se ajuste a las obras a realizar.

El contratista dueña de la obra es la responsable por los daños físicos y estructurales que se puedan causar a las vías alternativas utilizadas como desvíos provisionales durante la ejecución de los trabajos, siendo su obligación rehabilitarlas cuando sea necesario.

La revisión, autorización y seguimiento de la implementación del PMT estará a cargo de la autoridad competente, según la jurisdicción donde se pretende ejecutar la obra o de la entidad responsable de la infraestructura vial, según corresponda.

El seguimiento puede proponer acciones de mejora y/o mitigación de impactos negativos en la movilidad que no fueron percibidos al momento del diseño e implementación del PMT, pero

que se identificaron con el avance de obra, como por ejemplo el retiro de señalización, la eliminación de desvíos o la implementación de nuevos desvíos, entre otros.

15. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PLAN

Previo al inicio de las obras, se contarán con un plazo razonable para la socialización del Plan de Manejo de Tránsito, garantizando el pleno conocimiento de la operación y las obras a realizar. Para lo cual se realizará s socialización del proyectos y obras a realizar.

Una vez aprobado el Plan de Manejo de tráfico previo al inicio de obras, deberá informarse a los usuarios del área de influencia a través de medios masivos o de elementos de comunicación entregados en la vía. Esta divulgación será a través de un pasacalle que se instalará en ambas calzadas del sitio donde se realizará las obras.

16. CONDICIONES FINALES

La revisión, autorización y seguimiento de la implementación del PMT estará a cargo de la autoridad competente, según la jurisdicción donde se pretende ejecutar las actividades de las obras o de la entidad responsable de la infraestructura vial, según corresponda (Ejemplo: En los municipios la autoridad competente es el alcalde quien delega en la Secretaría de tránsito y/o movilidad y/o Inspección de tránsito; en caso de no poseer estas dependencias, la delegación puede ser la Secretaría de planeación o infraestructura o la ANI o el INVIAS en vías a cargo de la nación o el gobernador en los departamentos o sus secretarías). La entidad u organismo que aprueba el PMT puede solicitar la inclusión de requisitos de las categorías II y III establecidas en la Tabla 7-14 Contenido del documento técnico de PMT, según la necesidad y el impacto en la zona de influencia.

Cuando se utilicen o empleen cualquier dispositivo de señalización, deben seguirse los lineamientos establecidos por el Gobierno nacional en la Metodología para el diseño, selección e instalación de sistemas de contención vehicular, adoptada por el Ministerio de Transporte mediante resolución No. 20243040022485 de 2024 o aquella norma que la complemente, sustituya o actualice.

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El ingeniero director de Obra y/o el ingeniero Residente son los responsables de implementar de manera adecuada el Plan de Manejo de Tránsito que se ha propuesto en este documento para la construcción de las actividades del proyecto.

- La señalización que se ha considerado en el PMT contempla señales informativas, preventivas y reglamentarias, además de dispositivos especiales como son; delineadores tubulares con cinta plástica, maletines, recomendados en el Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte, año 2024.

- El proyecto **"Implementación de Sistemas Solares Fotovoltaicos de Iluminación en la vía La Pedrera del municipio de Yopal, Casanare"** contempla únicamente la instalación de iluminarias con tecnología solar en zonas paralelas a la vía, sin intervenir la estructura del pavimento, la calzada, las bermas funcionales ni los elementos de drenaje existentes.

- Para la puesta en marcha del PMT se debe tener en cuenta que debe existir disponibilidad e instalación de los elementos para el plan, no se debe improvisar en terreno pues se debe evitar riesgos de accidentalidad, congestión o cualquier situación que afecte el tránsito tanto de vehículos como de peatones.

- Debido a que no se ejecutarán excavaciones sobre la calzada ni ocupaciones permanentes de carriles, no se prevén alteraciones significativas en la capacidad operacional de la vía, los niveles de servicio ni los tiempos de recorrido.

- Es importante que el personal de apoyo al PMT sea capacitado antes de iniciar sus labores, tal es el caso de los auxiliares de tránsito, los cuales deben conocer bien las normas de tránsito y la forma como se realizan las indicaciones, para evitar confusiones en conductores y peatones; además, deben proteger su propia integridad al momento de detener el tráfico.

- Se debe realizar inspección y vigilancia continua a la ubicación de los dispositivos de control ajustando lo correspondiente en determinado caso.

- Es fundamental hacer un seguimiento al plan de manejo del tránsito durante todo el tiempo que dure las obras, con el fin de monitorear el tránsito vehicular y de acuerdo con ello tomar las medidas correctivas que fuesen necesarias para garantizar un eficaz funcionamiento de éste. Dichos correctivos que deberán ajustarse a los requerimientos y estado de avance

de las obras, y estarán relacionados con la implementación del control y regulación establecida.

- Todo tipo de señalización se debe revisar constantemente y reponer la que se deteriore o se pierda; se debe supervisar los respectivos cierres y accesos, al concluir labores hacer el seguimiento respectivo y registrar fotográficamente la instalación de la señalización.

- Para la canalización de movimientos peatonales y vehiculares, se delimitarán las áreas intervenidas mediante delineadores tubulares y cinta, permitiendo el desplazamiento normal.


- Cuando las condiciones operativas lo requieran, se realizará el cierre parcial de media calzada en una longitud no superior a 30 metros, garantizando en todo momento el paso controlado de los vehículos. Para tal fin, se instalarán los dispositivos de señalización temporal establecidos en el Manual de Señalización Vial 2024, con el objetivo de delimitar el área de trabajo, advertir a los usuarios sobre la presencia de la obra y brindar condiciones adecuadas de seguridad tanto al personal operativo como a los actores viales.

- El Plan de Manejo del Tránsito (PMT) realizado pretende adecuarse a las condiciones de ejecución del contrato que tiene por objeto **REALIZAR LA SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL A TODO COSTO DE LAS VÍAS DE LA CABECERA MUNICIPAL PRIORIZADAS POR LA SECRETARIA DE MOVILIDAD COMO ACCION DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YOPAL**

Elaboro:



LEONARDO ANDRÉS PACHECO ROJAS
INGENIERO CIVIL M.P:15202233328BY
C C.:1.118.533.833 DE YOPAL



ENERGÍA INTEGRAL ANDINA.

www.eia.com.co

ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP

ENTREGA DE DOTACIÓN Y/O ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ASOSUPRO
Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso

CONTRATO N°	**019 de 2026**	**PROYECTO N°**	**2025850010003**

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE
CONTRATISTA DE OBRA	ENERGIA INTEGRAL ANDINA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	019 de 2026
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	Proyectos Triple O S.A.S.

NOMBRE	CARGO	ELEMENTOS DE PROTECION PERSONAL.		NORMA A CUMPLIR	FECHA DE RECIBIDO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
		ELEMENTOS DE PROTECIÓN PERSONAL / DOTACIÓN	CANTIDAD			
Joaquín Vargas Rodriguez	Residente de Obra	Dotación (Pantalon Jean- camisa)	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	15-06-2026	Joaquin Vargas R.
Joaquín Vargas Rodriguez	Residente de Obra	Botas de seguridad	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	15-06-2026	Joaquin Vargas R.
Joaquín Vargas Rodriguez	Residente de Obra	Casco de seguridad	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	15-06-2026	Joaquin Vargas R.
Joaquín Vargas Rodriguez	Residente de Obra	Gafas de seguridad	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	15-06-2026	Joaquin Vargas R.

Con la firma de este registro certifico que:
1. Recibí los elementos de proteccion person:
2. Los revisé y se encuentran en buen estado.
3. Conozco su uso.
4. Me comprometo a usarlo.
5. Me comprometo a mantenerlo en buen estado e informar oportunamente la necesidad de cambiarlo

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día **15-06-2026**

Firma Joaquin Vargas R.
Nombre: JOAQUIN VARGAS RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: BY25007973

Firma
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: AT205-13(

Firma
Nombre: SANDRA MILENA HERNANDEZ ESGUERRA
PROFESIONAL SST DE OBRA
Licencia Profesional: 25-01029

Firma ANDINO BERNAL
Nombre:Nombre: ALVARO ANDRES BERNAL SALAMANCA
PROFESIONAL SST DE INTERVENTORIA
Licencia Profesional: 203 DE 13/01/2020

ENTREGA DE DOTACIÓN Y/O ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ASOSUPRO
Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE
CONTRATISTA DE OBRA	ENERGIA INTEGRAL ANDINA
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	019 de 2026
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	Proyectos Triple O S.A.S.

NOMBRE	CARGO	ELEMENTOS DE PROTECION PERSONAL.		NORMA A CUMPLIR	FECHA DE RECIBIDO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
		ELEMENTOS DE PROTECIÓN PERSONAL / DOTACIÓN	CANTIDAD			
Lauro Daniel León Garzón	Director de Obra	Dotación (Pantalon Jean- camisa)	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	15-06-2026	
Lauro Daniel León Garzón	Director de Obra	Botas de seguridad	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	15-06-2026	
Lauro Daniel León Garzón	Director de Obra	Casco de seguridad	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	15-06-2026	
Lauro Daniel León Garzón	Director de Obra	Gafas de seguridad	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	15-06-2026	

Con la firma de este registro certifico que:
1. Recibí los elementos de proteccion persona
2. Los revisé y se encuentran en buen estado.
3. Conozco su uso.
4. Me comprometo a usarlo.
5. Me comprometo a mantenerlo en buen estado e informar oportunamente la necesidad de cambiarlo

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en **ella**, el día **15-06-2026**

Firma
Nombre: JOAQUIN VARGAS RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: BY25007973

Firma
Nombre: **BRAYAN JOSE FONTALVO RUA**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: AT205-136

Firma
Nombre: SANDRA MILENA HERNÁNDEZ ESGUERRA
PROFESIONAL SST DE OBRA
Licencia Profesional: 25-01029

Firma
Nombre:Nombre: ALVARO ANDRES BERNAL SALAMANCAPRO
PROFESIONAL SST DE INTERVENTORIA
Licencia Profesional: 203 DE 13/01/2020

ENTREGA DE DOTACIÓN Y/O ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ASOSUPRO
Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE
CONTRATISTA DE OBRA	ENERGIA INTEGRAL ANDINA
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	019 de 2026
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	Proyectos Triple O S.A.S.

NOMBRE	CARGO	ELEMENTOS DE PROTECION PERSONAL.		NORMA A CUMPLIR	FECHA DE RECIBIDO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
		ELEMENTOS DE PROTECIÓN PERSONAL / DOTACIÓN	CANTIDAD			
Sandra Milena Hernandez Esguerra	SISOMA	Dotación (Pantalon Jean- camisa)	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	15-06-2026	
Sandra Milena Hernandez Esguerra	SISOMA	Botas de seguridad	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	15-06-2026	
Sandra Milena Hernandez Esguerra	SISOMA	Casco de seguridad	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	15-06-2026	
Sandra Milena Hernandez Esguerra	SISOMA	Gafas de seguridad	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	15-06-2026	

Con la firma de este registro certifico que:
1. Recibí los elementos de proteccion person
2. Los revisé y se encuentran en buen estado.
3. Conozco su uso.
4. Me comprometo a usarlo.
5. Me comprometo a mantenerlo en buen estado e informar oportunamente la necesidad de cambiarlo

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,
el día **15-06-2026**

Firma
Nombre: JOAQUIN VARGAS RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: BY25007973

Firma
Nombre: **BRAYAN JOSE FONTALVO RUA**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: AT205-13(

Firma
Nombre: SANDRA MILENA HERNÁNDEZ ESGUERRA
PROFESIONAL SST DE OBRA
Licencia Profesional: 25-01029

Firma
Nombre:Nombre: ALVARO ANDRES BERNAL SALAMANCAPRC
PROFESIONAL SST DE INTERVENTORIA
Licencia Profesional: 203 DE 13/01/2020

ENTREGA DE DOTACIÓN Y/O ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ASOSUPRO

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE
CONTRATISTA DE OBRA	ENERGIA INTEGRAL ANDINA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	019 de 2026
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	Proyectos Triple O S.A.S.

NOMBRE	CARGO	ELEMENTOS DE PROTECION PERSONAL.		NORMA A CUMPLIR	FECHA DE RECIBIDO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
		ELEMENTOS DE PROTECIÓN PERSONAL / DOTACIÓN	CANTIDAD			
Nestor Raul Canchon Casas	Técnico Electricista	Dotación (Overol)	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	15-06-2026	Nestor Canchon
Nestor Raul Canchon Casas	Técnico Electricista	Botas de seguridad	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	15-06-2026	Nestor Canchon
Nestor Raul Canchon Casas	Técnico Electricista	Casco de seguridad	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	15-06-2026	Nestor Canchon
Nestor Raul Canchon Casas	Técnico Electricista	Gafas de seguridad	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	15-06-2026	Nestor Canchon
Nestor Raul Canchon Casas	Técnico Electricista	Guantes de vaqueta	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	15-06-2026	Nestor Canchon
Nestor Raul Canchon Casas	Técnico Electricista	Guantes dieléctricos	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	15-06-2026	Nestor Canchon

Con la firma de este registro certifico que:
1. Recibí los elementos de proteccion pers
2. Los revisé y se encuentran en buen estado.
3. Conozco su uso.
4. Me comprometo a usarlo.
5. Me comprometo a mantenerlo en buen estado e informar oportunamente la necesidad de cambiarlo

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día **15-06-2026**

Firma

Nombre: JOAQUIN VARGAS RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: BY25007973

Firma

Nombre: SANDRA MILENA HERNÁNDEZ ESGUERRA
PROFESIONAL SST DE OBRA
Licencia Profesional: 25-01029

Firma

Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: AT205-1

Firma

Nombre:Nombre: ALVARO ANDRES BERNAL SALAMANCA
PROFESIONAL SST DE INTERVENTORIA
Licencia Profesional: 203 DE 13/01/2020



ENERGÍA INTEGRAL ANDINA.

www.eia.com.co

INFORME IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ENERGÍA INTEGRAL ANDINA

www.eia.com.co

INFORME AVANCE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No. 001

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE

CONTRATO DE OBRA: 019 DE 2026

Periodo: 09 al 30 de Junio de 2026

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN	3
2. OBJETIVO	4
2.1. Objetivo específicos	4
3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO	5
3.1. Localización geográfica del proyecto.	5
3.2. Descripción de las fases del proyecto	7
3.3. Descripción de las actividades de seguridad y salud en el trabajo	7
3.3.1. Relación de personal	7
3.3.2. Aportes al sistema de seguridad social	8
3.3.3. Exámenes médicos ocupacionales	9
3.3.4. Inducción en seguridad y salud en el trabajo.	10
3.3.5. Entrega de dotación y elementos de protección personal.	12
3.3.6. Actividades de capacitación y formación	13
3.3.7. Inspecciones de seguridad	13
3.3.8. Indicadores	13
3.3.8.1 Frecuencia de accidentalidad	13
3.3.8.2 Severidad de la accidentalidad	14
3.3.9. Plan de manejo de Tráfico- PMT	15
4. CONCLUSIONES	16
5. ANEXOS	16

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) registra el avance y desarrollo de las actividades establecidas en el plan de trabajo para la ejecución del contrato 019 de 2026 - ASOSUPRO, tiene como propósito presentar el estado de las actividades desarrolladas para la identificación, evaluación y control de los riesgos laborales, así como el cumplimiento de la normatividad legal aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo.

A la fecha de elaboración del presente informe, no se han iniciado las actividades en obra, por lo que no se han desarrollado labores operativas ni se han generado exposiciones a los riesgos propios de la ejecución del proyecto. En consecuencia, las acciones realizadas se han enfocado en la planificación, organización y verificación de los requisitos del SG-SST, con el propósito de garantizar que, una vez inicien las actividades constructivas, se cuente con las condiciones necesarias para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores.

Este informe deja constancia del estado actual del proyecto y servirá como base para el seguimiento de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo durante las etapas posteriores de ejecución.

2. OBJETIVO

Presentar las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ejecutadas durante el período comprendido entre el 09 al 30 de junio de 2026, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos legales vigentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Asimismo, evidenciar las acciones implementadas para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como el seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para la ejecución del Contrato No. 019 de 2026.

2.1. Objetivo específicos

- ✓ Verificar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
- ✓ Implementar las actividades establecidas en el Plan de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
- ✓ Identificar oportunidades de mejora que fortalezcan la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y faciliten el cumplimiento de la normatividad vigente.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATO N°	019 de 2026	**PROYECTO N°**	2025850010003
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE		
NÚMERO DE INFORME:	001		
PERIODO:	09 al 30 de junio de 2026		

3.1. Localización geográfica del proyecto.

El proyecto se localiza en el municipio de Yopal, capital del departamento de Casanare, en la región de la Orinoquia colombiana, específicamente sobre la vía La Pedrera, en el área rural del municipio. Yopal se encuentra ubicado en el occidente del departamento, sobre el piedemonte de la Cordillera Oriental, constituyéndose como uno de los principales centros urbanos y de servicios de la región.


En cuanto a sus límites territoriales, Yopal limita al norte con los municipios de Nunchía y Paya, este último perteneciente al departamento de Boyacá; al sur con los municipios de Orocué y Maní; al oriente con Nunchía y San Luis de Palenque; y al occidente con Aguazul y Labranzagrande, este último en el departamento de Boyacá.


El espacio destinado para realizar la intervención del proyecto de inversión denominado "IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE", se localiza en el sector denominado La Pedrera de la vereda el Picón, ubicando el final del tramo a intervenir a 5,74 kilómetros del casco urbano del municipio de Yopal

MUNICIPIO:	YOPAL CASANARE	VEREDA:	Vía La Pedrera

COORDENADAS:

TRAMO A INTERVENIR							
PUNTO INICIAL				PUNTO FINAL			
K0+000				K12+7353,93			
PLANAS		GEOGRAFICAS		PLANAS		GEOGRAFICAS	
N: 1079910.452	E:855282.146	LAT: 5.317450°	LONG: -72.383000°	N:1078981.067	E:864818.949	LAT: 5.309039°	LONG: -72.387160°

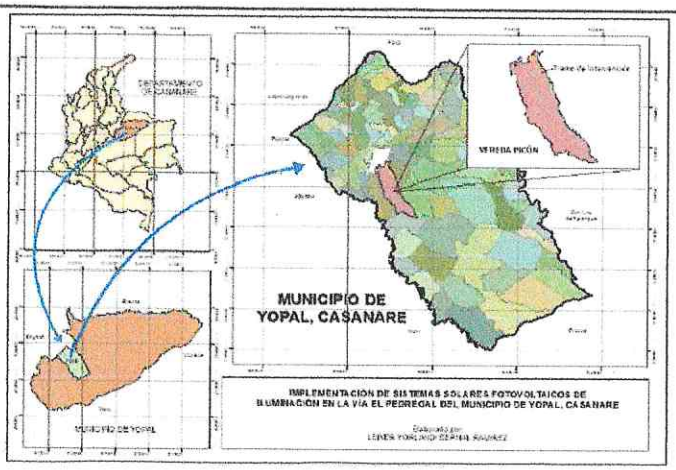

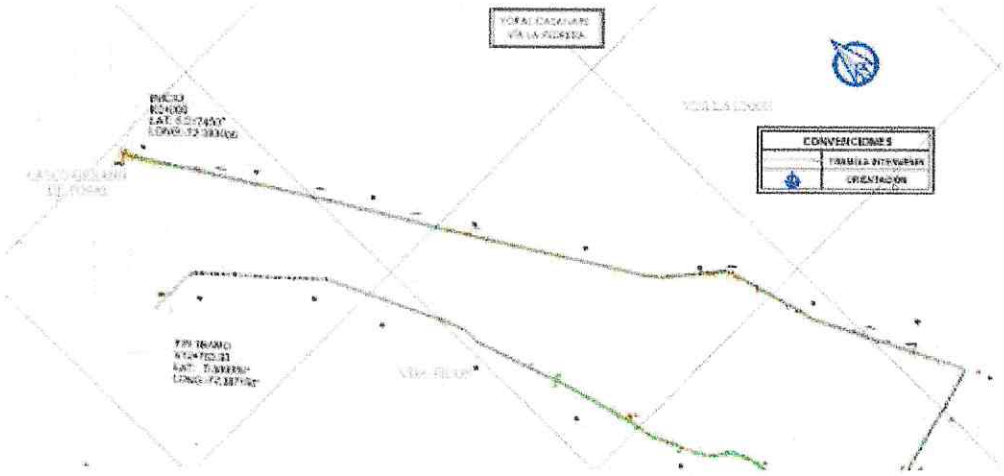

3.2. Descripción de las fases del proyecto

Actividades Preliminares
Replanteo de obra.
Desmonte y limpieza en zonas no boscosas del sitio (incluye retiro disposición final)

Construcción
Excavación manual en material común del sitio para cimentación de postes de alumbrado público solar (Incluye retiro y disposición final).
Suministro e Instalación de poste en fibra de vidrio para alumbrado público (12mt 510kgf).
Cimentación para postes de alumbrado público solar.
Suministro e instalación de luminarias solar ELITE III PRO INI-SL Incluye (Luminaria LED, Panel solar fotovoltaico y batería, soporte para conexiones, brazo metálico galvanizado y collarín anti vandálico).

Cierre y Finalización
Desmovilización de equipos, limpieza de áreas intervenidas y entrega de la obra.

3.3. Descripción de las actividades de seguridad y salud en el trabajo

Durante el período del 09 al 30 de junio de 2026, las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo se orientaron al cumplimiento de los requisitos legales y a la preparación del proyecto para el inicio de la fase de ejecución.

Debido a que no se han iniciado las actividades en obra, no fue necesario desarrollar actividades operativas relacionadas con la identificación de peligros en campo, inspecciones de obra, permisos de trabajo, investigaciones de incidentes o accidentes, entrega de elementos de protección personal (EPP) para labores operativas ni ejecución de capacitaciones en sitio.

A continuación se relacionan las actividades desarrolladas durante el período reportado.

3.3.1. Relación de personal

Relación de personal profesional aprobado.

NOMBRE	CARGO	% DEDICACIÓN PERSONA- MES
Lauro Daniel León Garzón	Director de obra	50%
Joaquín Vargas Rodríguez	Residente de obra	100%
Laura Camila Caballero Roldan	Ingeniero Ambiental	30%
Néstor Raúl Canchón Casas	Tecnólogo Electricista	100%
Sandra Milena Hernández Esguerra	Profesional SISOMA	50%

3.3.2. Aportes al sistema de seguridad social

ENERGIA INTEGRAL ANDINA, con el propósito de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley 100 de 1993, relacionada con el Sistema de Seguridad Social Integral, realizó la verificación de los aportes correspondientes al personal vinculado al proyecto, incluyendo trabajadores dependientes e independientes, de acuerdo con los requisitos legales aplicables.

Durante el período comprendido entre el 09 y 30 de junio de 2026, se efectuó la revisión documental correspondiente a los soportes de afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y riesgos laborales), como parte de las actividades de control y seguimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Teniendo en cuenta que a la fecha no se han iniciado las actividades en obra, no se cuenta con personal operativo expuesto a los riesgos propios de la ejecución del proyecto. Sin embargo, se realizó la verificación del personal profesional aprobado con las afiliaciones y aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Trabajadores directos de ENERGÍA INTEGRAL ANDINA:

Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	Días Cotizados	Número de planilla	EPS	PENSION	ARL
LAURO DANIEL LEÓN GARZÓN	DIRECTOR DE OBRA	74,377,955	30	6026244447	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA
JOAQUIN VARGAS RODRIGUEZ	RESIDENTE DE OBRA	6,772,241	30	6026244447	SANITAS	COLPENSIONES	SURA
NESTOR RAUL CANCHON CASAS	TECNOLOGO ELECTRICISTA	80,737,747	30	6026244447	SANITAS	COLFONDOS	SURA
SANDRA MILENA HERNÁNDEZ ESGUERRA	PROF.SISOMA	20,430,391	30	6026244447	FAMISANAR	COLFONDOS	SURA

Nota: Se anexan las planillas de pago No. 6033253680 y No. 6033396031, correspondientes a la corrección realizada por concepto de nivel de riesgo del director de obra y del profesional SISOMA.

Relación de personal vinculado por modalidad independiente

Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	Días Cotizados	Número de planilla	EPS	PENSION	ARL
LAURA CAMILA CABALLERO ROLDAN	INGENIERA AMBIENTAL	1,070,622,211	30	6025159055	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA

Para la ejecución de las actividades de replanteo de obra, se dispuso del servicio de topografía, integrado por el siguiente personal:

Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	Días Cotizados	Número de planilla	EPS	PENSION	ARL
FANNY BARRERA GONZALEZ	TOPÓGRAFA	46,370,853	30	9506365883	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA
ELBER IGNACIO GAMBOA GARCIA	CADENERO	7,311,566	30	9506365883	SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA

Anexo 1- Planillas de seguridad social.

3.3.3. Exámenes médicos ocupacionales

De acuerdo con los peligros, actividades y condiciones de trabajo a las cuales estarán expuestos los colaboradores durante la ejecución del proyecto, y en cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, se establece la importancia de realizar los exámenes médicos ocupacionales correspondientes antes del inicio de las actividades laborales.

Para el período comprendido entre el 09 y 30 de junio de 2026, y teniendo en cuenta que no se han iniciado las actividades en obra, no se han requerido exámenes médicos ocupacionales de ingreso para personal operativo.
Sin embargo, se realizó la verificación de los exámenes médicos ocupacionales periódicos del personal profesional aprobado para la ejecución del contrato, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el profesiograma, validando que estos correspondan a las condiciones de salud requeridas para el desarrollo de las funciones asignadas.

Trabajadores directos de ENERGÍA INTEGRAL ANDINA (Exámenes periódicos):

NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO Y/O OFICIO	FECHA DE EXAMEN PERIODICO	CONCEPTO	FRECUENCIA (PROFESIOGRAMA)
LAURO DANIEL LEÓN GARZÓN	DIRECTOR DE OBRA	30/04/2026	SATISFACTORIO	24 MESES
JOAQUIN VARGAS RODRIGUEZ	RESIDENTE DE OBRA	7/4/2026	SATISFACTORIO	24 MESES
NESTOR RAUL CANCHON CASAS	TECNOLOGO ELECTRICISTA	27/01/2025	APTO Y SIN RESTRICCIONES PARA TRABAJO EN ALTURAS	18 MESES
SANDRA MILENA HERNÁNDEZ ESGUERRA	PROF.SISOMA	17/03/2026	SATISFACTORIO	18 MESES

Personal vinculado por modalidad independiente (Examen de ingreso):

NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO Y/O OFICIO	FECHA DE EXAMEN DE INGRESO	CONCEPTO	FRECUENCIA (PROFESIOGRAMA)
LAURA CAMILA CABALLERO ROLDAN	INGENIERA AMBIENTAL	10/6/2026	SATISFACTORIO	Anual


Anexo 2- Exámenes médicos ocupacionales

3.3.4. Inducción en seguridad y salud en el trabajo.

Durante el período reportado, se realizó la verificación de las actividades relacionadas con el proceso de reinducción en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), como parte de las acciones de seguimiento y fortalecimiento del sistema.

Teniendo en cuenta que a la fecha no se han iniciado las actividades en obra, no ha sido necesario realizar jornadas de inducción dirigidas al personal operativo.

Sin embargo, se realizó el proceso de inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) a la profesional ambiental que ingresó al proyecto en el mes de junio de 2026, vinculada bajo la modalidad independiente.

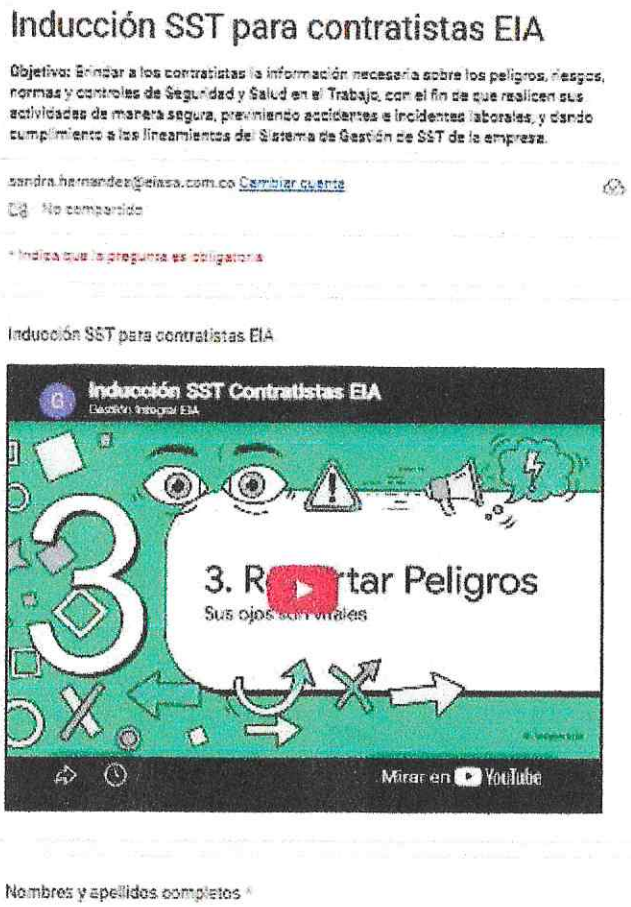

Así mismo, el personal profesional aprobado cuenta con el proceso de reinducción en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), en el cual se socializaron los lineamientos generales del sistema, responsabilidades en materia de SST, identificación de peligros, medidas de prevención y control de riesgos, reporte de actos y condiciones inseguras, y demás aspectos aplicables al desarrollo de sus actividades.

Una vez se dé inicio a las actividades del proyecto, se realizará la inducción al personal vinculado, dejando como evidencia los registros de asistencia, evaluación y soportes correspondientes, garantizando el cumplimiento de los requisitos establecidos dentro del SG-SST.

Proceso de Reinducción Corporativa 2025-2026

Bienvenido(a) al proceso de Reinducción Corporativa.

En este espacio encontrará los temas que serán abordados, así como un cuestionario de preguntas que deberá diligenciar seleccionando la opción correcta.

Durante el desarrollo de la reinducción, usted navegará por los siguientes **temarios corporativos**:

1. Sistema Integrado de Gestión
1a. Calidad
1b. Seguridad y Salud en el Trabajo
1c. Ambiental

2. Compliance
2a. SAGRILAFT
2b. Ética empresarial
2c. Protección de datos personales
2d. Programa de competencia libre y leal / Compliance

3. Talento Humano

Instrucción para los participantes

La presente **reinducción corporativa** consta de **31 preguntas**. Para aprobarla, es necesario obtener una calificación mínima de **20 respuestas correctas**.

En caso de obtener una calificación inferior a **20 puntos**, deberá realizar nuevamente la inducción y presentar la evaluación hasta alcanzar la nota mínima aprobatoria.

Criterio de aprobación:

- Total de preguntas: **31**
- Puntaje mínimo para aprobar: **20 respuestas correctas**

Anexo 3. Registros de inducción y reinducción al SGSST.

3.3.5. Entrega de dotación y elementos de protección personal.

Teniendo en cuenta que durante el periodo evaluado no se dio inicio a las actividades de obra, no fue necesario realizar la entrega de EPP ni de dotación al personal operativo. Sin embargo, al personal profesional vinculado al proyecto se le realizó la entrega de los

Elementos de Protección Personal (EPP) y la dotación correspondiente, de acuerdo con los requisitos definidos en la Matriz de Elementos de Protección Personal, considerando los peligros, riesgos y controles asociados a las actividades propias de cada cargo. De esta manera, se garantiza el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Anexo 4. Registros de entrega de Elementos de Protección Personal (EPP) y dotación.

3.3.6. Actividades de capacitación y formación

Para el presente período de reporte, esta actividad no aplica, toda vez que no se ha dado inicio a la ejecución de las actividades de obra, no se ha vinculado personal operativo, razón por la cual no ha sido necesario ejecutar las capacitaciones contempladas en el Plan Anual de Capacitación del SG-SST.

Una vez se inicie la ejecución operativa en obra, se implementará el Plan Anual de Capacitación del SG-SST, dejando como evidencia los registros de asistencia, el material de apoyo y los soportes correspondientes.

3.3.7. Inspecciones de seguridad

Las inspecciones de seguridad se encuentran previstas para la fase de ejecución de obra; por tal motivo, durante el presente período no se realizaron, debido a que el proyecto aún no cuenta con actividades operativas en campo.

3.3.8. Indicadores

3.3.8.1 Frecuencia de accidentalidad

En el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), se realiza el seguimiento al indicador de frecuencia de accidentalidad, con el propósito de evaluar la ocurrencia de accidentes de trabajo en relación con la exposición de los trabajadores y verificar la efectividad de las medidas de prevención y control implementadas.. Este indicador constituye una herramienta para el monitoreo del desempeño en SST, facilitando la toma de decisiones y el fortalecimiento de las acciones orientadas a la prevención de accidentes y la mejora continua de las condiciones de trabajo.

FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD										
Descripción del indicador	2026							2027		
	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR
No. De accidentes de Trabajo presentados en el mes	0									
No. De trabajadores en el mes	0									
No. Trabajadores en el mes	5									
Resultado del indicador frecuencia de Accidentalidad	0									

Durante el período evaluado no se registraron accidentes de trabajo, por lo que el indicador de severidad presenta un resultado de cero (0).

3.3.8.2 Severidad de la accidentalidad

Con el propósito de realizar el seguimiento y control del comportamiento de la severidad de la accidentalidad laboral, ENERGIA INTEGRAL ANDINA, a través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), implementó el indicador de severidad, con el fin de evaluar los días perdidos por accidentes de trabajo, analizar la efectividad de las medidas de prevención y control adoptadas y fortalecer la mejora continua de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

SEVERIDAD DE LA ACCIDENTALIDAD										
Descripción del indicador	2026							2027		
	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR
No. Total de días perdidos en el mes por accidentes laborales	0									
No. Total de días cargados por muerte o por Pérdida de Capacidad Laboral	0									
No. Trabajadores en el mes	5									
Resultado del indicador de severidad	0									

Durante el período evaluado no se registraron accidentes de trabajo, por lo que el indicador de severidad presenta un resultado de cero (0).

3.3.9. Plan de manejo de Tráfico- PMT

ENERGIA INTEGRAL ANDINA, en cumplimiento de la normatividad vigente en materia de tránsito y seguridad vial, elaboró el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para la ejecución del proyecto **"IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE"**. Durante el período de reporte, se realizó la **revisión y aprobación del PMT por parte de la interventoría**, dando cumplimiento a los requerimientos técnicos establecidos para su posterior trámite ante la autoridad competente.

El PMT constituye el instrumento técnico mediante el cual se establecen las medidas de regulación, señalización, prevención y control del tránsito requeridas durante la ejecución de las actividades del proyecto. En este se contemplan las medidas técnicas, operativas y administrativas necesarias para gestionar de manera segura la movilidad durante el desarrollo de las actividades constructivas, orientadas a prevenir, mitigar y controlar las posibles afectaciones sobre el tránsito vehicular y peatonal en las zonas de intervención.

Dentro de las medidas previstas se encuentra la implementación de dispositivos de señalización temporal, la regulación y control del tránsito, la delimitación y protección de las zonas de trabajo, así como la adopción de medidas de información y prevención dirigidas a peatones, conductores, ciclistas y demás actores viales. Estas acciones están encaminadas a mantener condiciones seguras de circulación, proteger la integridad de la comunidad y del personal vinculado al proyecto y minimizar las posibles afectaciones a la movilidad durante la ejecución de las obras.

Con la implementación del PMT se busca garantizar que las actividades del proyecto se desarrollen de manera organizada, segura y eficiente, en concordancia con la normativa aplicable y las buenas prácticas de seguridad vial, promoviendo una adecuada articulación entre la ejecución de las actividades constructivas y las condiciones habituales de movilidad del sector.

Estado de implementación: Durante el período reportado no se ha iniciado la ejecución del proyecto en campo, por lo cual no ha sido necesaria la implementación de las medidas contempladas en el PMT. El documento fue aprobado por la interventoría y se procederá con su radicación ante la Secretaría de Tránsito y Transporte del Municipio de Yopal para su respectiva revisión y aprobación. Una vez autorizado y previo al inicio de las actividades que puedan afectar la movilidad, se implementarán las medidas de señalización, regulación y control establecidas en el PMT.

Anexo 5. Aprobación del PMT por la interventoría

4. CONCLUSIONES

Durante el período objeto del presente informe ENERGÍA INTEGRAL ANDINA S.A.S. adelantó las actividades administrativas y de planificación requeridas para garantizar el cumplimiento de los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) desde el inicio de la ejecución.

En este sentido, se establecieron los procedimientos, programas y documentos necesarios para la gestión de los riesgos laborales, incluyendo la inducción del personal profesional, la entrega de los Elementos de Protección Personal (EPP) correspondientes, la elaboración del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) y los demás requisitos aplicables al proyecto.

Una vez se inicie la fase de ejecución, se implementarán las actividades operativas contempladas en el SG-SST, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente, la prevención de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como la protección de los trabajadores, la comunidad y los demás actores involucrados en el desarrollo del proyecto.

5. ANEXOS

- ✓ **Anexo 1**- Planillas de seguridad social.
- ✓ **Anexo 2**- Exámenes médicos ocupacionales
- ✓ **Anexo 3.** Registros de inducción y reinducción al SGSST.
- ✓ **Anexo 4.** Registros de entrega de Elementos de Protección Personal (EPP) y dotación.
- ✓ **Anexo 5.** Aprobación del plan de manejo de Tránsito - PMT por parte de la interventoría

Elaboró:

SANDRA MILENA HERNÁNDEZ ESGUERRA
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Resolución: 25-01029

ANEXO 1.
PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

ARL | sura

Medellín, 15 de julio de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A..

CERTIFICA:

Que LAURA CAMILA CABALLERO ROLDAN identificado(a) con cédula de ciudadanía 1070622211 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:
Fecha inicio cobertura: 01/06/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A E I A S.A N860533206

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
3611001 - ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES ALÁMBRICAS, INCLUYE LA EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO O FACILITACIÓN DEL ACCESO A LOS SERVICIOS PARA LA TRANSMISIÓN DE VOZ, DATOS, TEXTO, SONIDO Y VIDEO UTILIZANDO INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES ALÁMBRICA, SERVICIOS DE TELEGRAFÍA Y TELEFONÍA

CLASE DE RIESGO: 3 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 2.436%
CENTRO DE TRABAJO: 0000000266 - BOGOTA TOBERIN RG4
CLASE: 4 **PORCENTAJE:** 4.35% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
4272001 - FABRICACIÓN DE PILAS, BATERÍAS Y ACUMULADORES ELÉCTRICOS, INCLUYE LA FABRICACIÓN DE PILAS RECARGABLES (ACUMULADORES) Y NO RECARGABLES (PILA ELÉCTRICA), LA FABRICACIÓN DE PILAS Y BATERÍAS ELÉCTRICAS: PILAS DE DIÓXIDO DE MANGANESO, ÓXIDO DE MERCURIO, ÓXIDO DE PLATA U OTRO MATERIAL; RECONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS PARA AUTOMOTORES; BATERÍAS DE ÁCIDO DE PLOMO, NÍQUEL-HIERRO, NÍQUEL-CADMIO, NÍQUEL E HIDRURO METÁLICO, LITIO, PILAS SECAS Y PILAS HÚMEDAS

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
4272001 - FABRICACIÓN DE PILAS, BATERÍAS Y ACUMULADORES ELÉCTRICOS, INCLUYE LA FABRICACIÓN DE PILAS RECARGABLES (ACUMULADORES) Y NO RECARGABLES (PILA ELÉCTRICA), LA FABRICACIÓN DE PILAS Y BATERÍAS ELÉCTRICAS: PILAS DE DIÓXIDO DE MANGANESO, ÓXIDO DE MERCURIO, ÓXIDO DE PLATA U OTRO MATERIAL; RECONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS PARA AUTOMOTORES; BATERÍAS DE ÁCIDO DE PLOMO, NÍQUEL-HIERRO, NÍQUEL-CADMIO, NÍQUEL E HIDRURO METÁLICO, LITIO, PILAS SECAS Y PILAS HÚMEDAS

CODIGO DE ACTIVIDAD: 4272001
CLASE DE RIESGO: 4 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 4.35%

Su pago lo debe realizar con riesgo 4 (4.35 %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:
C10100007072619630857

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 15/07/2026 8.34 AM

Dirección IP: 186.154.194.109, 192.230.104.6, 172.16.42.57

Pensiones Obligatorias

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A

En condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.144.331 - 3

CERTIFICA QUE:

LAURA CAMILA CABALLERO ROLDAN, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.070.622.211**, se encuentra afiliado(a) al **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR** desde el 22 de julio de 2016.

La presente certificación se expide el 12 de Marzo del 2025.

Cordialmente,

Gerente de Clientes

En Porvenir nos transformamos pensando en tu comodidad, por esto, ponemos a tu disposición los canales digitales para que consultes y obtengas la información de tus productos.

App Porvenir | www.porvenir.com.co

SaludTotal

BOGOTA, Julio 2 de 2026

Señora:

CABALLERO ROLDAN LAURA CAMILA

CC. 1070622211CR 52 NO 165 58 10 501 - 8000

Ciudad

Ref: M-PYGA-F065. SOLICITUD INFORMACIÓN - AFILIACIÓN SALUD TOTAL EPS S.A.

En relación con el asunto de la referencia, y atendiendo su solicitud, nos permitimos informarle que a la fecha de expedición de la presente comunicación consta en nuestra base de datos que su afiliación al régimen contributivo de Salud Total EPS S.A. se realizó a partir de Julio 31 de 2021. Los usuarios inscritos en su afiliación son:

Nombre	Documento	Tipo	Afiliación	Sem_cot	Sem_Ant	Parentesco	Estado_Afiliación	Fecha_de_desafiliación_EPS	Estado_Actual	Discapacidad
CABALLERO ROLDAN LAURA CAMILA	1070622211	C	Jul-31-2021	56	26	COTIZANTE	VIGENTE			Ninguna

De acuerdo con los registros de la base de datos, su grupo familiar presenta la siguiente relación laboral:

Razón social del aportante	Usuario en contrato	Tipo de contrato	Estado de contrato
LAURA CAMILA CABALLERO ROLDAN	1070622211	Independientes con contrato de prestación de servi	CERRADO
LAURA CAMILA CABALLERO ROLDAN	1070622211	Independientes con contrato de prestación de servi	VIGENTE
UNION TEMPORAL OBRAR DALET	1070622211	Dependiente	VIGENTE
UNION TEMPORAL RESTAURACION SIBERIA	1070622211	Dependiente	VIGENTE
CONSORCIO CONSTRUNARO TORCA	1070622211	Dependiente	CERRADO
CONSORCIO IDENTIFICACION FASE	1070622211	Dependiente	CERRADO
CONSORCIO IDENTIFICACION FASE	1070622211	Dependiente	CERRADO
CONTRUCRIEDRA CIA LTDA	1070622211	Dependiente	CERRADO
EMPLEADOR SAT TEMPORAL	1070622211	Dependiente	CERRADO
HUMANOS ASESORIA EN SERVICIOS OCASIONALES SA	1070622211	Dependiente	VIGENTE
LAURA CAMILA CABALLERO ROLDAN	1070622211	Independiente con aporte voluntario a salud	CERRADO
LAURA CAMILA CABALLERO ROLDAN	1070622211	Independientes con contrato de prestación de servi	CERRADO

CARTA NO VALIDA PARA TRASLADO

En Salud Total apreciamos la confianza que usted ha depositado en nosotros y esperamos que usted y su familia continúen disfrutando de nuestros servicios de salud con Calidad total. Cualquier información adicional, con gusto será atendida por el personal de servicio al cliente de la sede administrativa de su ciudad, o puede comunicarse con nuestra línea gratuita 018000 1 14524 a nivel nacional o en Bogotá al teléfono 4854555.

Cordialmente,

Gerencia de Operaciones Comercial
SALUD TOTAL EPS S.A.

Elaboró: Servicios en Línea

NOTA: En caso requerido, este certificado es válido para la atención a través del Régimen Subsidiado o como población vinculada, si el Estado Actual es afiliación cancelada, novedad de retiro de trabajo, afiliación no efectiva, exclusión o anulación de la afiliación, siempre y cuando al momento de retiro o exclusión no haya reportado mora. Si es mora, o cancelación por falta de pago, debe informar a su aportante que debe ponerse al día en los pagos.
