

ENERGÍA INTEGRAL ANDINA.

www.eia.com.co

BITÁCORA DE OBRA

BITACORA DE OBRA

ASOSUPRO

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
YOPAL CASANARE	9	6	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003
CONTRATO INTERVENTORIA N°	019 de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.		
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	-	-	-	El día 09 de junio de 2026, el clima reportado es el siguiente:Mañana y tarde soleado.No se presentaron lluvias.
TORMENTA	-	-	-	
LLUVIOSO	-	-	-	
SOLEADO	x	x	-	
Tiempo de standby por lluvias		0 HORAS		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	-	-			-	
OFICIAL	-	-			-	
OPERARIO	-	-			-	
AYUDANTE	-	-			-	
CELADOR	-	-			-	
TOPÓGRAFO	1	SI			-	
CADENERO	1	SI			-	
OTRO	-	-			-	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA

OBSERVACIONES GENERALES

Se dio inicio a las actividades correspondientes al replanteo de obra mediante la revisión de los planos, especificaciones técnicas, diseños y documentación contractual del proyecto, con el propósito de definir la metodología para el desarrollo de las actividades de campo. Paralelamente, se iniciaron las gestiones administrativas para la elaboración de la valla informativa exigida por el contrato y la gestión de adquisición de postes y luminarias, buscando optimizar los tiempos de fabricación e importación de estos suministros.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Joaquín Vargas Rodríguez	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: BY25007973	
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-136969	
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 20641705	
Nombre: Esneider Rafael Torres Suarez	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-90991	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

BITACORA DE OBRA

ASOSUPRO

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
YOPAL CASANARE	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	10	6	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003
CONTRATO INTERVENTORIA N°	019 de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.		
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	-	-	-	El día 10 de junio de 2026, el clima reportado es el siguiente:Mañana y tarde soleado.No se presentaron lluvias.
TORMENTA	-	-	-	
LLUVIOSO	-	-	-	
SOLEADO	x	x	-	
Tiempo de standby por lluvias		0 HORAS		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	-	-			-	N/A
OFICIAL	-	-			-	N/A
OPERARIO	-	-			-	N/A
AYUDANTE	-	-			-	N/A
CELADOR	-	-			-	N/A
TOPÓGRAFO	1	SI			-	N/A
CADENERO	1	SI			-	N/A
OTRO	-	-			-	N/A

ASPECTOS TÉCNICOS

OBSERVACIONES GENERALES

Se realizó el primer recorrido de reconocimiento sobre el corredor donde se ejecutará el proyecto, verificando las condiciones generales del terreno, accesos, topografía y posibles interferencias. Durante la inspección se identificó la presencia de elementos que evidencian la existencia de redes de gas, razón por la cual se determinó la necesidad de obtener información oficial de dichas redes antes de iniciar el replanteo definitivo.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Joaquín Vargas Rodríguez	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: BY25007973	
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-136969	
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 20641705	
Nombre: Esneider Rafael Torres Suarez	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-90991	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

BITACORA DE OBRA

ASOSUPRO

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
YOPAL CASANARE	11	6	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003
CONTRATO INTERVENTORIA N°	019 de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.		
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	-	-	-	El día 11 de junio de 2026, el clima reportado es el siguiente:Mañana y tarde soleado.No se presentaron lluvias.
TORMENTA	-	-	-	
LLUVIOSO	-	-	-	
SOLEADO	x	x	-	
Tiempo de standby por lluvias		0 HORAS		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	-	-			-	N/A
OFICIAL	-	-			-	N/A
OPERARIO	-	-			-	N/A
AYUDANTE	-	-			-	N/A
CELADOR	-	-			-	N/A
TOPÓGRAFO	1	SI			-	N/A
CADENERO	1	SI			-	N/A
OTRO	-	-			-	N/A

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA

OBSERVACIONES GENERALES

Se adelantaron las gestiones ante ENERCA S.A. E.S.P. y Cusianagas para solicitar la cartografía actualizada de las redes de servicios públicos presentes en el área de influencia del proyecto, especialmente la correspondiente a la red de gas, con el fin de garantizar que la ubicación de los postes no genere interferencias con la infraestructura existente. De manera paralela, se continuó con la gestión de adquisición de los principales suministros del proyecto.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Joaquín Vargas Rodríguez	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: BY25007973	
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-136969	
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 20641705	
Nombre: Esneider Rafael Torres Suarez	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-90991	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

BITACORA DE OBRA

ASOSUPRO

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
YOPAL CASANARE	12	6	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003
CONTRATO INTERVENTORIA N°	019 de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.		
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	-	-	-	El día 12 de junio de 2026, el clima reportado es el siguiente:Mañana y tarde soleado.No se presentaron lluvias.
TORMENTA	-	-	-	
LLUVIOSO	-	-	-	
SOLEADO	x	x	-	
Tiempo de standby por lluvias		0 HORAS		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	-	-			-	N/A
OFICIAL	-	-			-	N/A
OPERARIO	-	-			-	N/A
AYUDANTE	-	-			-	N/A
CELADOR	-	-			-	N/A
TOPÓGRAFO	1	SI			-	N/A
CADENERO	1	SI			-	N/A
OTRO	-	-			-	N/A

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA

OBSERVACIONES GENERALES

Se efectuó seguimiento a las solicitudes radicadas ante las empresas prestadoras de servicios públicos y se continuó con el análisis de los planos del proyecto, identificando preliminarmente los sectores donde se requerirá mayor precisión en las actividades de levantamiento topográfico una vez se disponga de la cartografía oficial.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Joaquín Vargas Rodríguez	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: BY25007973	
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-136969	
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 20641705	
Nombre: Esneider Rafael Torres Suarez	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-90991	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

BITACORA DE OBRA

ASOSUPRO

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
YOPAL CASANARE	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	13	6	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003
CONTRATO INTERVENTORIA N°	019 de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.		
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	-	-	-	El día 13 de junio de 2026, el clima reportado es el siguiente:Mañana y tarde soleado.No se presentaron lluvias.
TORMENTA	-	-	-	
LLUVIOSO	-	-	-	
SOLEADO	x	x	-	
Tiempo de standby por lluvias		0 HORAS		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	-	-			-	N/A
OFICIAL	-	-			-	N/A
OPERARIO	-	-			-	N/A
AYUDANTE	-	-			-	N/A
CELADOR	-	-			-	N/A
TOPÓGRAFO	-	-			-	N/A
CADENERO	-	-			-	N/A
OTRO	-	-			-	N/A

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA

OBSERVACIONES GENERALES

Durante la jornada se adelantaron actividades administrativas y de gestión documental requeridas para el desarrollo del proyecto.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Joaquín Vargas Rodríguez	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: BY25007973	
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-136969	
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 20641705	
Nombre: Esneider Rafael Torres Suarez	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-90991	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

BITACORA DE OBRA

ASOSUPRO

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
YOPAL CASANARE	14	6	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003
CONTRATO INTERVENTORIA N°	019 de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.		
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	-	-	-	No se ejecutaron actividades.
TORMENTA	-	-	-	
LLUVIOSO	-	-	-	
SOLEADO	-	-	-	
Tiempo de standby por lluvias	0 HORAS			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	-	-			-	N/A
OFICIAL	-	-			-	N/A
OPERARIO	-	-			-	N/A
AYUDANTE	-	-			-	N/A
CELADOR	-	-			-	N/A
TOPÓGRAFO	-	-			-	N/A
CADENERO	-	-			-	N/A
OTRO	-	-			-	N/A

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA

OBSERVACIONES GENERALES

No se ejcutaron actividades laborales.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Joaquín Vargas Rodríguez	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: BY25007973	
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-136969	
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 20641705	
Nombre: Esneider Rafael Torres Suarez	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-90991	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

BITACORA DE OBRA

ASOSUPRO

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
YOPAL CASANARE	15	6	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003
CONTRATO INTERVENTORIA N°	019 de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.		
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	-	-	-	No se ejecutaron actividades.
TORMENTA	-	-	-	
LLUVIOSO	-	-	-	
SOLEADO	-	-	-	
Tiempo de standby por lluvias	0 HORAS			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	-	-			-	N/A
OFICIAL	-	-			-	N/A
OPERARIO	-	-			-	N/A
AYUDANTE	-	-			-	N/A
CELADOR	-	-			-	N/A
TOPÓGRAFO	-	-			-	N/A
CADENERO	-	-			-	N/A
OTRO	-	-			-	N/A

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA

OBSERVACIONES GENERALES

No se realizaron actividades operativas ni administrativas durante la jornada, debido a que correspondía a un día festivo.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Joaquín Vargas Rodríguez	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: BY25007973	
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-136969	
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 20641705	
Nombre: Esneider Rafael Torres Suarez	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-90991	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

BITACORA DE OBRA

ASOSUPRO

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
YOPAL CASANARE	16	6	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003
CONTRATO INTERVENTORIA N°	019 de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.		
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	-	-	-	El día 16 de junio de 2026, el clima reportado es el siguiente:Mañana y tarde soleado.No se presentaron lluvias.
TORMENTA	-	-	-	
LLUVIOSO	-	-	-	
SOLEADO	x	x	-	
Tiempo de standby por lluvias		0 HORAS		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	-	-			-	N/A
OFICIAL	-	-			-	N/A
OPERARIO	-	-			-	N/A
AYUDANTE	-	-			-	N/A
CELADOR	-	-			-	N/A
TOPÓGRAFO	1	-			-	N/A
CADENERO	1	-			-	N/A
OTRO	-	-			-	N/A

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA

OBSERVACIONES GENERALES

Se realizaron nuevas verificaciones en campo sobre el corredor del proyecto, recopilando información de referencia que permitiera preparar las actividades topográficas posteriores. Asimismo, se continuó con el seguimiento a las solicitudes realizadas ante las empresas de servicios públicos y con la gestión de adquisición de postes y luminarias.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Joaquín Vargas Rodríguez	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: BY25007973	
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-136969	
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 20641705	
Nombre: Esneider Rafael Torres Suarez	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-90991	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

BITACORA DE OBRA

ASOSUPRO

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
YOPAL CASANARE	17	6	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003
CONTRATO INTERVENTORIA N°	019 de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.		
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	-	-	-	El día 17de junio de 2026, el clima reportado es el siguiente:Mañana y tarde soleado.No se presentaron lluvias.
TORMENTA	-	-	-	
LLUVIOSO	-	-	-	
SOLEADO	x	x	-	
Tiempo de standby por lluvias		0 HORAS		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	-	-			-	N/A
OFICIAL	-	-			-	N/A
OPERARIO	-	-			-	N/A
AYUDANTE	-	-			-	N/A
CELADOR	-	-			-	N/A
TOPÓGRAFO	1	SI			-	N/A
CADENERO	1	SI			-	N/A
OTRO	-	-			-	N/A

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA

OBSERVACIONES GENERALES

Se efectuó acercamiento al Departamento de Planeación Municipal con el propósito de solicitar la planimetría correspondiente al tramo comprendido entre el kilómetro 6 y el kilómetro 7+500, considerando que dicho sector corresponde a una vía destapada en la cual no es posible identificar claramente el eje vial para la adecuada ubicación de los postes proyectados. A la fecha se encuentra pendiente la respuesta por parte de la entidad. Paralelamente, se continuó con las actividades preparatorias para el levantamiento topográfico.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Joaquín Vargas Rodríguez	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: BY25007973	
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-136969	
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 20641705	
Nombre: Esneider Rafael Torres Suarez	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-90991	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

BITACORA DE OBRA

ASOSUPRO

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
YOPAL CASANARE	18	6	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003
CONTRATO INTERVENTORIA N°	019 de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.		
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	-	-	-	El día 18 de junio de 2026, el clima reportado es el siguiente:Mañana y tarde soleado.No se presentaron lluvias.
TORMENTA	-	-	-	
LLUVIOSO	-	-	-	
SOLEADO	x	x	-	
Tiempo de standby por lluvias		0 HORAS		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	-	-			-	N/A
OFICIAL	-	-			-	N/A
OPERARIO	-	-			-	N/A
AYUDANTE	-	-			-	N/A
CELADOR	-	-			-	N/A
TOPÓGRAFO	1	SI			-	N/A
CADENERO	1	SI			-	N/A
OTRO	-	-			-	N/A

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA

OBSERVACIONES GENERALES

Durante la jornada se recibieron las respuestas por parte de ENERCA S.A. E.S.P. y Cusianagas, obteniendo la cartografía de las redes de servicios públicos presentes en el área de intervención. Con base en dicha información se inició el análisis de posibles interferencias y se dio comienzo a las actividades topográficas para la definición de la ubicación de los postes conforme a las condiciones reales del terreno.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Joaquín Vargas Rodríguez	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: BY25007973	
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-136969	
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 20641705	
Nombre: Esneider Rafael Torres Suarez	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-90991	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
YOPAL CASANARE	19	6	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003
CONTRATO INTERVENTORIA N°	019 de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.		
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	-	-	-	El día 19 de junio de 2026, el clima reportado es el siguiente:Mañana y tarde soleado.No se presentaron lluvias.
TORMENTA	-	-	-	
LLUVIOSO	-	-	-	
SOLEADO	x	x	-	
Tiempo de standby por lluvias		0 HORAS		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	-	-			-	N/A
OFICIAL	-	-			-	N/A
OPERARIO	-	-			-	N/A
AYUDANTE	-	-			-	N/A
CELADOR	-	-			-	N/A
TOPÓGRAFO	1	SI			-	N/A
CADENERO	1	SI			-	N/A
OTRO	-	-			-	N/A

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA
1,01 Replanteo de obra	Und	Levantamiento topográfico	SI

OBSERVACIONES GENERALES

Se continuó con las actividades de levantamiento topográfico, realizando la identificación de puntos de referencia, verificación de límites del área de intervención y toma de información del terreno. Las mediciones obtenidas fueron contrastadas con los diseños del proyecto y con la cartografía suministrada por las empresas de servicios públicos para validar la ubicación preliminar de las estructuras.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Joaquín Vargas Rodríguez	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: BY25007973	
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-136969	
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 20641705	
Nombre: Esneider Rafael Torres Suarez	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-90991	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

BITACORA DE OBRA

ASOSUPRO

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
YOPAL CASANARE	20	6	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003
CONTRATO INTERVENTORIA N°	019 de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.		
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	-	-	-	El día 20 de junio de 2026, el clima reportado es el siguiente:Mañana y tarde soleado.No se presentaron lluvias.
TORMENTA	-	-	-	
LLUVIOSO	-	-	-	
SOLEADO	x	x	-	
Tiempo de standby por lluvias		0 HORAS		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	-	-			-	N/A
OFICIAL	-	-			-	N/A
OPERARIO	-	-			-	N/A
AYUDANTE	-	-			-	N/A
CELADOR	-	-			-	N/A
TOPÓGRAFO	-	-			-	N/A
CADENERO	-	-			-	N/A
OTRO	-	-			-	N/A

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA

OBSERVACIONES GENERALES

No se ejcutaron actividades laborales.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Joaquín Vargas Rodríguez	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: BY25007973	
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-136969	
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 20641705	
Nombre: Esneider Rafael Torres Suarez	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-90991	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

BITACORA DE OBRA

ASOSUPRO

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
YOPAL CASANARE	21	6	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003
CONTRATO INTERVENTORIA N°	019 de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.		
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	-	-	-	El día 21 de junio de 2026, el clima reportado es el siguiente:Mañana y tarde soleado.No se presentaron lluvias.
TORMENTA	-	-	-	
LLUVIOSO	-	-	-	
SOLEADO	x	x	-	
Tiempo de standby por lluvias		0 HORAS		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	-	-	N/A	N/A	-	N/A
OFICIAL	-	-	N/A	N/A	-	N/A
OPERARIO	-	-	N/A	N/A	-	N/A
AYUDANTE	-	-	N/A	N/A	-	N/A
CELADOR	-	-	N/A	N/A	-	N/A
TOPÓGRAFO	-	-	N/A	N/A	-	N/A
CADENERO	-	-	N/A	N/A	-	N/A
OTRO	-	-	N/A	N/A	-	N/A

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA
1,01 Replanteo de obra	Und	Levantamiento topográfico	SI

OBSERVACIONES GENERALES

Se avanzó en la toma de datos topográficos sobre el corredor del proyecto, verificando alineamientos, distancias y condiciones del terreno para la futura implantación de los postes. Se continuó evaluando posibles interferencias con la infraestructura existente y se mantuvo el seguimiento a la solicitud de planimetría presentada ante el Departamento de Planeación Municipal.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Joaquín Vargas Rodríguez	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: BY25007973	
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-136969	
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 20641705	
Nombre: Esneider Rafael Torres Suarez	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-90991	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

BITACORA DE OBRA

ASOSUPRO

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
YOPAL CASANARE	22	6	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003
CONTRATO INTERVENTORIA N°	019 de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.		
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	-	-	-	El día 22 de junio de 2026, el clima reportado es el siguiente:Mañana y tarde soleado.No se presentaron lluvias.
TORMENTA	-	-	-	
LLUVIOSO	-	-	-	
SOLEADO	x	x	-	
Tiempo de standby por lluvias		0 HORAS		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	-	-			-	N/A
OFICIAL	-	-			-	N/A
OPERARIO	-	-			-	N/A
AYUDANTE	-	-			-	N/A
CELADOR	-	-			-	N/A
TOPÓGRAFO	1	SI			-	N/A
CADENERO	1	SI			-	N/A
OTRO	-	-			-	N/A

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA
1,01 Replanteo de obra	Und	Levantamiento topográfico	SI

OBSERVACIONES GENERALES

Se avanzó en la toma de datos topográficos sobre el corredor del proyecto, verificando alineamientos, distancias y condiciones del terreno para la futura implantación de los postes. Se continuó evaluando posibles interferencias con la infraestructura existente y se mantuvo el seguimiento a la solicitud de planimetría presentada ante el Departamento de Planeación Municipal.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Joaquín Vargas Rodríguez	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: BY25007973	Joaquin Vargas R.
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-136969	
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 20641705	
Nombre: Esneider Rafael Torres Suarez	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-90991	Esneider Torres

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

BITACORA DE OBRA

ASOSUPRO

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
YOPAL CASANARE	23	6	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003
CONTRATO INTERVENTORIA N°	019 de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.		
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	-	-	-	El día 23 de junio de 2026, el clima reportado es el siguiente:Mañana y tarde soleado.No se presentaron lluvias.
TORMENTA	-	-	-	
LLUVIOSO	-	-	-	
SOLEADO	x	x	-	
Tiempo de standby por lluvias		0 HORAS		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	-	-			-	N/A
OFICIAL	-	-			-	N/A
OPERARIO	-	-			-	N/A
AYUDANTE	-	-			-	N/A
CELADOR	-	-			-	N/A
TOPÓGRAFO	1	SI			-	N/A
CADENERO	1	SI			-	N/A
OTRO	-	-			-	N/A

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA
1,01 Replanteo de obra	Und	Levantamiento topográfico	SI

OBSERVACIONES GENERALES

Se prosiguió con el levantamiento topográfico en los diferentes sectores del proyecto, realizando verificaciones de campo y ajustes a la ubicación preliminar de algunas estructuras de acuerdo con las condiciones encontradas durante la inspección técnica. Paralelamente, se continuó con la gestión administrativa para la adquisición de postes y luminarias.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Joaquín Vargas Rodríguez	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: BY25007973	Joaquin Vargas R.
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-136969	
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 20641705	
Nombre: Esneider Rafael Torres Suarez	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-90991	Esneider Torres

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

BITACORA DE OBRA

ASOSUPRO

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
YOPAL CASANARE	24	6	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003
CONTRATO INTERVENTORIA N°	019 de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.		
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	-	-	-	El día 24 de junio de 2026, el clima reportado es el siguiente:Mañana y tarde soleado.No se presentaron lluvias.
TORMENTA	-	-	-	
LLUVIOSO	-	-	-	
SOLEADO	x	x	-	
Tiempo de standby por lluvias		0 HORAS		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	-	-			-	N/A
OFICIAL	-	-			-	N/A
OPERARIO	-	-			-	N/A
AYUDANTE	-	-			-	N/A
CELADOR	-	-			-	N/A
TOPÓGRAFO	1	SI			-	N/A
CADENERO	1	SI			-	N/A
OTRO	-	-			-	N/A

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA
1,01 Replanteo de obra	Und	Levantamiento topográfico	SI

OBSERVACIONES GENERALES

Se dio continuidad a las actividades topográficas mediante la verificación de puntos de control, levantamiento de información complementaria y revisión de los sectores donde las condiciones del terreno requieren un análisis más detallado para la correcta implantación de las estructuras. Continúa pendiente la respuesta del Departamento de Planeación respecto a la planimetría solicitada.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Joaquín Vargas Rodríguez	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: BY25007973	
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-136969	
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 20641705	
Nombre: Esneider Rafael Torres Suarez	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-90991	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

BITACORA DE OBRA

ASOSUPRO

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
YOPAL CASANARE	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	25	6	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003
CONTRATO INTERVENTORIA N°	019 de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.		
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	-	-	-	El día 25 de junio de 2026, el clima reportado es el siguiente:Mañana y tarde soleado.No se presentaron lluvias.
TORMENTA	-	-	-	
LLUVIOSO	-	-	-	
SOLEADO	x	x	-	
Tiempo de standby por lluvias		0 HORAS		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	-	-			-	N/A
OFICIAL	-	-			-	N/A
OPERARIO	-	-			-	N/A
AYUDANTE	-	-			-	N/A
CELADOR	-	-			-	N/A
TOPÓGRAFO	1	SI			-	N/A
CADENERO	1	SI			-	N/A
OTRO	-	-			-	N/A

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA
1,01 Replanteo de obra	Und	Levantamiento topográfico	SI

OBSERVACIONES GENERALES

Se continuó con el procesamiento y validación de la información obtenida durante el levantamiento topográfico, realizando verificaciones adicionales en campo para asegurar la correspondencia entre las condiciones reales del terreno y los diseños del proyecto. Paralelamente, se efectuó seguimiento al proceso de adquisición de los principales suministros del proyecto con el fin de mantener la programación establecida.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Joaquín Vargas Rodríguez	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: BY25007973	
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-136969	
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 20641705	
Nombre: Esneider Rafael Torres Suarez	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-90991	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

BITACORA DE OBRA

ASOSUPRO

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
YOPAL CASANARE	26	6	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003
CONTRATO INTERVENTORIA N°	019 de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.		
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	-	-	-	El día 26 de junio de 2026, el clima reportado es el siguiente:Mañana y tarde soleado.No se presentaron lluvias.
TORMENTA	-	-	-	
LLUVIOSO	-	-	-	
SOLEADO	x	x	-	
Tiempo de standby por lluvias		0 HORAS		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	-	-			-	N/A
OFICIAL	-	-			-	N/A
OPERARIO	-	-			-	N/A
AYUDANTE	-	-			-	N/A
CELADOR	-	-			-	N/A
TOPÓGRAFO	1	SI			-	N/A
CADENERO	1	SI			-	N/A
OTRO	-	-			-	N/A

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA
1,01 Replanteo de obra	Und	Levantamiento topográfico	SI

OBSERVACIONES GENERALES

Se dio continuidad a las actividades de replanteo mediante la ejecución de nuevos trabajos topográficos y la verificación de la ubicación proyectada de las estructuras en los diferentes sectores del corredor vial. Asimismo, se continúa a la espera de la información solicitada al Departamento de Planeación Municipal para complementar la definición del trazado en el tramo comprendido entre el kilómetro 6 y el kilómetro 7+500. A la fecha, la actividad de replanteo permanece en ejecución y se continúa recopilando y validando la información técnica necesaria para definir la ubicación definitiva de los postes, garantizando la correcta implantación del proyecto y evitando interferencias con la infraestructura existente.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Joaquín Vargas Rodríguez	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: BY25007973	
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-136969	
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 20641705	
Nombre: Esneider Rafael Torres Suarez	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-90991	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

BITACORA DE OBRA

ASOSUPRO

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
YOPAL CASANARE	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	27	6	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003
CONTRATO INTERVENTORIA N°	019 de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.		
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	-	-	-	El día 27de junio de 2026, el clima reportado es el siguiente:Mañana y tarde soleado.No se presentaron lluvias.
TORMENTA	-	-	-	
LLUVIOSO	-	-	-	
SOLEADO	x	x	-	
Tiempo de standby por lluvias		0 HORAS		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	-	-			-	N/A
OFICIAL	-	-			-	N/A
OPERARIO	-	-			-	N/A
AYUDANTE	-	-			-	N/A
CELADOR	-	-			-	N/A
TOPÓGRAFO	1	SI			-	N/A
CADENERO	1	SI			-	N/A
OTRO	-	-			-	N/A

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA

OBSERVACIONES GENERALES

Durante la jornada se adelantaron actividades administrativas y de gestión documental requeridas para el desarrollo del proyecto.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Joaquín Vargas Rodríguez	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: BY25007973	
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-136969	
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 20641705	
Nombre: Esneider Rafael Torres Suarez	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-90991	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

BITACORA DE OBRA

ASOSUPRO

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
YOPAL CASANARE	28	6	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	019 de 2026	**PROYECTO N°**	**2025850010003**
CONTRATO INTERVENTORIA N°	019 de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.		
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	-	-	-	No se ejecutaron actividades.
TORMENTA	-	-	-	
LLUVIOSO	-	-	-	
SOLEADO	-	-	-	
Tiempo de standby por lluvias		0 HORAS		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	-	-			-	N/A
OFICIAL	-	-			-	N/A
OPERARIO	-	-			-	N/A
AYUDANTE	-	-			-	N/A
CELADOR	-	-			-	N/A
TOPÓGRAFO	-	-			-	N/A
CADENERO	-	-			-	N/A
OTRO	-	-			-	N/A

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA

OBSERVACIONES GENERALES

No se ejcutaron actividades laborales.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Joaquín Vargas Rodríguez	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: BY25007973	Joaquin Vargas R.
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-136969	
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 20641705	
Nombre: Esneider Rafael Torres Suarez	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-90991	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

BITACORA DE OBRA

ASOSUPRO

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
YOPAL CASANARE	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	29	6	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003
CONTRATO INTERVENTORIA N°	019 de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.		
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	-	-	-	No se ejecutaron actividades.
TORMENTA	-	-	-	
LLUVIOSO	-	-	-	
SOLEADO	-	-	-	
Tiempo de standby por lluvias	0 HORAS			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	-	-			-	N/A
OFICIAL	-	-			-	N/A
OPERARIO	-	-			-	N/A
AYUDANTE	-	-			-	N/A
CELADOR	-	-			-	N/A
TOPÓGRAFO	-	-			-	N/A
CADENERO	-	-			-	N/A
OTRO	-	-			-	N/A

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA

OBSERVACIONES GENERALES

No se realizaron actividades operativas ni administrativas durante la jornada, debido a que correspondía a un día festivo.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Joaquín Vargas Rodríguez	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: BY25007973	
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-136969	
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 20641705	
Nombre: Esneider Rafael Torres Suarez	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-90991	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

BITACORA DE OBRA

ASOSUPRO

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
YOPAL CASANARE	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	30	6	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003
CONTRATO INTERVENTORIA N°	019 de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.		
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	-	-	-	El día 30 de junio de 2026, el clima reportado es el siguiente:Mañana y tarde soleado.No se presentaron lluvias.
TORMENTA	-	-	-	
LLUVIOSO	-	-	-	
SOLEADO	X	X	-	
Tiempo de standby por lluvias		0 HORAS		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	-	-			-	N/A
OFICIAL	-	-			-	N/A
OPERARIO	-	-			-	N/A
AYUDANTE	-	-			-	N/A
CELADOR	-	-			-	N/A
TOPÓGRAFO	1	SI			-	N/A
CADENERO	1	SI			-	N/A
OTRO	-	-			-	N/A

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA
1,01 Replanteo de obra	Und	Levantamiento topográfico	SI

OBSERVACIONES GENERALES

Se dio continuidad a las actividades de replanteo mediante la ejecución de nuevos trabajos topográficos y la verificación de la ubicación proyectada de las estructuras en los diferentes sectores del corredor vial. Asimismo, se continúa a la espera de la información solicitada al Departamento de Planeación Municipal para complementar la definición del trazado en el tramo comprendido entre el kilómetro 6 y el kilómetro 7+500. A la fecha, la actividad de replanteo se encuentra en terminacion y se continúa recopilando y validando la información técnica necesaria para definir la ubicación definitiva de los postes, garantizando la correcta implantación del proyecto y evitando interferencias con la infraestructura existente.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Joaquín Vargas Rodríguez	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: BY25007973	
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-136969	
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 20641705	
Nombre: Esneider Rafael Torres Suarez	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-90991	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	



ENERGÍA INTEGRAL ANDINA.

www.eia.com.co

INFORME DE INTERVENTORÍA

INFORME DE INTERVENTORÍA A OBRA

INFORME DE INTERVENTORÍA

INFORME MENSUAL No. 01

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

Periodo de 09/06/26 a 30/06/26
Fecha de Presentación: 01/09/26

INFORMACIÓN BASICA CONTRATO DE OBRA	
OBJETO CONTRATO:	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.
VALOR DEL CONTRATO:	CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($5.369.899.707,00)
VALOR ACTUALIZADO:	N/A
OBJETO PROYECTO:	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.
VALOR DEL PROYECTO:	SEIS MIL SETENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS ($6.073.050.626)
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	SEIS MIL SETENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS ($6.073.050.626)
CONTRATISTA:	ENERGÍA INTEGRAL ANDINA S.A R.L. JOSUÉ NEFTALÍ VALERO CAMARGO NIT: 860.533.206-8
CORREO ELECTRONICO:	carlos.naranjo@eiasa.com.co

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIACIÓN:	09/06/26
PRORROGA:	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
TIEMPO:	N/A
REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	08/03/27
9 Meses	Días
TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO	
FECHA DE INICIACIÓN:	09/06/26
PRORROGA:	N/A
SUSPENSIÓN:	N/A
TIEMPO:	N/A

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	08/03/27
9 Meses	Días

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	019 de 2026
INTERVENTORÍA:	**TRIPLE O S.A.S.**
OBJETO CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.
OBJETO PROYECTO:	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.
CORREO ELECTRONICO:	tripleosas@hotmail.com

CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
NOMBRE SUPERVISOR	LINA MELISA ROJAS VALVUENA
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	MC-006-2026
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN	JEFFERSON PARRA CAPERA

LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO

MUNICIPIO:	**YOPAL**	**VEREDA:**	**LA PEDRERA**
CORREGIMIENTO:	**N/A**	**BARRIO:**	**LA PEDRERA**
COMUNA:	**N/A**		
COORDENADAS:	**INICIO 5.317450; -72.383000 – FINAL 5.309039; -72.387160**		

A. INFORME TECNICO

1. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE FISICO DE OBRA

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

Avance físico

MENSUAL	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
PERÍODO1 (09/06/2026-30/06/2026)	0,518%	$ 27.802.221,81	0,518 %	$ 27.802.221,81	0,519%	$ 27.887.755,43	0,519%	$ 27.887.755,43
PERIODO 2 (01/07/2026-31/07/2026)	0,556%	$ 31.491.421,52	1,074%	$ 59.293.643,33	%	$	%	$
PERIODO 3 (01/08/2026-31/08/2026)	15,908%	$ 854.269.930,83	16,982%	$ 913.563.574,17	%	$	%	$
PERIODO 4 (01/09/2026-30/09/2026)	16,763%	$ 900.136.543,85	33,745%	$ 1.813.700.118,02	%	$	%	$
PERIODO 5 (01/10/2026-31/10/2026)	17,043%	$ 915.190.990,83	50,788%	$ 2.728.891.108,84	%	$	%	$
PERIODO 6 (01/11/2026-30/11/2026)	16,827%	$ 903.604.725,49	67,615%	$ 3.632.495.834,34	%	$	%	$
PERIODO 7 (01/12/2026-31/12/2026)	16,296%	$ 875.061.105,16	83,911%	$ 4.507.556.939,50	%	$	%	$
PERIODO 8 (01/01/2027-31/01/2027)	15,800%	$ 848.464.368,11	99,711%	$ 5.356.021.307,61	%	$	%	$
PERIODO 9 (01/02/2027-28/02/2027)	0,210%	$ 11.282.555,03	99,921%	$ 5.367.303.862,64	%	$	%	$
PERIODO 10 (01/03/2027-08/03/2027)	0,079%	$ 2.595.844,36	100,00%	$ 5.369.899.707,00	%	$	%	$

Se aclara que aunque las condiciones contractuales establecen un periodo de nueve (9) meses para la ejecución, se informan diez (10) periodos ya que la trazabilidad del informe 01 comprenden del 09 de junio al 30 de junio, con cortes a final de cada mes. Lo anteriormente dicho no afecta el cumplimiento total de la obra ni el plazo contractual establecido.

Actualmente el contrato se encuentra en la etapa de preliminares; con el inicio a través de la firma del acta de inicio, las actividades del contratista se han enfocado en la actividad de replanteo que permitan definir la ubicación de los postes que darán soporte a las luminarias.

Estas actividades conllevan a una primera fase de levantamiento topográfico para realizar la verificación del corredor vial, identificar las condiciones del suelo y sistemas de redes que puedan

afectar la adecuada instalación de los apoyos, además de georreferenciar la ubicación de los postes para la posterior etapa de excavación.


El desarrollo de las actividades ejecutadas por el contratista de obra se ve reflejado en el diligenciamiento de las bitácoras, logrando un control de la ejecución de la obra de manera diaria, sirviendo como soporte a la justificación de avance y posterior cobro.

"IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE"

ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA JUNIO 2026	ACUMULADO CANTIDADES
1.1.1	**REALIZAR PRELIMINARES**			
1,01	Replanteo de obra	425	204	204
1,02	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas del sitio (incluye retiro disposición final)	1.700	0	0
1.1.2	**REALIZAR ALUMBRADO PÚBLICO**			
2,01	Excavación manual en material común del sitio para cimentación de postes de alumbrado público solar (Incluye retiro y disposición final)	459	0	0
2,02	Suministro e Instalación de poste en fibra de vidrio para alumbrado público (12mt 510kgf)	425	0	0
2,03	Cimentación para postes de alumbrado público solar	425	0	0
2,04	Suministro e instalación de luminarias solar ELITE III PRO INI-SL Incluye (Luminaria LED, Panel solar fotovoltaico y batería, soporte para conexiones, brazo metálico galvanizado y collarín anti vandálico)	425	0	0
1.1.4	**REALIZAR CERTIFICACIÓN RETILAP**	1	0	0
1.1.5	**REALIZAR PLAN DE MANEJO AMBIENTAL-PMA**	9	1	1

Lo anterior da un avance de obra del 0.519%.

Grafica Avance Físico

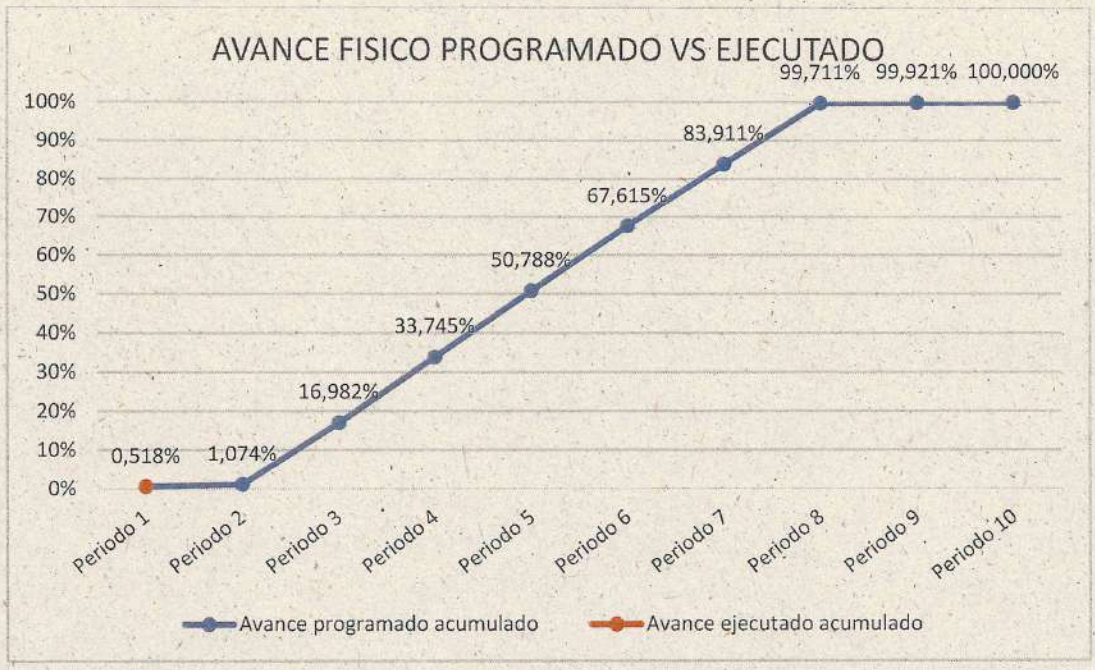

2. GESTIÓN TÉCNICA Y DOCUMENTAL

Se relacionan los oficios y documentos elaborados por la interventoría sobre el desarrollo de la obra, comités realizados, solicitudes, temas varios e informes presentados.

FECHA	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
02/06/2026	N/A	APROBACIÓN VALLA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	TRIPLE O S.A.S.	ENERGÍA INTEGRAL ANDINA
02/06/2026	N/A	VALIDACIÓN DEL PERSONAL	TRIPLE O S.A.S.	ENERGÍA INTEGRAL ANDINA
04/06/2026	N/A	SOLICITUD DE PLANIMETRÍA Y/O INFORMACIÓN TÉCNICA DE REDES EXISTENTES EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN	TRIPLE O S.A.S.	ALCALDÍA MUNICIPAL DE YOPAL.
17/06/2026	N/A	REMISIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS DE CONTRATO DE	TRIPLE O S.A.S.	ASOSUPRO

		INTERVENTORIA 019 DE 2026		

De igual manera se tienen dos comunicados que aunque no corresponden con el periodo registrado, es base que complementa las actividades que se desarrollan posteriormente.

FECHA	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
04/06/2026	N/A	Solicitud de cartografía de red de gas existente, protocolos de contingencia y contactos de atención para proyecto de iluminación solar en La Pedrera	ENERGÍA INTEGRAL ANDINA	CUSIANAGAS S.A.S. E.S.P.
08/06/2026	N/A	Solicitud de cartografía de red de gas existente, protocolos de contingencia y contactos de atención para proyecto de iluminación solar en La Pedrera	ENERGÍA INTEGRAL ANDINA	ENERCA S.A E.S.P.

Comités y mesas de trabajo

Se incluye la reunión del 04 de junio, que aunque no corresponde con el periodo registrado en este informe, es base que complementa las actividades y comunicados que se desarrollan posteriormente.

FECHA	TEMAS TRATADOS	PARTICIPANTES
04-06-2026	• Definir afectaciones prediales o intervención directa sobre predios, • Verificar la existencia de redes eléctricas en sector objeto de intervención. • Verificar la necesidad de información de infraestructura de servicios públicos que pueda generar interferencias con el diseño planteado. Acta de comité No 2	Lina Melisa Rojas Valbuena Supervisor ASOSUPRO Josué Neftali Valero Camargo Representante Legal Energía Integral Andina Sa Luz Neila Diaz Mogollón Representante Legal Proyectos Triple O S.A.S.

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

25-06-2026	Mesa de trabajo para seguimiento al informe de avance de obra y de interventoría. 	Supervisión ASOSUPRO CAROLINA REYES- Interventoría SANDRA HERNÁNDEZ- Contratista EIA

En trámites anteriores al periodo que comprende este informe, fechados el día 04 de junio del 2026, se realizó la solicitud a la administración Municipal de Yopal pidiendo la planimetría, cartografía, levantamientos topográficos, diseños y/o cualquier otra documentación técnica disponible que permita identificar la existencia, ubicación y características de redes de servicios públicos, infraestructura aérea o subterránea y demás elementos que puedan interferir o requerir consideración durante la ejecución de las actividades objeto del proyecto.

En el mismo comunicado se requiere planos proyectados de la vía que actualmente se encuentra sin pavimentar dentro del área de intervención del proyecto, con el fin de conocer los espacios disponibles para la instalación de postes de los sistemas solares fotovoltaicos de iluminación, así como verificar las condiciones geométricas y de ocupación previstas para dicho corredor vial

Se apoya la generación del documento para control de proyecto GESPROY.

3. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MECANISMOS DE SOLUCIÓN PROPUESTOS

Actualmente el contrato se encuentra en la etapa de preliminares; con el inicio a través de la firma del acta de inicio, las actividades del contratista se han enfocado en la actividad de replanteo que permitan definir la ubicación de los postes que darán soporte a las luminarias.

Durante el desarrollo de la pre-topografía se presenta la propuesta de los ajustes paramétricos de los puntos de excavación con los siguientes criterios técnicos y normativos.

Categoria en DIALux	Parámetro de Entrada /	Valor a Configurar en DIALux	Impacto Técnico por Cambio a 30m
Arreglo de Postes	Interdistancia (Separación)	30,00 metros	Parámetro fijo para esta simulación.
Geometría de la Vía	Ancho de la calzada	6,10 metros	Dos carriles de 3,05 m en doble sentido de circulación.
Geometría de la Vía	Retiro del poste (Setback)	1,50 metros	Distancia de seguridad desde el borde de vía al eje del poste.
Arreglo de Postes	Altura de montaje (H)	12,00 metros	Altura del punto de luz (fuente led) sobre el suelo.
Arreglo de Postes	Longitud del brazo	2,00 metros	Sobrevuelo constante de 0,50 m sobre la calzada.
Arreglo de Postes	Inclinación del brazo	10° (Grados)	Ángulo fijo orientado hacia el flujo vehicular.
Arreglo de Postes	Disposición de los postes	Unilateral	Todos los postes ubicados en un solo costado de la vía.
Datos Técnicos Luminaria	Modelo de luminaria	Unilumin 653 Elite PRO 35W	Cargar archivo fotométrico .IES o .LDT de 7350 lm.
Mantenimiento	Factor de mantenimiento (\(F_{m}\))	0,80	Factor de depreciación por suciedad y entorno periurbano.
Perfil del Proyecto	Classification de la vía	M5 / M6	Criterio de comparación para vías terciarias / locales.
Resultados Esperados	Iluminancia promedio (\(E_{prom}\))	≥ 9,00 a 11,00 Lux	Incremento: El nivel de Lux subirá un ~15% frente a la opción de 35m.
Resultados Esperados	Uniformidad general (U_0)	≥ 0,45	Mejora: Se logra una distribución de luz altamente homogénea.
Resultados Esperados	Deslumbramiento (TI)	TI ≤ 10%	Se mantiene muy seguro y confortable para ambos sentidos de tránsito.

Como parte complementaria durante el desarrollo del replanteo se logra la identificación de puntos que pueden afectar de manera directa el normal desarrollo del proyecto:

- Entre el tramo K2+340 al K2+410 se encuentra presencia de arbolado denso que requieren intervención de poda para despejar los conos de incidencia lumínica y garantizar la correcta iluminación de la vía.
- Para el punto K7+150 se encontró un cruce de red subterránea para fibra óptica, se requiere mover el punto para la excavación y dejar una servidumbre de 30cm de distancia hacia los servicios públicos.
- Se encontró con base en la cartografía de los operadores locales, se identificaron las válvulas y los mojones de señalización de los trazados de tubería para gas natural de las empresas Cusianagas y Enerca.
- Durante esta misma etapa, se encontró que la ubicación proyectada para los apoyos No 244, 245 y 246 presentan una interferencia ya que estos puntos al proyectarlos aparecen localizados dentro de áreas privadas; esto debido a que los cerramientos se encuentran al parecer, invadiendo parte de la calzada.

Lo anterior, condiciona la materialización física del diseño inicial, requiriendo un rediseño que permita garantizar las condiciones de iluminación.

4. GESTIÓN TÉCNICA DE LA INTERVENTORIA

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

PERFIL ESPECIALIZADO	GESTIÓN /OBSERVACIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	• Elaboró, antes de iniciar el proyecto, el balance del estado actual de las obras y la revisión documental de todo el expediente del contrato de obra. • Tiene el conocimiento completo y detallado el objeto y alcance del contrato de obra, los anexos técnicos del pliego de condiciones, la propuesta del contratista, del cronograma de ejecución etc. • Efectuó en coordinación con el contratista, la verificación del estado del proyecto, accesos, permisos y demás aspectos necesarios para el inicio y la continuidad de la ejecución tales como el PMT (Plan de Manejo de Tránsito), PMA (Plan de Manejo Ambiental). • Se analizó con el contratista las especificaciones del proyecto, el programa de trabajo, el equipo disponible y el personal a cargo de los trabajos. • Participar en los comités de obra y desarrollo del proyecto. • Realizó la gestión de documentación y presentación ante la entidad para obtener la firma del acta de inicio.
PROFESIONAL AMBIENTAL	• Verificó y avaló el Plan de Manejo Ambiental (PMA) presentado por el contratista de obra, rubro que se reconoce de manera independiente en el presupuesto de obra. • Realizó las observaciones al documento de informe de implementación del plan de manejo ambiental presentado por el contratista. • Realizó la verificación del registro fotográfico y la caracterización del estado inicial de las zonas objeto del desmonte y limpieza, antes de iniciar con las respectivas actividades. • Realizó las medidas iniciales para el manejo de escombros y disposición final de materiales previstas

	por el contratista, y el plan de disposición de desechos conforme a la reglamentación ambiental vigente.
PROFESIONAL FINANCIERO	• Realizó la verificación de la existencia y suficiencia del certificado de disponibilidad presupuestal del contrato de obra (No 0072 del 26/03/2026 por $5.668.246.160) y su correspondencia con el respectivo registro presupuestal. • Revisó la programación financiera del contrato de obra y la proyección del flujo de fondos del proyecto. • Revisó el plan de inversión del anticipo que se aprobó al contratista de obra. • Realizó la verificación de la constitución del patrimonio autónomo irrevocable (fiducia) exigido para el manejo del anticipo, así como el contenido del contrato. • Verificó la formula y el cronograma de amortización del anticipo, conforme a la relación entre el saldo del anticipo y el 90% del valor del contrato. • Confirmó que el contratista de obra se encuentra al día en el pago del sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales.
ABOGADO	• Realizó la verificación del perfeccionamiento del contrato de obra (firma de las partes) y el cumplimiento del requisito de estar al día en aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales. • Verificó la vigencia, suficiencia y correspondencia del tomador de las garantías presentadas por el contratista de obra, validando en particular en caso particular que el NIT y la razón social del asegurado/beneficiario correspondan efectivamente a ASOSUPRO. • Realizó la verificación que no existan investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas en contra de los directivos, personal o representantes que

	deban ser informadas a la entidad. De esta validación el personal asociado al contratista se encuentra debidamente facultado por la ley. • Se encargó de confirmar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato de obra (aprobación de garantías y registro presupuestal), condiciones que habilitan la suscripción del acta de inicio. • Realizó la verificación de la procedencia y autorización de la sociedad fiduciaria para la constitución de patrimonios autónomos, en el marco del manejo del anticipo.
PROFESIONAL SISOMA	• Se realizó la verificación y posterior aval del plan de seguridad y salud en el trabajo del contratista de obra, así como del debido cumplimiento de la entrega de dotación de los elementos de protección personal (EPP) para el personal operativo actual. • Se realizó la verificación de vinculación de todo el personal contratista al sistema al sistema general de seguridad social y el respectivo pago oportuno de aportes y parafiscales. • Se realiza la revisión y aprobación de las condiciones de señalización y las medidas para garantizar el libre tránsito vehicular y peatonal en el sector donde se ejecutarán las actividades iniciales de replanteo. • Revisó y avaló el plan de contingencia elaborado por el contratista para la atención de eventos imprevistos que puedan la seguridad, calidad, costo o plazo del proyecto. Realizó la verificación de equipos técnicos, herramienta menor y mayor y el equipo de topografía necesarios para el levantamiento topográfico de la etapa de replanteo.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA	• Realizó el seguimiento constante a las actividades de levantamiento topográfico y las actividades de replanteo. • Verificó el diligenciamiento de las bitácoras de obra diariamente en los formatos establecidos por la entidad. • Atendió las solicitudes y requerimientos que surgieron de parte del contratista de obra. • Asistió a los comités de obra realizados en el periodo informado. • Apoyó en la elaboración de los informes de interventoría y respuestas.
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	• Revisó continuamente el correo y direccionó al área específica de acuerdo con el tipo de requerimiento. • Enviar los correos o radicar los documentos en las dependencias según lo indique el área. • Mantener de manera organizada el archivo que hace parte del dossier de la interventoría. • Apoyó al residente de interventoría en todo lo concerniente a organización de la información, archivos, impresión de formatos etc. • Realizó la logística para la adecuación del personal de interventoría. • Realizó apoyo en la organización, clasificación y actualización de la documentación administrativa y contractual generada durante el periodo, incluyendo los documentos requeridos para el seguimiento de las obligaciones del contrato.

5. ESTADO DEL TIEMPO

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

Se presenta el calendario de tiempo de acuerdo con el periodo informado que va desde el nueve (9) al treinta (30) de junio del 2026.

Periodo	L	M	M	J	V	S	D
		9	10	11	12	13	14
Del 09 al 30 de junio del 2026		SOL	SOL	SOL	SOL	SOL	SOL
Soleado - SOL	15	16	17	18	19	20	21
Nublado - NUB	SOL	SOL	SOL	SOL	SOL	SOL	SOL
Tormenta - TOR	22	23	24	25	26	27	28
Lluvioso - LL	SOL	SOL	SOL	SOL	SOL	SOL	SOL
	29	30					
	SOL	SOL					
	CONTEO	22					

Frecuencia.

ESTADO	N° DE DIAS
NUBLADO	0
TORMENTA	0
LLUVIOSO	0
SOLEADO	22
TOTAL DÍAS MES	22

OBSERVACIONES:
Desde la firma del acta de inicio, el clima en el área circundante del proyecto ha presentado condiciones favorables que han permitido el normal desarrollo de las actividades preliminares.

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

B. CUMPLIMIENTO DE PLANES Y ESPECIFICACIONES

1. NORMAS TÉCNICAS CITADAS EN EL PROCESO

NORMA	APLICACIÓN	RESULTADO
Norma técnica colombiana NTC 1377	Elaboración y curado de especímenes de concreto para ensayos de laboratorio	Se está a la espera de los resultados de laboratorio.
Noma INVIAS INV E-410-22	Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	Se está a la espera de los resultados de laboratorio.
Reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico - RAS.	El proyecto no contempla la intervención de suministros de agua potable o de saneamiento básico	N/A
Reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE- RETILAP	Diseño de iluminación para vía M5 de acuerdo con resolución RETILAP 40286 del 23 de junio del 2026.	Actualmente el proyecto se encuentra en etapa de replanteo y se está a la espera de los diseños de iluminación para la validación del cumplimiento reglamentario.
Decreto único Reglamentario del sector Ambiental y desarrollo sostenible.	Las actividades para ejecutar son de poda para apertura de cono de luz, sin mayor afectación ambiental al inventario arbóreo.	Actualmente el proyecto se encuentra en etapa de replanteo y no se ha iniciado con las actividades de desmonte y limpieza en zonas no boscosas.
Decreto del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo.	Decreto 1072 del 2015 y resolución 0312 de 2019.	Aprobado
Otras.	N/A	N/A

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Actualmente el contratista de obra ha terminado la pre-topografía, que permitió la identificación de las situaciones presentadas en numeral tres (3) del capítulo A del presente informe. Para la topografía final, se está a la espera del documento y el plano del levantamiento.

3. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO.

El contratista presenta el documento del procedimiento constructivo donde la interventoría realiza una evaluación desde que comprende la evaluación documental del procedimiento constructivo, análisis de ingeniería de cada actividad frente a la normativa técnica colombiana aplicable (NSR-10, RETIE, RETILAP y resolución 4272 de 2021) y procedimientos y fichas técnicas de actividades similares. A continuación se presente el resultado resumido y que da como resultado la aprobación del documento para que sea implementado en la parte constructiva del proyecto.

Actividad	Criterio de ingeniería / referencia técnica	Estado	Sustento
1. Localización de estacas	Precisión topográfica y verificación de interferencias antes de excavar	Cumple	Práctica estándar de replanteo topográfico para proyectos de alumbrado público.
2. Implementación del PMT	Señalización vial temporal previa a la activación del frente de obra	Cumple	Corresponde a la gestión de tránsito exigida por la autoridad competente antes de iniciar labores en vía.
3. Excavación y cimentación (50x50 cm, 1.80 m)	Profundidad de empotramiento adecuada al tipo y altura del poste	Cumple	La profundidad de 1,80 m coincide exactamente con la longitud de empotramiento (H1) reportada por fabricantes de postes en fibra de vidrio de 12 m para cargas de trabajo entre 200 y 540 kgF, según fichas técnicas comerciales consultadas. Se recomienda anexar la ficha técnica del fabricante específico del poste del proyecto.
4. Zapata de nivelación (10 cm, 2500 psi)	Uso de solado de limpieza y nivelación previo a la fundición final	Cumple	Es una práctica constructiva estándar para aislar el poste de la humedad del suelo.
5. Izaje del poste de 12 m (manual)	Adecuación del método de izaje al peso y dimensiones del elemento	Cumple	Los postes en fibra de vidrio de 12 m de esta gama de carga (≈80–150 kg) son reconocidos por los fabricantes como livianos y aptos para manejo manual asistido. Procedimientos de referencia del sector (instalación de postes de fibra de vidrio en redes de distribución) sí contemplan el izaje manual, pero siempre soportado en un plan de izaje documentado con cuerdas guía, radio de operación delimitado y número mínimo de personas. El procedimiento evaluado no detalla estos tres elementos, solo la estabilización con vientos.

6. Relleno con concreto (3000 psi) y curado	Tiempo mínimo de fraguado antes de continuar actividades o retirar soportes	Cumple	Las referencias técnicas de control de calidad del concreto establecen un mínimo de 18 horas antes de retirar formaletas o soportes, y un curado no menor a 7 días para alcanzar una resistencia adecuada (la resistencia de diseño se alcanza hacia los 28 días). El procedimiento no especifica estos tiempos ni un protocolo de toma de cilindros de resistencia.
7. Limpieza del área trabajada	Disposición adecuada de sobrantes y nivelación de la zona intervenida	Cumple	Es coherente con el manejo ambiental básico de un frente de obra vial.
8. Instalación de luminarias (canastilla elevadora)	Elementos de protección contra caídas en trabajo por encima de 2 m	Cumple	La actividad se desarrolla por encima de 2 metros de altura, umbral que activa la Resolución 4272 de 2021 sobre trabajo seguro en alturas, la cual exige arnés de cuerpo completo, línea de vida y permiso de trabajo en alturas expedido por personal certificado. El procedimiento menciona la canastilla, pero no estos elementos de forma explícita.
9. Protección de luminaria (IP65/66)	Grado de protección adecuado a las condiciones climáticas de Casanare	Cumple	El índice de protección especificado es consistente con la exposición a lluvia y humedad de la región.
10. Recolección de escombro	Disposición final en sitio autorizado	Cumple	Coherente con la gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) exigida normativamente.
11. Pruebas de luminarias	Verificación de encendido y niveles de iluminancia	Cumple	Corresponde a la práctica estándar de puesta en marcha de sistemas de alumbrado.
12. Certificación RETIE / RETILAP	Verificación por organismo de inspección acreditado	Cumple	Cumple con el marco normativo eléctrico y de alumbrado público vigente en Colombia.
13. Autonomía del sistema fotovoltaico (44 horas)	Autonomía mínima exigida para luminarias solares	Cumple	El RETILAP (Resolución 40150 de 2024) exige una autonomía mínima de 36 horas para baterías de luminarias solares; especificaciones técnicas de referencia del sector piden un mínimo de 2 días con máximo 12 horas de operación diaria. El valor de 44 horas declarado en el procedimiento supera ambos umbrales de referencia.

14. Coordinación con redes de servicios públicos (gas)	Protocolo específico de excavación segura ante redes identificadas	Cumple	El procedimiento prevé una verificación genérica de interferencias en el replanteo.
15. Articulación con el Plan de Manejo Ambiental	Referencia cruzada a los programas de manejo ambiental aprobados	Cumple	El procedimiento remite a los programas del PMA aprobado.

Con fundamento en el análisis de ingeniería realizado esta interventoría concluye que el Procedimiento Constructivo **SÍ CUMPLE** con las condiciones necesarias para ser implementado en la obra del Contrato No. 019 de 2026.

4. MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

Actualmente el contratista de obra se encuentra en la etapa de replanteo, en esta etapa no se ha realizado actividades de construcción; para las postes y luminarias, el cumplimiento de calidad se toma de acuerdo con el certificado de conformidad de producto tal como se indica en el libro 2 del RETILAP (Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público) resolución 40286 del 23 de junio del 2026.

Para el caso de los postes, al igual que las luminarias los postes en resinas o fibras poliméricas deben demostrar el cumplimiento de calidad a través del certificado de conformidad de producto tal como se indica en el libro 2 del RETILAP (Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público) resolución 40284 del 23 de junio del 2026.

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	NORMA
Información fotométrica de luminarias	IES LM-79, IES LM-78, EN 13032
Medición de características eléctricas Tensión, corriente, potencia, factor de potencia, THDi %.	ES LM-79, IEC 60598-1, UL 1598
Resistencia al impacto mecánico - IK.	IEC 62262, IEC 60068-2-75, UL 1598
Grado de protección IP o clasificación NEMA	IEC 60529, IEC 60598-1, UL 1598, NEMA 250
Verificación del rotulado o prueba de marcación	IEC 60598-1, UL 1598, IEC 60968, IEC 62560, IEC 61167
Vida útil.	Reporte TM-21, IEC 62717
Temperatura de color.	CIE S 025, IES LM-79
Índice de reproducción cromática (CRI).	IES LM-79

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

Postes en resinas o fibras poliméricas	NTC 6275, ANSI-ACMA UP01-18 Y Guía de ingeniería ASCE 104.

5. SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se relaciona la aplicación de la normatividad vigente sobre seguridad industrial, salud ocupacional y señalización.

<table>
<tr><th>FECHA</th><th>ACTIVIDAD SGSST REALIZADA</th><th>OBSERVACIÓN /ACCIÓN</th></tr>
<tr><td></td><td>Afiliación y pagos al sistema integral de seguridad social.</td><td>Se valida que el personal esencial aprobado para el proyecto se encuentre debidamente vinculado a una entidad promotora de salud EPS y su respectiva administradora de riesgos laborales ARL. Sumado a el pago del periodo junio que garantice la seguridad del personal.

La ingeniera Camila Caballero quién realiza las actividades del profesional ambiental para el contratista de obra, se incluye como nuevo personal con inicio de cobertura desde el 01 de junio del 2026. Las revisiones se basan en control de ingreso.

El personal restante es de planta para el contratista de obra, por ende las revisiones se basan en control periódico.

Las actividades de topografía las ejecuta el personal externo conformado por un equipo de dos personas, topógrafo y cadenero (el topógrafo desarrolla actividades netamente administrativas con riesgo ARL uno (1) y el cadenero por estar en campo con riesgo ARL (5)).
<table>
<tr><th>NOMBRE</th><th>CARGO</th><th>EPS</th><th>ARL</th><th>PENSIÓN</th><th>PLANILLA</th></tr>
<tr><td>Lauro Daniel León Garzón</td><td>Director de obra.</td><td>Compensar</td><td>Sura</td><td>Colpensiones</td><td>6026244447 - 6033396031</td></tr>
<tr><td>Joaquín Vargas Rodríguez</td><td>Residente de obra</td><td>Sanitas</td><td>Sura</td><td>Colpensiones</td><td>6026244447</td></tr>
<tr><td>Laura Camila Caballero Roldan</td><td>Ingeniero Ambiental</td><td>Salud Total</td><td>Sura</td><td>Porvenir</td><td>6025159055</td></tr>
<tr><td>Néstor Raúl Canchon Casas</td><td>Tecnólogo Electricista</td><td>Sanitas</td><td>Sura</td><td>Colfondos</td><td>6026244447</td></tr>
<tr><td>Sandra Milena Hernández Esguerra</td><td>Profesional SISOMA</td><td>Famisanar</td><td>Sura</td><td>Colfondos</td><td>6026244447 - 6033253680</td></tr>
<tr><td>Fanny Barrera Gonzales</td><td>Topógrafo</td><td>Sanitas</td><td>Positiva</td><td>Porvenir</td><td>9507392938</td></tr>
<tr><td>Elber Ignacio Gamboa</td><td>Cadenero</td><td>Sanitas</td><td>Positiva</td><td>Colfondos</td><td>9507392938</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>15/06/2026</td><td>Exámenes médicos ocupacionales. -</td><td>Se verifica que el personal asociado al contratista tenga los exámenes médicos de control y de ingreso.</td></tr>
</table>

		<table><tr><th>NOMBRE</th><th>No IDENTIFICACIÓN</th><th>CARGO</th><th>EXAMEN</th><th>ENTIDAD</th><th>ESTADO</th><th>OBSERVACIONES</th></tr><tr><td>Lauro Daniel León Garzón</td><td>74.377.955</td><td>Director de Obra</td><td>Ocupacional Periódico</td><td>Cendiatra</td><td>Apto</td><td>Corrección óptica</td></tr><tr><td>Joaquín Vargas Rodríguez</td><td>87.722.241</td><td>Residente de Obra</td><td>Ocupacional Periódico</td><td>Cendiatra</td><td>Apto</td><td>Actualizar fórmula óptica</td></tr><tr><td>Laura Camila Caballero</td><td>1.070.622.211</td><td>Profesional Ambiental</td><td>Aptitud ocupacional</td><td>Omnisalud</td><td>APTO</td><td>Sin restricciones</td></tr><tr><td>Néstor Raúl Canchón</td><td>80.737.747</td><td>Electricista</td><td>Ocupacional Periódico</td><td>Cendiatra</td><td>Apto</td><td>Sin restricciones</td></tr><tr><td>Sandra Milena Hernández</td><td>20.430.391</td><td>Profesional SISOMA</td><td>Ocupacional Periódico</td><td>EP Salud Ocupacional</td><td>Apto</td><td>Corrección visual</td></tr></table>
16/06/2026	Dotación y elementos de protección personal.	Se verifica que al personal asociado al contratista tenga los elementos de protección personal EPP y, se presenta la trazabilidad de consultas y respuestas entre las partes: Dentro de ese seguimiento se realizaron las siguientes observaciones: 1. La planilla de EPP del profesional Daniel León no se encuentra firmada. Se adjunta planilla de EPP del profesional Daniel León firmada. 2. En los anexos de planillas de EPP no se encuentra el registro de la profesional en SSGT Sandra Hernández. Se adjunta planilla de EPP de la profesional SISOMA Sandra Hernández. 3. En el formato de control de seguridad industrial, indica que el personal cuenta con botas de caucho y de cuero; sin embargo, en la planilla de EPP solo aparece un juego de botas de seguridad. Favor corregir el formato de acuerdo con lo realmente entregado al personal o aclarar en cada acta de recibo de EPP el tipo de bota entregado. Se realiza ajuste en el ITEM mencionado. <table><tr><th>NOMBRE</th><th>No IDENTIFICACIÓN</th><th>CARGO</th><th>NORMA</th><th>DOTACIÓN</th><th>BOTAS SEGURIDAD</th><th>CASCO SEGURIDAD</th><th>GAFAS</th><th>GUANTES VAQUETA</th><th>GUANTES POLIURETANO</th><th>RECIBIDO POR EMPLEADO</th></tr><tr><td>Alberto Manrrique Gomez</td><td>1.074.486.092</td><td>Ayudante de obra</td><td rowspan="5">LEY 9 DEL ART. 122-123 Y CST ART. 230-234</td><td>OK</td><td>OK</td><td>OK</td><td>OK</td><td>OK</td><td>OK</td><td>27/07/2026</td></tr><tr><td>Edwar Santiago Amortegui Rodriguez</td><td>1.071.062.177</td><td>Ayudante de obra</td><td>OK</td><td>OK</td><td>OK</td><td>OK</td><td>OK</td><td>OK</td><td>27/07/2026</td></tr><tr><td>Felix Amortegui Sanchez</td><td>1.070.613.623</td><td>Ayudante de obra</td><td>OK</td><td>OK</td><td>OK</td><td>OK</td><td>OK</td><td>OK</td><td>27/07/2026</td></tr><tr><td>Jhon Andres Barrios Rivera</td><td>1.070.592.353</td><td>Ayudante de obra</td><td>OK</td><td>OK</td><td>OK</td><td>OK</td><td>OK</td><td>OK</td><td>27/07/2026</td></tr><tr><td>Luis Alfredo Barrios Rivera</td><td>1.070.600.122</td><td>Ayudante de obra</td><td>OK</td><td>OK</td><td>OK</td><td>OK</td><td>OK</td><td>OK</td><td>27/07/2026</td></tr></table> El profesional ambiental está por prestación de servicios donde es su responsabilidad el suministro y porte de los elementos de protección personal EPP.
16/06/2026	Seguimiento al control de seguridad industrial.	Se verifica la información suministrada por el contratista, se presenta la trazabilidad de consultas y respuestas entre las partes: Dentro de los anexos del formato CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL está pendiente: * Los registros o planillas firmadas de la charla diaria. Para el período reportado no se cuenta con registros de charlas diarias de seguridad, debido a que no se ejecutaron actividades operativas en el frente

		de obra que requirieran la realización de estas socializaciones previas al inicio de la jornada. No obstante, en el formato **Control de Seguridad Industrial**, ítem **2. Documentación básica legal**, se registró el criterio como **"Cumple"**, en razón a que durante el período se llevó a cabo la **socialización del Plan de Manejo Ambiental (PMA)**, actividad de capacitación aplicable a la etapa de ejecución del proyecto, la cual quedó debidamente soportada mediante el respectivo registro de asistencia. (Anexo en el informe del PMA) En consecuencia, el cumplimiento del ítem corresponde a la ejecución de la capacitación del PMA. * La matriz de riesgos de actividades. Se adjunta F(GI)018 Formato_de_matriz_de_peligros_y_riesgos ASOSUPRO * Procedimientos de trabajo en el cual encuentran identificadas las actividades críticas con sus riesgos y controles. De acuerdo con las actividades contempladas en el Contrato No. 019 de 2026, se ejecutarán tareas críticas que incluyen trabajo en alturas, exposición al riesgo eléctrico y riesgo vial. En atención a lo anterior, me permito adjuntar los procedimientos de trabajo seguro de Energía Integral Andina, los cuales son aplicables a las actividades contempladas en el presente proyecto. Estos procedimientos tienen como propósito garantizar la correcta ejecución de las labores, prevenir la materialización de los riesgos identificados y dar cumplimiento a los lineamientos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): -Procedimiento de Riesgo Eléctrico para Alumbrado público -Procedimiento para uso seguro de escaleras portátiles -Procedimiento de trabajo seguro con elevadores mecanizados -Plan Estratégico de seguridad vial PESV * Plan de emergencia. Se verifica que el contratista cuente con el Plan de Emergencias para el presente proyecto, el cual establece los lineamientos, procedimientos y acciones para la prevención, preparación y respuesta ante posibles situaciones de emergencia que puedan presentarse durante la ejecución de las actividades. Asimismo, se adjuntan los Procedimientos Operativos Normalizados (PON), como herramientas de apoyo para la atención y control oportuno de los diferentes escenarios de emergencia identificados.
30/06/2026	Plan de manejo de tránsito PMT.	Se recibe la solicitud de aprobación del PMT emitida por el contratista de obra. Actualmente se encuentra en proceso de revisión por parte del equipo de interventoría.

6. GESTIÓN SOCIAL

Obra

EMPLEO	CANTIDAD
Total empleos generados:	7
Empleos directos generados:	5
Empleos indirectos generados:	2

Actores por ámbito contextual – Local

Durante la socialización del proyecto a la comunidad se informó la necesidad de personal para obra, sin embargo a la fecha no se ha recibido aplicaciones de parte de la comunidad.

EMPLEO	CANTIDAD
Población Urbana y/o Rural	0
Agrícola	0
Ganadero	0
Escolar	0
Comercial	0
Hoteles	0

7. MANEJO AMBIENTAL

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
Diseño e implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) para el proyecto.	CUMPLE	El contratista elaboró el Plan de Manejo Ambiental (PMA) de conformidad con el alcance del proyecto y la normatividad ambiental aplicable. Durante el período reportado el contratista inició su implementación mediante actividades de planificación, coordinación y seguimiento, en concordancia con la etapa de replanteo del proyecto.
Socialización del PMA al personal profesional especializado aprobado	CUMPLE	Se verificó la actividad ejecutada con el personal profesional vinculado al proyecto. Esta actividad se implementará de manera continua con el personal que se incorpore durante la ejecución de la obra, como parte del proceso de inducción, capacitación y sensibilización en los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

C. INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA DEL PROYECTO DE OBRA

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	TIEMPO (MESES / DIAS)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A

ADICIÓN			
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	VALOR ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICACIÓN			
ACTA N° Y FECHA	VALOR ACTUALIZADO ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A

2. GARANTIAS:

Obra

SEGÚN ACTA DE INICIO 09 DE JUNIO DEL 2026

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	801056816		
ANEXO N°	1	FECHA DE EXPEDICIÓN:	16/06/2026
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	802091981		
ANEXO N°	1		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	17/06/2026		
COMPAÑÍA DE SEGUROS	CONFIANZA- COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.		

GARANTÍAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	09/06/2026	08/09/2027	$ 1.073.979.941.40
Anticipo	09/06/2026	08/09/2027	$ 2.684.949.853.50
Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09/06/2026	08/03/2030	$ 536.989.970.70

Estabilidad de la obra	08/03/2027	08/03/2032	$ 1.073.979.941.40
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	09/06/2026	08/03/2029	$ 1.073.979.941.40
Responsabilidad civil extracontractual	23/04/2026	08/03/2027	$ 700.362.000.00

D. INFORME FINANCIERO

Para el periodo informado no se tienen aprobaciones de pagos, el contratista realiza la gestión para el trámite de desembolso del anticipo del 50% del valor del contrato que asciende a $2.684.949.854, Su manejo exige la constitución de un patrimonio autónomo (fiducia mercantil) a nombre del contrato, cuyo beneficiario es ASOSUPRO de acuerdo con la cláusula 6 del contrato de obra 019 de 2026. El valor del anticipo fue desembolsado hacia la cuenta de la fiducia el día 30 de junio por parte de ASOSUPRO.

Se realiza el análisis al Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos suscrito entre ENERGÍA INTEGRAL ANDINA S.A. (Fideicomitente) y FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. el 25 de mayo de 2026, contra el Contrato de Obra Pública No. 019 de 2026, celebrado entre la ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO (ASOSUPRO) y el mismo Contratista, con el fin de verificar si el contrato fiduciario cumple los requisitos exigidos para el manejo del anticipo.

Requisito exigido por el Contrato de Obra	Verificación en el Contrato de Fiducia	Estado
Constituir patrimonio autónomo irrevocable (Fiducia) para el manejo del anticipo (Cláusula 6; art. 91 Ley 1474/2011 y art. 2.2.1.1.2.4.1 Decreto 1082/2015)	Se constituye un Fideicomiso / Patrimonio Autónomo de administración y pagos con los mismos fundamentos normativos citados en las Consideraciones 5 y 6	Cumple
La fiduciaria debe estar autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos	Fiduciaria Davivienda S.A., sujeta a inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera (declaración Cláusula 3.2)	Cumple
El costo de la comisión fiduciaria debe ser asumido por el Contratista	Cláusula 1.4: comisión a cargo del(los) Fideicomitente(s), quien es el mismo Contratista	Cumple
Todo desembolso del anticipo requiere autorización expresa y escrita del Interventor, conforme al plan de inversión aprobado	Cláusula 2.2: los Giros solo proceden con Orden de Giro aprobada previamente por el INTERVENTOR y conforme al Plan de Inversión del Anticipo	Cumple
El plazo del contrato de fiducia debe extenderse, como mínimo,	Cláusula 1.5: 9 meses, pero "se mantendrá vigente hasta el cumplimiento de su objeto",	Cumple

hasta la utilización total del anticipo.	lo que cubre el requisito si la ejecución se ajusta al plazo de obra.	
Reintegro de rendimientos financieros del anticipo con periodicidad mensual (Cláusula 6, Contrato de Obra)	El encabezado del Contrato de Fiducia fija periodicidad TRIMESTRAL para el giro de rendimientos.	Observación
Informe mensual de gestión del patrimonio autónomo dentro de los primeros 15 días hábiles de cada mes, dirigido a la Entidad, Interventor y Contratista	Cláusula 3.4-11: la Fiduciaria remite informe dentro de los 15 días hábiles siguientes al cierre de mes, al Fideicomitente, INTERVENTOR y Contratante	Cumple
En caso de caducidad o terminación unilateral, la fiduciaria debe reintegrar el saldo del anticipo y sus rendimientos según lo indique la Entidad	Cláusula 3.10, numeral 7: ante siniestro/terminación del Contrato de Obra, la Fiduciaria devuelve los recursos conforme a instrucciones del Contratante	Cumple
Beneficiario final del patrimonio autónomo: la Asociación (según texto literal Cláusula 6, Contrato de Obra)	El Contrato de Fiducia designa como Destinatario de Rendimientos y Excedentes al Sistema General de Regalías (cuenta única dispuesta por el Ministerio de Hacienda), y no directamente a ASOSUPRO.	Observación
El Fideicomitente no debe estar incurso en causal de disolución/liquidación	Energía Integral Andina S.A. se encuentra en un Acuerdo de Reorganización Empresarial vigente ante la Superintendencia de Sociedades hasta el 31/12/2028; el contrato declara que la fiducia no desmejora dicho acuerdo.	Observación

El Contrato prevé pagos parciales mensuales, en pesos colombianos, hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato, calculados sobre cantidades de obra realmente ejecutadas, verificadas físicamente y recibidas a satisfacción por la interventoría, soportadas en Actas de Obra y liquidadas con los precios unitarios y el AIU pactado. El diez por ciento (10%) restante se paga contra la liquidación del Contrato, y en ningún caso el valor de este último pago podrá ser inferior al 10% del valor total.

1. PAGOS REALIZADOS

ACTA No.	EGRESO No.	FECHA	% EJECUCION	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DESCUENTO	VALOR ACUMULADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

TOTALES							

Nota: Se informa que el valor del anticipo fue registrado en las cuentas de la entidad fiduciaria el día 30 de junio del 2026, dando cumplimiento a lo establecido en la cláusula 6 del contrato de obra 019 de 2026.

PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME FINANCIERO: 09/06/2026 AL 30/06/2026

Avance físico ejecutado 0.518 % y avance financiero ejecutado 0%

El avance físico se toma de acuerdo con las cantidades ejecutadas y su valor contractual, tal como se muestra a continuación:


ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	Del 09 al 30 JUNIO
1.1.1	**REALIZAR PRELIMINARES**		**$ 23.628.097,10**
1,01	Replanteo de obra	204,00	$ 23.628.097,10
1,02	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas del sitio (incluye retiro disposición final)	0,00	
1.1.2	**REALIZAR ALUMBRADO PÚBLICO**		$ -
2,01	Excavación manual en material común del sitio para cimentación de postes de alumbrado público solar (Incluye retiro y disposición final)	0,00	
2,02	Suministro e Instalación de poste en fibra de vidrio para alumbrado público (12mt 510kgf)	0,00	
2,03	Cimentación para postes de alumbrado público solar	0,00	
2,04	Suministro e instalación de luminarias solar ELITE III PRO INI-SL Incluye (Luminaria LED, Panel solar fotovoltaico y batería, soporte para conexiones, brazo metálico galvanizado y collarín antivandálico)	0,00	
TOTAL EJECUTADO (AIU INCLUIDO)			$ 23.628.097,10
1.1.4	**REALIZAR CERTIFICACIÓN RETILAP**		$ -
1.1.5	**REALIZAR PLAN DE MANEJO AMBIENTAL-PMA**		$ 4.259.658,33
COSTO AVANCE OBRA			**$ 27.887.755,43**
PORCENTAJE DE AVANCE OBRA			0,519%


CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

E. REGISTRO FOTOGRÁFICO


REGISTRO FOTOGRÁFICO CONDICIONES CONTRACTUALES


ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	Realizar Preliminares	EJECUTADO	%
	Replanteo de Obra	204 unidades	48%

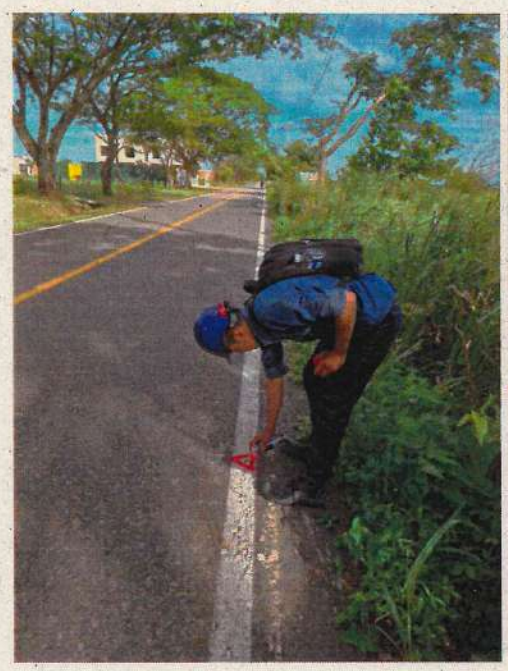


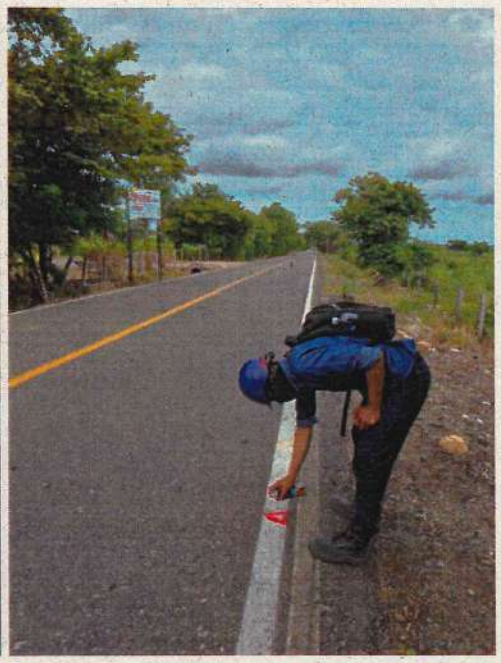


CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

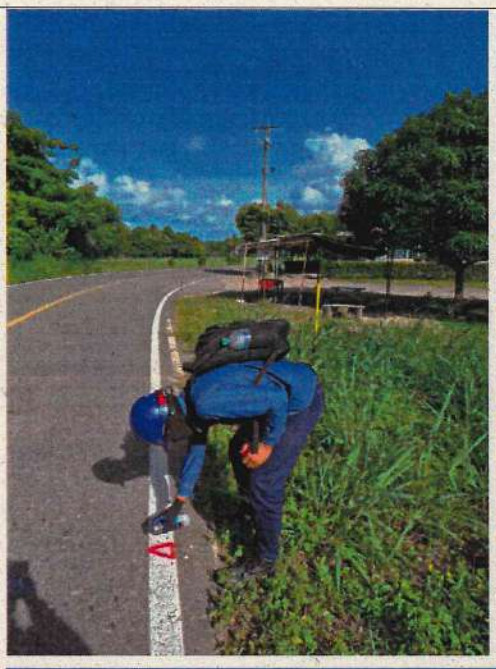


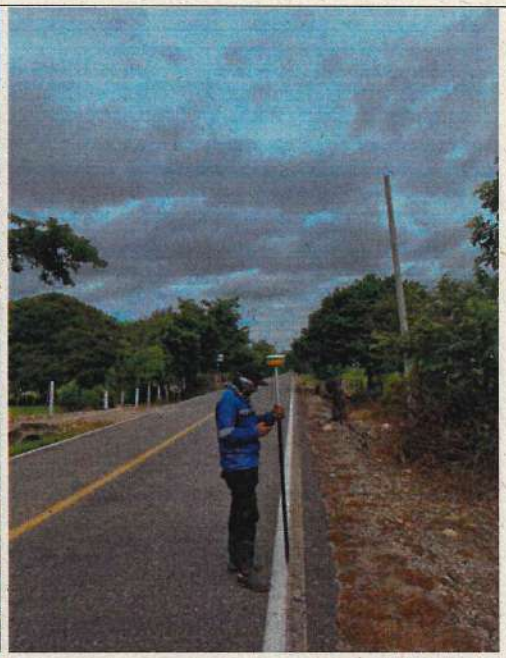


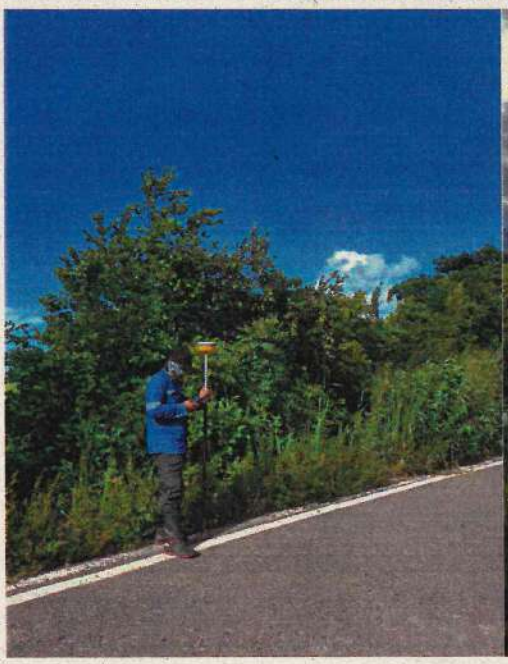

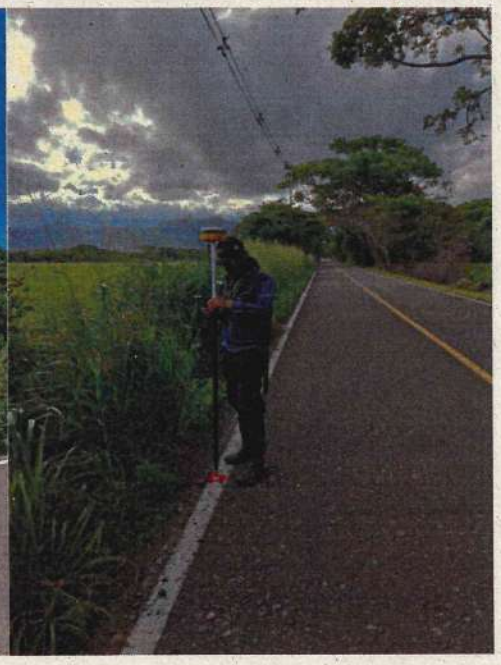



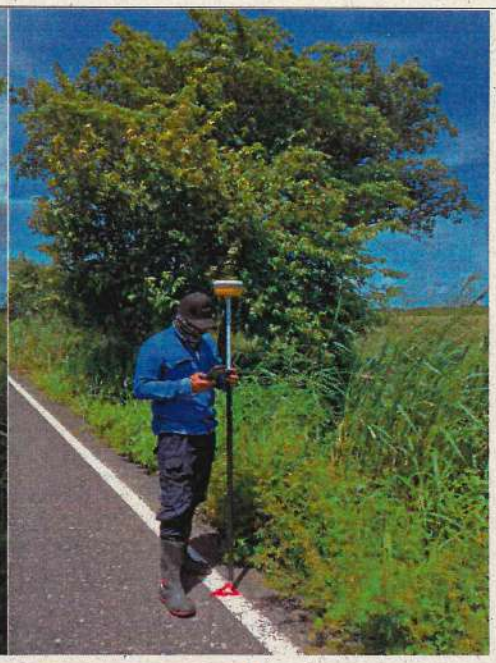

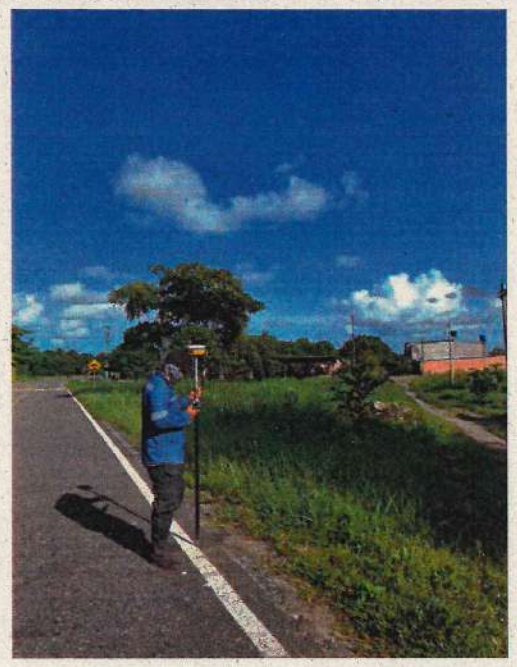



CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

	OBSERVACIONES
	• Se realiza la marcación en piso sobre la vía de manera parcial para la demarcación de los puntos propuestos para la instalación de los postes de acuerdo con la topografía.

ITEMS	ACTIVIDAD
1.1.5	**Realizar Plan de Manejo Ambiental-PMA** **Socialización del PMA con el personal profesional aprobado**



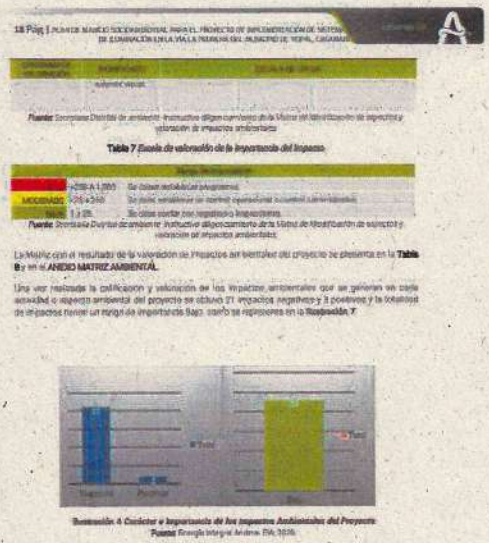

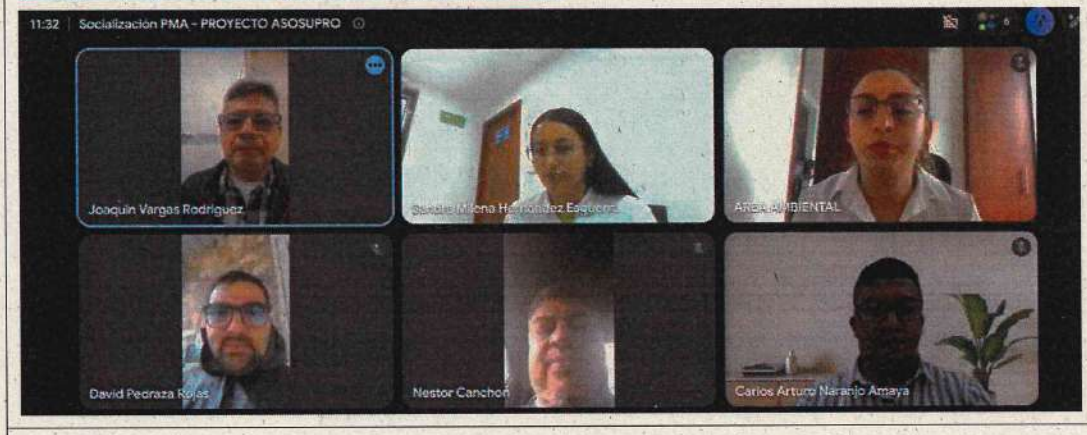

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

	OBSERVACIONES
	El Contratista de obra con su profesional ambiental y de SSGT elaboró el PMA y se socializó con el personal profesional especializado aprobado.

REGISTRO FOTOGRÁFICO ÍTEMS NUEVOS (APROBADOS POR LA INTERVENTORÍA)

Para el periodo en desarrollo no se han realizado aprobación de nuevos ítems.

G. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

El proyecto para IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE. da inicio el día 09 de junio del 2026, tanto para las actividades de interventoría como de obra.

Actualmente el contratista de obra se encuentra desarrollando la fase de replanteo, donde se ha identificado redes de gas adyacentes a la vía por iluminar. Ante esta situación se ha solicitado a la administración de Yopal información de planos, cartografía que permitiera definir el trazado y profundidad para estas redes.

Por otra parte, el contratista de obra requirió directamente a las empresas CUSIANAGAS Y ENERCA con el mismo objeto de conseguir la información técnica necesaria para los trazados de topografía y ubicación de los postes para alumbrado.

En conclusión el proyecto se ha desarrollado de acuerdo con el cronograma y el plan de trabajo, sin que se presenten incumplimientos de parte del contratista.

G. ANEXOS

Al presente informe se anexa la siguiente información:

F-1 PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA
F-2 INFORME EJECUTIVO AVANCE DE TOPOGRAFÍA EIA

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los 01 días del mes de septiembre del 2026.

Firma

MIGUEL ÁNGEL CARO JIMÉNEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: CN205-139465

Firma

BRAYAN JOSE FONTALVO RUA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: AT205-136969

Nota: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se selecciona de la lista desplegable para firma el cargo de Director Operativo de Ejecución, seguimiento y control de proyectos.

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, así mismo las casillas de N° de matrícula profesional deben ser diligenciadas en su totalidad.

Nota: El informe y sus anexos, deben ser cargados a la plataforma para la gestión de archivos SIGA, una vez sea presentado a la entidad.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ANEXO F-1

VERIFICACIÓN POLIZAS CONTRATO DE OBRA

PROYECTOS TRIPLE O S.A.S.
NIT. 901017241-1

SEGUIMIENTO A DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL

1. Actualización de pólizas – Acta de Inicio

La Interventoría realizó la revisión de la documentación correspondiente a la actualización de las pólizas asociadas al Acta de Inicio, verificando su concordancia con la actualización realizada al documento de inicio del contrato y con las condiciones contractuales aplicables.

Una vez efectuada la revisión documental, se evidenció que las pólizas presentadas se encuentran ajustadas a la actualización del Acta de Inicio y cumplen con los requisitos establecidos para tal efecto.

Estado: Conforme.

Se adjuntan soportes entregados por el contratista.

Carrera 54D # 135 - 34
Int. 2 Apto 403
Tel. 313 408 3199
Sfé de Bogotá

CUMPLIMIENTO

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

GARANTÍA ÚNICA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA 801056816
CERTIFICADO GU246984
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO

SUCURSAL: C. ANDINO USUARIO: KDMORA TIPO CERTIFICADO: Endoso FECHA EXPEDICION: DD 16 MM 06 AAAA 2026

TOMADOR/GARANTIZADO	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD:	SAN ANDRES
E-MAIL:	GRACIELA.RODRIGUEZ@EISA.COM.CO	TELÉFONO:	6684343
ASEGURADO:	ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO	C.C. O NIT:	901445387 3
DIRECCIÓN:	CL 32 39 11 BRR barzal alto	CIUDAD: VILLAVICENCIO	TEL. 3108708920
BENEFICIARIO:	ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO	C.C. O NIT:	901445387 3
DIRECCIÓN:	CL 32 39 11 BRR barzal alto	CIUDAD: VILLAVICENCIO	TEL. 3108708920

VIGENCIA		VALOR ASEGURADO EN PESOS		
DESDE DD 23 MM 04 AAAA 2026	HASTA DD 08 MM 03 AAAA 2032	ANTERIOR	ESTA MODIFICACIÓN	NUEVA
		6,443,879,648.40	0.00	6,443,879,648.40

INTERMEDIARIO		COASEGURO				PRIMA		
%PART	NOMBRE	COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRM:	MONEDA	VALORES
100.00	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS SAR LTDA ASESORES DE SEGU					PRIMA NETA	PESOS	
						CARGOS DE EMISIÓN	PESOS	
						IVA	PESOS	
						TOTAL		

AMPAROS	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta	VALOR ASEGURADO ANTERIOR EN PESOS	VALOR ASEGURADO NUEVO EN PESOS	VALOR PRIMA EN PESOS	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE Mínimo	DEDUCIBLE Hr
Cumplimiento	09-06-2026	08-09-2027	1,073,979,941.40	1,073,979,941.40				
Anticipo	09-06-2026	08-09-2027	2,684,949,853.50	2,684,949,853.50				
Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09-06-2026	08-03-2030	536,989,970.70	536,989,970.70				
Estabilidad de la obra	08-03-2027	08-03-2032	1,073,979,941.40	1,073,979,941.40				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	09-06-2026	08-03-2029	1,073,979,941.40	1,073,979,941.40				

OBJETO DE LA GARANTIA:

OBJETO DE MOFICICACIÓN: POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO CON FECHA DE JUNIO 09,2026.
DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE MOFICICACIÓN: DE ACUERDO CON LO REQUERIDO, SE MODIFICA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO.
DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR, CONTINUAN VIGENTES.

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO N° 019 DE 2026, CUYO OBJETO ES:

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.

ASEGURADO / BENEFICIARIOS: ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO" IDENTIFICADA CON EL NIT 901.445.387-3 Y EL MUNICIPIO DE YOPAL.

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA. LAS CARÁTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL. CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LOS CANALES DE ATENCIÓN QUE SE ENCUENTAN EN LA PÁGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO, ***VER NOTA*** EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETANDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ÁRTICULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES. LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS. LA PRESENTE GARANTIA NO EXPIRARA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDA CON FUNDAMENTO EN ELLA O POR REVOCACION UNILATERAL POR PARTE DEL TOMADOR O DE LA COMPAÑIA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL NUMERAL 19 DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993. AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL. EL PRESENTE CERTIFICADO DE SEGUROS SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA 801056816 Y CERTIFICADO GU246762

(415)7709998911901(8020)0000000000

TOMADOR

María Juana Herrera Rodríguez
CC: 52.410.590

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SU-FO-01-02

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE - ORIGINAL - ASEGURADO

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

GARANTÍA ÚNICA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA 801056816
CERTIFICADO GU246984
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO

SUCURSAL: C. ANDINO USUARIO: KDMORA TIPO CERTIFICADO: Endoso FECHA EXPEDICION: DD 16 MM 06 AAAA 2026

TOMADOR/GARANTIZADO	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD:	SAN ANDRES
E-MAIL:	GRACIELA.RODRIGUEZ@EISA.COM.CO	TELÉFONO:	6684343
ASEGURADO:	ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO	C.C. O NIT:	901445387 3
DIRECCIÓN:	CL 32 39 11 BRR barzal alto	CIUDAD: VILLAVICENCIO	TEL. 3108708920
BENEFICIARIO:	ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO	C.C. O NIT:	901445387 3
DIRECCIÓN:	CL 32 39 11 BRR barzal alto	CIUDAD: VILLAVICENCIO	TEL. 3108708920

VIGENCIA		VALOR ASEGURADO EN PESOS		
DD MM AAAA	DD MM AAAA	ANTERIOR	ESTA MODIFICACIÓN	NUEVA
DESDE 23 04 2026	HASTA 08 03 2032	6,443,879,648.40	0.00	6,443,879,648.40

INTERMEDIARIO		COASEGURO				PRIMA		
%PART	NOMBRE	COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRM:	MONEDA	VALORES
100.00	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS SAR LTDA ASESORES DE SEGU					PRIMA NETA	PESOS	
						CARGOS DE EMISIÓN	PESOS	
						IVA	PESOS	
						TOTAL		

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA. LAS CARÁTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL, CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LOS CANALES DE ATENCIÓN QUE SE ENCUENTAN EN LA PÁGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO, ***VER NOTA*** EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETANDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ÁRTICULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES. LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERÍSTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS. LA PRESENTE GARANTIA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDA CON FUNDAMENTO EN ELLA O POR REVOCACION UNILATERAL POR PARTE DEL TOMADOR O DE LA COMPAÑIA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL NUMERAL 19 DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993. AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL. EL PRESENTE CERTIFICADO DE SEGUROS SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA 801056816 Y CERTIFICADO GU246762

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TOMADOR

(415)7709989811901(8020)0000000000

María Juana Herrera Rodríguez
CC: 52.420.598

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

SU-FO-01-02

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE - ORIGINAL - ASEGURADO

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

GARANTÍA ÚNICA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA 801056816
CERTIFICADO GU246984
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO

SUCURSAL: C. ANDINO USUARIO: KDMORA TIPO CERTIFICADO: Endoso FECHA EXPEDICION: DD 16 MM 06 AAAA 2026

TOMADOR/GARANTIZADO	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD:	SAN ANDRES
E-MAIL:	GRACIELA.RODRIGUEZ@EISA.COM.CO	TELÉFONO:	6684343
ASEGURADO:	ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO	C.C. O NIT:	901445387 3
DIRECCIÓN:	CL 32 39 11 BRR barzal alto	CIUDAD: VILLAVICENCIO	TEL. 3108708920
BENEFICIARIO:	ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO	C.C. O NIT:	901445387 3
DIRECCIÓN:	CL 32 39 11 BRR barzal alto	CIUDAD: VILLAVICENCIO	TEL. 3108708920

VIGENCIA		VALOR ASEGURADO EN PESOS		
DD MM AAAA	DD MM AAAA	ANTERIOR	ESTA MODIFICACIÓN	NUEVA
DESDE 23 04 2026	HASTA 08 03 2032	6,443,879,648.40	0.00	6,443,879,648.40

INTERMEDIARIO		COASEGURO				PRIMA		
%PART	NOMBRE	COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRM:	MONEDA	VALORES
100.00	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS SAR LTDA ASESORES DE SEGU					PRIMA NETA	PESOS	
						CARGOS DE EMISIÓN	PESOS	
						IVA	PESOS	
						TOTAL		

AMPAROS	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta	VALOR ASEGURADO ANTERIOR EN PESOS	VALOR ASEGURADO NUEVO EN PESOS	VALOR PRIMA EN PESOS	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE Mínimo	DEDUCIBLE Hr
Cumplimiento	09-06-2026	08-09-2027	1,073,979,941.40	1,073,979,941.40				
Anticipo	09-06-2026	08-09-2027	2,684,949,853.50	2,684,949,853.50				
Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09-06-2026	08-03-2030	536,989,970.70	536,989,970.70				
Estabilidad de la obra	08-03-2027	08-03-2032	1,073,979,941.40	1,073,979,941.40				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	09-06-2026	08-03-2029	1,073,979,941.40	1,073,979,941.40				

OBJETO DE LA GARANTIA:

OBJETO DE MOFICICACIÓN: POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO CON FECHA DE JUNIO 09,2026.
DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE MOFICICACIÓN: DE ACUERDO CON LO REQUERIDO, SE MODIFICA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO.
DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR, CONTINUAN VIGENTES.

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO N° 019 DE 2026, CUYO OBJETO ES:

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.

ASEGURADO / BENEFICIARIOS: ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO" IDENTIFICADA CON EL NIT 901.445.387-3 Y EL MUNICIPIO DE YOPAL.

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA. LAS CARÁTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL, CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIEN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LOS CANALES DE ATENCIÓN QUE SE ENCUENTAN EN LA PÁGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO, ***VER NOTA*** EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETANDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ÁRTICULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES. LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS. LA PRESENTE GARANTIA NO EXPIRARA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDA CON FUNDAMENTO EN ELLA O POR REVOCACION UNILATERAL POR PARTE DEL TOMADOR O DE LA COMPAÑIA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL NUMERAL 19 DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993. AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL. EL PRESENTE CERTIFICADO DE SEGUROS SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA 801056816 Y CERTIFICADO GU246762

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

(415)7709998911901(8020)0000000000

TOMADOR

María Juana Herrera Rodríguez
CC: 52.420.896

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

SU-FO-01-02

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE - PRIMERA COPIA - GARANTIZADO

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

GARANTÍA ÚNICA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA 801056816
CERTIFICADO GU246984
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO

SUCURSAL: C. ANDINO USUARIO: KDMORA TIPO CERTIFICADO: Endoso
FECHA EXPEDICION: DD 16 MM 06 AAAA 2026

TOMADOR/GARANTIZADO	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT: 860533206	8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD: SAN ANDRES	
E-MAIL:	GRACIELA.RODRIGUEZ@EISA.COM.CO	TELÉFONO: 6684343	
ASEGURADO:	ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO	C.C. O NIT: 901445387	3
DIRECCIÓN:	CL 32 39 11 BRR barzal alto	CIUDAD: VILLAVICENCIO	TEL. 3108708920
BENEFICIARIO:	ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO	C.C. O NIT: 901445387	3
DIRECCIÓN:	CL 32 39 11 BRR barzal alto	CIUDAD: VILLAVICENCIO	TEL. 3108708920

VIGENCIA		VALOR ASEGURADO EN PESOS		
DD MM AAAA	DD MM AAAA	ANTERIOR	ESTA MODIFICACIÓN	NUEVA
DESDE 23 04 2026	HASTA 08 03 2032	6,443,879,648.40	0.00	6,443,879,648.40

INTERMEDIARIO		COASEGURO				PRIMA		
%PART	NOMBRE	COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRM:	MONEDA	VALORES
100.00	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS SAR LTDA ASESORES DE SEGU					PRIMA NETA	PESOS	
						CARGOS DE EMISIÓN	PESOS	
						IVA	PESOS	
						TOTAL		

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA. LAS CARÁTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL, CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LOS CANALES DE ATENCIÓN QUE SE ENCUENTAN EN LA PÁGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO, ***VER NOTA*** EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETANDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ÁRTICULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES. LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS. LA PRESENTE GARANTIA NO EXPIRARA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDA CON FUNDAMENTO EN ELLA O POR REVOCACION UNILATERAL POR PARTE DEL TOMADOR O DE LA COMPAÑIA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL NUMERAL 19 DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993. AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL. EL PRESENTE CERTIFICADO DE SEGUROS SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA 801056816 Y CERTIFICADO GU246762

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TOMADOR

(415)7709998911901(8020)0000000000

María Juana Herrera Rodríguez
CC: 52.420.596

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

SU-FO-01-02

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE - PRIMERA COPIA - GARANTIZADO

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

GARANTÍA ÚNICA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA 801056816
CERTIFICADO GU246984
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO

SUCURSAL: C. ANDINO USUARIO: KDMORA TIPO CERTIFICADO: Endoso FECHA EXPEDICION: DD 16 MM 06 AAAA 2026

TOMADOR/GARANTIZADO	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD:	SAN ANDRES
E-MAIL:	GRACIELA.RODRIGUEZ@EISA.COM.CO	TELÉFONO:	6684343
ASEGURADO:	ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO	C.C. O NIT:	901445387 3
DIRECCIÓN:	CL 32 39 11 BRR barzal alto	CIUDAD: VILLAVICENCIO	TEL. 3108708920
BENEFICIARIO:	ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO	C.C. O NIT:	901445387 3
DIRECCIÓN:	CL 32 39 11 BRR barzal alto	CIUDAD: VILLAVICENCIO	TEL. 3108708920

VIGENCIA		VALOR ASEGURADO EN PESOS		
DESDE DD 23 MM 04 AAAA 2026	HASTA DD 08 MM 03 AAAA 2032	ANTERIOR	ESTA MODIFICACIÓN	NUEVA
		6,443,879,648.40	0.00	6,443,879,648.40

INTERMEDIARIO		COASEGURO				PRIMA		
%PART	NOMBRE	COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRM:	MONEDA	VALORES
100.00	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS SAR LTDA ASESORES DE SEGU					PRIMA NETA	PESOS	
						CARGOS DE EMISIÓN	PESOS	
						IVA	PESOS	
						TOTAL		

AMPAROS	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta	VALOR ASEGURADO ANTERIOR EN PESOS	VALOR ASEGURADO NUEVO EN PESOS	VALOR PRIMA EN PESOS	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE Mínimo	DEDUCIBLE Hr
Cumplimiento	09-06-2026	08-09-2027	1,073,979,941.40	1,073,979,941.40				
Anticipo	09-06-2026	08-09-2027	2,684,949,853.50	2,684,949,853.50				
Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09-06-2026	08-03-2030	536,989,970.70	536,989,970.70				
Estabilidad de la obra	08-03-2027	08-03-2032	1,073,979,941.40	1,073,979,941.40				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	09-06-2026	08-03-2029	1,073,979,941.40	1,073,979,941.40				

OBJETO DE LA GARANTIA:

OBJETO DE MOFICICACIÓN: POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO CON FECHA DE JUNIO 09,2026.
DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE MOFICICACIÓN: DE ACUERDO CON LO REQUERIDO, SE MODIFICA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO.
DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR, CONTINUAN VIGENTES.

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO N° 019 DE 2026, CUYO OBJETO ES:

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.

ASEGURADO / BENEFICIARIOS: ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO" IDENTIFICADA CON EL NIT 901.445.387-3 Y EL MUNICIPIO DE YOPAL.

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA. LAS CARÁTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL, CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LOS CANALES DE ATENCIÓN QUE SE ENCUENTAN EN LA PÁGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO, ***VER NOTA*** EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETANDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ÁRTICULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LÁ TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES. LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS. LA PRESENTE GARANTIA NO EXPIRARA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDA CON FUNDAMENTO EN ELLA O POR REVOCACION UNILATERAL POR PARTE DEL TOMADOR O DE LA COMPAÑIA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL NUMERAL 19 DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993. AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL. EL PRESENTE CERTIFICADO DE SEGUROS SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA 801056816 Y CERTIFICADO GU246762

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TOMADOR

(415)7709998911981(8020)0000000000

María Juana Herrera Rodríguez
CC: 52.480.598

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

SU-FO-01-02

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE - SEGUNDA COPIA - INTERMEDIARIO

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

GARANTÍA ÚNICA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA 801056816
CERTIFICADO GU246984
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO

SUCURSAL: C. ANDINO USUARIO: KDMORA TIPO CERTIFICADO: Endoso FECHA EXPEDICION: DD 16 MM 06 AAAA 2026

TOMADOR/GARANTIZADO	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD:	SAN ANDRES
E-MAIL:	GRACIELA.RODRIGUEZ@EISA.COM.CO	TELÉFONO:	6684343
ASEGURADO:	ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO	C.C. O NIT:	901445387 3
DIRECCIÓN:	CL 32 39 11 BRR barzal alto	CIUDAD: VILLAVICENCIO	TEL. 3108708920
BENEFICIARIO:	ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO	C.C. O NIT:	901445387 3
DIRECCIÓN:	CL 32 39 11 BRR barzal alto	CIUDAD: VILLAVICENCIO	TEL. 3108708920

VIGENCIA			VALOR ASEGURADO EN PESOS		
	DD MM AAAA	DD MM AAAA	ANTERIOR	ESTA MODIFICACIÓN	NUEVA
DESDE	23 04 2026	HASTA 08 03 2032	6,443,879,648.40	0.00	6,443,879,648.40

INTERMEDIARIO		COASEGURO				PRIMA		
%PART	NOMBRE	COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRM:	MONEDA	VALORES
100.00	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS SAR LTDA ASESORES DE SEGU					PRIMA NETA	PESOS	
						CARGOS DE EMISIÓN	PESOS	
						IVA	PESOS	
						TOTAL		

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA. LAS CARÁTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL; CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LOS CANALES DE ATENCIÓN QUE SE ENCUENTAN EN LA PÁGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO, ***VER NOTA*** EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETANDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ÁRTICULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DÍA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES. LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS. LA PRESENTE GARANTIA NO EXPIRARA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDA CON FUNDAMENTO EN ELLA O POR REVOCACION UNILATERAL POR PARTE DEL TOMADOR O DE LA COMPAÑIA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL NUMERAL 19 DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993. AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL. EL PRESENTE CERTIFICADO DE SEGUROS SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA 801056816 Y CERTIFICADO GU246762

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

(415)7709998911901(8020)0000000000

TOMADOR

María Juana Herrera Rodríguez
CC: 52.420.898

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

SU-FO-01-02

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

GARANTÍA ÚNICA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA 801056816
CERTIFICADO GU246984
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO

SUCURSAL: C. ANDINO USUARIO: KDMORA TIPO CERTIFICADO: Endoso FECHA EXPEDICION: DD 16 MM 06 AAAA 2026

TOMADOR/GARANTIZADO	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD:	SAN ANDRES
E-MAIL:	GRACIELA.RODRIGUEZ@EISA.COM.CO	TELÉFONO:	6684343
ASEGURADO:	ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO	C.C. O NIT:	901445387 3
DIRECCIÓN:	CL 32 39 11 BRR barzal alto	CIUDAD: VILLAVICENCIO	TEL. 3108708920
BENEFICIARIO:	ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO	C.C. O NIT:	901445387 3
DIRECCIÓN:	CL 32 39 11 BRR barzal alto	CIUDAD: VILLAVICENCIO	TEL. 3108708920

VIGENCIA		VALOR ASEGURADO EN PESOS		
DESDE DD 23 MM 04 AAAA 2026	HASTA DD 08 MM 03 AAAA 2032	ANTERIOR	ESTA MODIFICACIÓN	NUEVA
		6,443,879,648.40	0.00	6,443,879,648.40

INTERMEDIARIO		COASEGURO				PRIMA		
%PART	NOMBRE	COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRM:	MONEDA	VALORES
100.00	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS SAR LTDA ASESORES DE SEGU					PRIMA NETA	PESOS	
						CARGOS DE EMISIÓN	PESOS	
						IVA	PESOS	
						TOTAL		

AMPAROS	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta	VALOR ASEGURADO ANTERIOR EN PESOS	VALOR ASEGURADO NUEVO EN PESOS	VALOR PRIMA EN PESOS	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE Mínimo	DEDUCIBLE Hr
Cumplimiento	09-06-2026	08-09-2027	1,073,979,941.40	1,073,979,941.40				
Anticipo	09-06-2026	08-09-2027	2,684,949,853.50	2,684,949,853.50				
Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09-06-2026	08-03-2030	536,989,970.70	536,989,970.70				
Estabilidad de la obra	08-03-2027	08-03-2032	1,073,979,941.40	1,073,979,941.40				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	09-06-2026	08-03-2029	1,073,979,941.40	1,073,979,941.40				

OBJETO DE LA GARANTIA:

OBJETO DE MOFICICACIÓN: POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO CON FECHA DE JUNIO 09,2026.
DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE MOFICICACIÓN: DE ACUERDO CON LO REQUERIDO, SE MODIFICA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO.
DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR, CONTINUAN VIGENTES.

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO N° 019 DE 2026, CUYO OBJETO ES:

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.

ASEGURADO / BENEFICIARIOS: ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO" IDENTIFICADA CON EL NIT 901.445.387-3 Y EL MUNICIPIO DE YOPAL.

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA. LAS CARÁTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL, CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LOS CANALES DE ATENCIÓN QUE SE ENCUENTAN EN LA PÁGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO, ***VER NOTA*** EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETANDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ÁRTICULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES. LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS. LA PRESENTE GARANTIA NO EXPIRARA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDA CON FUNDAMENTO EN ELLA O POR REVOCACION UNILATERAL POR PARTE DEL TOMADOR O DE LA COMPAÑIA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL NUMERAL 19 DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993. AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL. EL PRESENTE CERTIFICADO DE SEGUROS SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA 801056816 Y CERTIFICADO GU246762

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

(415)7709998911901(8020)0000000000

TOMADOR

María Juana Herrera Rodríguez
CC: 52.420.596

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

SU-FO-01-02

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE - TERCERA COPIA - SUCURSAL/OFICINA EXPEDIDORA

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

GARANTÍA ÚNICA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA 801056816
CERTIFICADO GU246984
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO

SUCURSAL: C. ANDINO USUARIO: KDMORA TIPO CERTIFICADO: Endoso FECHA EXPEDICION: DD 16 MM 06 AAAA 2026

TOMADOR/GARANTIZADO	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD:	SAN ANDRES
E-MAIL:	GRACIELA.RODRIGUEZ@EISA.COM.CO	TELÉFONO:	6684343
ASEGURADO:	ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO	C.C. O NIT:	901445387 3
DIRECCIÓN:	CL 32 39 11 BRR barzal alto	CIUDAD: VILLAVICENCIO	TEL. 3108708920
BENEFICIARIO:	ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO	C.C. O NIT:	901445387 3
DIRECCIÓN:	CL 32 39 11 BRR barzal alto	CIUDAD: VILLAVICENCIO	TEL. 3108708920

VIGENCIA		VALOR ASEGURADO EN PESOS		
DESDE DD 23 MM 04 AAAA 2026	HASTA DD 08 MM 03 AAAA 2032	ANTERIOR	ESTA MODIFICACIÓN	NUEVA
		6,443,879,648.40	0.00	6,443,879,648.40

INTERMEDIARIO		COASEGURO				PRIMA		
%PART	NOMBRE	COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRM:	MONEDA	VALORES
100.00	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS SAR LTDA ASESORES DE SEGU					PRIMA NETA	PESOS	
						CARGOS DE EMISIÓN	PESOS	
						IVA	PESOS	
						TOTAL		

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA. LAS CARÁTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL, CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LOS CANALES DE ATENCIÓN QUE SE ENCUENTAN EN LA PÁGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO, ***VER NOTA*** EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETANDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ÁRTICULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DÍA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES. LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS. LA PRESENTE GARANTIA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDA CON FUNDAMENTO EN ELLA O POR REVOCACION UNILATERAL POR PARTE DEL TOMADOR O DE LA COMPAÑIA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL NUMERAL 19 DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993. AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL. EL PRESENTE CERTIFICADO DE SEGUROS SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA 801056816 Y CERTIFICADO GU246762

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TOMADOR

(415)7709998911001(8020)0000000000

María Juana Herrera Rodríguez
CC 52.430.898

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

SU-FO-01-02

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE - TERCERA COPIA - SUCURSAL/OFICINA EXPEDIDORA

CONFIANZA

Swiss Re Corporate Solutions

NIT: 860.070.374-9

Referencia para pago electrónico: 0000000000

Nit: 860533206 **DV:** 8

Tomador: ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A. QUE PODRA ABREVIARSE E I A S.A

Póliza: 801056816 **Certificado:** GU246984 **SUCURSAL:** C. ANDINO

Valor Póliza:$ 0

FECHA DE DD MM AAAA

Canales de Pago:

- PSE en nuestra pagina web www.confianza.com.co en Pagos Confianza PC, registrese con c.c. o nit y el digito de verificación, seleccione la opción: PSE/tarjeta de crédito.

- En entidades bancarias y corresponsales: (con código de barras, presentando este cupón)

Bancos:
BBVA Davivienda Banco de Bogotá

Corresponsales bancarios:
Corresponsales bancarios de Bancolombia
Grupo Éxito-Carulla
Surtimax
Olímpica
Movilred
Grupo Gelsa
Corresponsal Daviplata-punto red
Otros consúltelos en nuestra página web.
Copidrogas
Red Cerca
EDEQ
Full recarga

CANTIDAD DE CHEQUES	COD. BANCO	CHEQUE No.	VALOR
		CHEQUES $	
		EFECTIVO $	
		(*) TOTAL	

(415)7709998911901(8020)0000000000

IMPORTANTE:

- Si se requiere pagar más de una póliza, genere su cupón de pago en www.confianza.com.co en Pagos Confianza PC, registrese con c.c. o nit y el digito de verificación y seleccione las pólizas en la opción: Cupón de pagos.
- Es importante que esté actualizado su correo electrónico ya que a este le llegará su recibo de caja en línea, si paga por estos medios.
- No se reciben pagos mixtos.
(*) el valor a pagar puede ser menor o igual al valor de la póliza. No se reciben valores mayores al estipulado en este cupón.

- CLIENTE -

Dirección para notificaciones: Calle 82 Nº 11 - 37 Piso 7 - Bogotá, D.C.- Colombia. centrodecontacto@confianza.com.co

CONFIANZA

Swiss Re Corporate Solutions

NIT: 860.070.374-9

Referencia para pago electrónico: 0000000000

Nit: 860533206 **DV:** 8

Tomador: ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A. QUE PODRA ABREVIARSE E I A S.A

Póliza: 801056816 **Certificado:** GU246984 **SUCURSAL:** C. ANDINO

Valor Póliza:$ 0

FECHA DE DD MM AAAA

Canales de Pago:

- PSE en nuestra pagina web www.confianza.com.co en Pagos Confianza PC, registrese con c.c. o nit y el digito de verificación, seleccione la opción: PSE/tarjeta de crédito.

- En entidades bancarias y corresponsales: (con código de barras, presentando este cupón)

Bancos:
BBVA Davivienda Banco de Bogotá

Corresponsales bancarios:
Corresponsales bancarios de Bancolombia
Grupo Éxito-Carulla
Surtimax
Olímpica
Movilred
Grupo Gelsa
Corresponsal Daviplata-punto red
Otros consúltelos en nuestra página web.
Copidrogas
Red Cerca
EDEQ
Full recarga

CANTIDAD DE CHEQUES	COD. BANCO	CHEQUE No.	VALOR
		CHEQUES $	
		EFECTIVO $	
		(*) TOTAL	

(415)7709998911901(8020)0000000000

IMPORTANTE:

- Si se requiere pagar más de una póliza, genere su cupón de pago en www.confianza.com.co en Pagos Confianza PC, registrese con c.c. o nit y el digito de verificación y seleccione las pólizas en la opción: Cupón de pagos.
- Es importante que esté actualizado su correo electrónico ya que a este le llegará su recibo de caja en línea, si paga por estos medios.
- No se reciben pagos mixtos.
(*) el valor a pagar puede ser menor o igual al valor de la póliza. No se reciben valores mayores al estipulado en este cupón.

- BANCO -

Dirección para notificaciones: Calle 82 Nº 11 - 37 Piso 7 - Bogotá, D.C.- Colombia. centrodecontacto@confianza.com.co

RCE

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA 802091981
CERTIFICADO RE19045
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO

SUCURSAL: C. ANDINO USUARIO: KDMORA TIPO CERTIFICADO: Endoso FECHA EXPEDICION: DD 16 MM 06 AAAA 2026

TOMADOR	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD:	SAN ANDRES
E-MAIL:	GRACIELA.RODRIGUEZ@EISA.COM.CO	TELÉFONO:	6684343
ASEGURADO:	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD: SAN ANDRES	TEL. 6684343
BENEFICIARIO:	TERCEROS AFECTADOS	C.C. O NIT:	0000000000
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	TEL.

VIGENCIA		VALOR ASEGURADO EN PESOS		
DESDE DD 23 MM 04 AAAA 2026	HASTA DD 08 MM 03 AAAA 2027	ANTERIOR	ESTA MODIFICACIÓN	NUEVA
		700,362,000.00	0.00	700,362,000.00

INTERMEDIARIO		COASEGURO				PRIMA		
%PART	NOMBRE	COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRM:	MONEDA	VALORES
100.00	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS SAR LTDA ASESORES DE SEGU					PRIMA NETA	PESOS	
						CARGOS DE EMISIÓN	PESOS	
						IVA	PESOS	
						TOTAL		

AMPAROS	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta	VALOR ASEGURADO ANTERIOR EN PESOS	VALOR ASEGURADO NUEVO EN PESOS	VALOR PRIMA EN PESOS	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE Mínimo	DEDUCIBLE Hr
Predios Labores Operaciones / Vigencia	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	0
Predios Labores Operaciones / Evento	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Perjuicios Patrim Lucro Cesante / Vigencia	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Perjuicios Patrim Lucro Cesante / Evento	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Perjuicios Extrapatrimoniales / Vigencia	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Perjuicios Extrapatrimoniales / Evento	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Gastos Judiciales de Defensa / Vigencia	23-04-2026	08-03-2027	140,072,400.00	140,072,400.00		10	7,000,000.00	
Gastos Judiciales de Defensa / Evento	23-04-2026	08-03-2027	140,072,400.00	140,072,400.00		10	7,000,000.00	
Gastos Médicos de Urgencia / Vigencia	23-04-2026	08-03-2027	140,072,400.00	140,072,400.00				
Gastos Médicos de Urgencia / Evento	23-04-2026	08-03-2027	140,072,400.00	140,072,400.00				
Resp Civil Patronal / vigencia	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Resp Civil Patronal / Evento	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Resp Civil Contratistas Y Subcont / Vigencia	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Resp Civil Contratistas Y Subcont / Evento	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Resp Civil Vehículos Prop Y No Prop / Vigencia	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	100,000.00	
Resp Civil Vehículos Prop Y No Prop / Evento	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	

OBJETO DE LA PÓLIZA:

OBJETO DE MOFICICACIÓN: POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO CON FECHA DE JUNIO 09,2026.
DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

EXCLUSIÓN DE TRANSCCIONES PROHIBIDAS, EMBARGOS Y SANCIONES ECONÓMICAS: LA COMPAÑÍA NO PROVEERA COBERTURA NI ESTARÁ OBLIGADA A PAGAR NINGUNA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO EN VIRTUD DE ESTA PÓLIZA SI LA PROVISIÓN DE DICHA COBERTURA, O EL PAGO DE DICHA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO PUDIERE EXPONER A LA COMPAÑÍA A ALGUNA SANCIÓN, PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN CONFORME A LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O SANCIONES COMERCIALES O ECONÓMICAS, LEYES O NORMATIVAS DE CUALQUIER JURISDICCIÓN APLICABLE A LA COMPAÑÍA.

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA. ***LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO.*** LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO SE DEBERA HACERA MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACION DE LA VIGENCIA DE LA POLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA. LAS CARÁTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL, CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LOS CANALES DE ATENCIÓN QUE SE ENCUENTAN EN LA PÁGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO, ***VER NOTA*** EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETANDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ÁRTICULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES. LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS. AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL. EL PRESENTE CERTIFICADO DE SEGUROS SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA 802091981 Y CERTIFICADO RE18993

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TOMADOR

(415)7709998911901(8020)0000000000

María Juana Herrera Rodríguez
CC: 52.420.596

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

SU-FO-10-01

Dirección para notificaciones: Calle 82 Nº 11 - 37 Piso 7 - Bogotá, D.C.- Colombia

Fecha de Impresion: Tue, 16 Jun 2026 12:30:47

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA 802091981
CERTIFICADO RE19045
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO

SUCURSAL: C. ANDINO USUARIO: KDMORA TIPO CERTIFICADO: Endoso FECHA EXPEDICION: DD 16 MM 06 AAAA 2026

TOMADOR	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD:	SAN ANDRES
E-MAIL:	GRACIELA.RODRIGUEZ@EISA.COM.CO	TELÉFONO:	6684343
ASEGURADO:	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD: SAN ANDRES	TEL. 6684343
BENEFICIARIO:	TERCEROS AFECTADOS	C.C. O NIT:	0000000000
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	TEL.

VIGENCIA			VALOR ASEGURADO EN PESOS		
DESDE DD 23 MM 04 AAAA 2026	HASTA DD 08 MM 03 AAAA 2027		ANTERIOR	ESTA MODIFICACIÓN	NUEVA
			700,362,000.00	0.00	700,362,000.00

INTERMEDIARIO		COASEGURO				PRIMA		
%PART	NOMBRE	COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRM:	MONEDA	VALORES
100.00	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS SAR LTDA ASESORES DE SEGU					PRIMA NETA	PESOS	
						CARGOS DE EMISIÓN	PESOS	
						IVA	PESOS	
						TOTAL		

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y DE ACUERDO A REQUERIMIENTO, SE ACLARA:

ASEGURADO/BENEFICIARIO: ASOCIACI¿N SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO", IDENTIFICADA CON EL NIT 901.445.387-3, EL MUNICIPIO DE YOPAL Y EL CONTRATISTA.

INDEMNIZAR LOS DA¿OS Y/O PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES, SIEMPRE QUE DERIVEN DE UN DA¿O F¿SICO Y/O MATERIAL IMPUTABLES AL TOMADOR Y/O ASEGURADO DE LA P¿LIZA, Y CAUSADOS POR LESIONES, MUERTE Y/O DA¿OS A LA PROPIEDAD DE TERCEROS, Y DERIVADOS DE LA EJECUCI¿N DEL CONTRATO N.¿ 019 DE 2026, CUYO OBJETO ES:

IMPLEMENTACI¿N DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACI¿N EN LA V¿A LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.

ASEGURADO/BENEFICIARIO: ASOCIACI¿N SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO", IDENTIFICADA CON EL NIT 901.445.387-3 Y EL CONTRATISTA.

SISTEMA BASE DE COBERTURA POR OCURRENCIA.

AMPARO DE BIENES BAJO CUIDADO, TENENCIA Y CONTROL
SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR HURTO SIMPLE NI CALIFICADO, AS¿ COMO TAMPOCO LOS DA¿OS A LOS BIENES COMO TAL.

AMPAROS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS Y RC CRUZADA
OPERAN EN EXCESO DE LA P¿LIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL INDIVIDUAL, CONTRATADA O NO, POR CADA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA, CON UN L¿MITE M¿NIMO POR EVENTO DE $50.000.000. ESTOS AMPAROS APLICAN SIEMPRE QUE EL ASEGURADO PRINCIPAL SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE.

EXCLUSIÓN DE TRANSCCIONES PROHIBIDAS, EMBARGOS Y SANCIONES ECONÓMICAS: LA COMPAÑÍA NO PROVEERA COBERTURA NI ESTARÁ OBLIGADA A PAGAR NINGUNA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO EN VIRTUD DE ESTA PÓLIZA SI LA PROVISIÓN DE DICHA COBERTURA, O EL PAGO DE DICHA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO PUDIERE EXPONER A LA COMPAÑÍA A ALGUNA SANCIÓN, PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN CONFORME A LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O SANCIONES COMERCIALES O ECONÓMICAS, LEYES O NORMATIVAS DE CUALQUIER JURISDICCIÓN APLICABLE A LA COMPAÑÍA.

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA. ***LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO.*** LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO SE DEBERA HACERA MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACION DE LA VIGENCIA DE LA POLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA. LAS CARÁTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL. CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LOS CANALES DE ATENCIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN LA PÁGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO. ***VER NOTA*** EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETÁNDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES. LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS. AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL. EL PRESENTE CERTIFICADO DE SEGUROS SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA 802091981 Y CERTIFICADO RE18993

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TOMADOR

(415)7709998911901(8020)0000000000

María Juana Herrera Rodríguez
CC: 52.420.596

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

SU-FO-10-01

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE - ORIGINAL - ASEGURADO

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA 802091981
CERTIFICADO RE19045
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO

SUCURSAL: C. ANDINO USUARIO: KDMORA TIPO CERTIFICADO: Endoso FECHA EXPEDICION: DD 16 MM 06 AAAA 2026

TOMADOR	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD:	SAN ANDRES
E-MAIL:	GRACIELA.RODRIGUEZ@EISA.COM.CO	TELÉFONO:	6684343
ASEGURADO:	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD: SAN ANDRES	TEL. 6684343
BENEFICIARIO:	TERCEROS AFECTADOS	C.C. O NIT:	0000000000
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	TEL.

VIGENCIA			VALOR ASEGURADO EN PESOS		
	DD MM AAAA	DD MM AAAA	ANTERIOR	ESTA MODIFICACIÓN	NUEVA
DESDE	23 04 2026	HASTA 08 03 2027	700,362,000.00	0.00	700,362,000.00

INTERMEDIARIO		COASEGURO				PRIMA		
%PART	NOMBRE	COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRM:	MONEDA	VALORES
100.00	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS SAR LTDA ASESORES DE SEGU					PRIMA NETA	PESOS	
						CARGOS DE EMISIÓN	PESOS	
						IVA	PESOS	
						TOTAL		

AMPARO DE VEH¿CULOS PROPIOS O NO PROPIOS
OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DE LA P¿LIZA DE AUTOM¿VIL, CONTRATADA O NO, CON L¿MITES M¿NIMOS POR EVENTO DE $100.000.000 / $100.000.000 / $200.000.000. EN CASO DE SINIESTRO, SE DEBE DEMOSTRAR LA RELACI¿N QUE EXISTE ENTRE EL VEH¿CULO SINIESTRADO Y EL CONTRATO AMPARADO BAJO LA P¿LIZA.

CL¿USULA DE GARANT¿A:
EL CONTRATISTA DEBE IMPLEMENTAR TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS PARA PREVENIR CUALQUIER CLASE DE ACCIDENTES A TERCEROS, COMO LO ES LA DEBIDA SE¿ALIZACI¿N, AVISOS, LOS RESPECTIVOS CERRAMIENTOS, DEMARCACI¿N DE LA OBRA, DEBIDO ESTUDIO DE LOS TRAZAMIENTOS DE RUTAS ALTERNAS Y DE LAS RUTAS INMEDIATAMENTE ADYACENTES A LA OBRA.

NOTA:
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PRESENTE P¿LIZA NO AMPARA LAS FALLAS Y/O INTERRUPCIONES EN LOS SERVICIOS P¿BLICOS, AS¿ COMO TAMPOCO LOS DA¿OS CONSECUENCIALES DERIVADOS DE DICHAS INTERRUPCIONES. EL TOMADOR ASEGURADO SE COMPROMETE A QUE SUS EMPLEADOS CUMPLAN ESTRICTAMENTE CON EL REGLAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

SEGUIR TODAS Y CADA UNA DE LAS DISPOSICIONES CONSIGNADAS EN EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PROTECCI¿N CONTRA CA¿DAS EN TRABAJO EN ALTURAS, RESOLUCI¿N 1409 DE 2012; DISPONER DE UN COORDINADOR, TRABAJADOR Y CERTIFICADO DE COMPETENCIA DE TRABAJO EN ALTURAS, DEBIDAMENTE CERTIFICADO SEG¿N LO ESTABLECIDO EN LA LEY COLOMBIANA.

EXCLUSIÓN DE TRANSCCIONES PROHIBIDAS, EMBARGOS Y SANCIONES ECONÓMICAS: LA COMPAÑÍA NO PROVEERA COBERTURA NI ESTARÁ OBLIGADA A PAGAR NINGUNA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO EN VIRTUD DE ESTA PÓLIZA SI LA PROVISIÓN DE DICHA COBERTURA, O EL PAGO DE DICHA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO PUDIERE EXPONER A LA COMPAÑÍA A ALGUNA SANCIÓN, PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN CONFORME A LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O SANCIONES COMERCIALES O ECONÓMICAS, LEYES O NORMATIVAS DE CUALQUIER JURISDICCIÓN APLICABLE A LA COMPAÑÍA.

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA. ***LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO.*** LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO SE DEBERA HACERA MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACION DE LA VIGENCIA DE LA POLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA. LAS CARÁTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL. CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LOS CANALES DE ATENCIÓN QUE SE ENCUENTAN EN LA PÁGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO, **VER NOTA*** EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETANDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ARTICULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES. LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS. AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL. EL PRESENTE CERTIFICADO DE SEGUROS SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA 802091981 Y CERTIFICADO RE18993

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

(415)7709998911901(8020)0000000000

TOMADOR

María Juana Herrera Rodríguez
CC: 52.420.596

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

SU-FO-10-01

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE - ORIGINAL - ASEGURADO

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA 802091981
CERTIFICADO RE19045
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO

SUCURSAL: C. ANDINO USUARIO: KDMORA TIPO CERTIFICADO: Endoso FECHA EXPEDICION: DD 16 MM 06 AAAA 2026

TOMADOR	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD:	SAN ANDRES
E-MAIL:	GRACIELA.RODRIGUEZ@EISA.COM.CO	TELÉFONO:	6684343
ASEGURADO:	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD: SAN ANDRES	TEL. 6684343
BENEFICIARIO:	TERCEROS AFECTADOS	C.C. O NIT:	0000000000
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	TEL.

VIGENCIA		VALOR ASEGURADO EN PESOS		
DD MM AAAA	DD MM AAAA	ANTERIOR	ESTA MODIFICACIÓN	NUEVA
DESDE 23 04 2026	HASTA 08 03 2027	700,362,000.00	0.00	700,362,000.00

INTERMEDIARIO		COASEGURO				PRIMA		
%PART	NOMBRE	COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRM:	MONEDA	VALORES
100.00	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS SAR LTDA ASESORES DE SEGU					PRIMA NETA	PESOS	
						CARGOS DE EMISIÓN	PESOS	
						IVA	PESOS	
						TOTAL		

AMPAROS	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta	VALOR ASEGURADO ANTERIOR EN PESOS	VALOR ASEGURADO NUEVO EN PESOS	VALOR PRIMA EN PESOS	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE Mínimo	DEDUCIBLE Hr
Predios Labores Operaciones / Vigencia	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	0
Predios Labores Operaciones / Evento	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Perjuicios Patrim Lucro Cesante / Vigencia	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Perjuicios Patrim Lucro Cesante / Evento	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Perjuicios Extrapatrimoniales / Vigencia	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Perjuicios Extrapatrimoniales / Evento	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Gastos Judiciales de Defensa / Vigencia	23-04-2026	08-03-2027	140,072,400.00	140,072,400.00		10	7,000,000.00	
Gastos Judiciales de Defensa / Evento	23-04-2026	08-03-2027	140,072,400.00	140,072,400.00		10	7,000,000.00	
Gastos Médicos de Urgencia / Vigencia	23-04-2026	08-03-2027	140,072,400.00	140,072,400.00				
Gastos Médicos de Urgencia / Evento	23-04-2026	08-03-2027	140,072,400.00	140,072,400.00				
Resp Civil Patronal / Vigencia	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Resp Civil Patronal / Evento	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Resp Civil Contratistas Y Subcont / Vigencia	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Resp Civil Contratistas Y Subcont / Evento	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Resp Civil Vehículos Prop Y No Prop / Vigencia	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	100,000.00	
Resp Civil Vehículos Prop Y No Prop / Evento	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	

OBJETO DE LA PÓLIZA:

OBJETO DE MOFICICACIÓN: POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO CON FECHA DE JUNIO 09,2026.
DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

EXCLUSIÓN DE TRANSCCIONES PROHÍBIDAS, EMBARGOS Y SANCIONES ECONÓMICAS: LA COMPAÑÍA NO PROVEERA COBERTURA NI ESTARÁ OBLIGADA A PAGAR NINGUNA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO EN VIRTUD DE ESTA PÓLIZA SI LA PROVISIÓN DE DICHA COBERTURA, O EL PAGO DE DICHA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO PUDIERE EXPONER A LA COMPAÑÍA A ALGUNA SANCIÓN, PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN CONFORME A LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O SANCIONES COMERCIALES O ECONÓMICAS, LEYES O NORMATIVAS DE CUALQUIER JURISDICCIÓN APLICABLE A LA COMPAÑÍA.

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA. ***LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO.*** LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO SE DEBERA HACERA MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACION DE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA. LAS CARÁTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL. CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LOS CANALES DE ATENCIÓN QUE SE ENCUENTAN EN LA PÁGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO, ***VER NOTA*** EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETÁNDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ÁRTICULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO. EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO. EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-LV.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES. LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS. AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL. EL PRESENTE CERTIFICADO DE SEGUROS SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA 802091981 Y CERTIFICADO RE18993

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

(415)7709998911901(8020)0000000000

TOMADOR

María Juana Herrera Rodríguez
CC: 52.420.596

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

SU-FO-10-01

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA 802091981
CERTIFICADO RE19045
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO

SUCURSAL: C. ANDINO USUARIO: KDMORA TIPO CERTIFICADO: Endoso FECHA EXPEDICION: DD 16 MM 06 AAAA 2026

TOMADOR	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD:	SAN ANDRES
E-MAIL:	GRACIELA.RODRIGUEZ@EISA.COM.CO	TELÉFONO:	6684343
ASEGURADO:	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD: SAN ANDRES	TEL. 6684343
BENEFICIARIO:	TERCEROS AFECTADOS	C.C. O NIT:	0000000000
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	TEL.

VIGENCIA			VALOR ASEGURADO EN PESOS		
DESDE DD 23 MM 04 AAAA 2026	HASTA DD 08 MM 03 AAAA 2027	ANTERIOR	ESTA MODIFICACIÓN	NUEVA	
		700,362,000.00	0.00	700,362,000.00	

INTERMEDIARIO		COASEGURO				PRIMA		
%PART	NOMBRE	COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRM:	MONEDA	VALORES
100.00	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS SAR LTDA ASESORES DE SEGU					PRIMA NETA	PESOS	
						CARGOS DE EMISIÓN	PESOS	
						IVA	PESOS	
						TOTAL		

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y DE ACUERDO A REQUERIMIENTO, SE ACLARA:

ASEGURADO/BENEFICIARIO: ASOCIACI¿N SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO", IDENTIFICADA CON EL NIT 901.445.387-3, EL MUNICIPIO DE YOPAL Y EL CONTRATISTA.

———

INDEMNIZAR LOS DA¿OS Y/O PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES, SIEMPRE QUE DERIVEN DE UN DA¿O F¿SICO Y/O MATERIAL IMPUTABLES AL TOMADOR Y/O ASEGURADO DE LA P¿LIZA, Y CAUSADOS POR LESIONES, MUERTE Y/O DA¿OS A LA PROPIEDAD DE TERCEROS, Y DERIVADOS DE LA EJECUCI¿N DEL CONTRATO N.¿ 019 DE 2026, CUYO OBJETO ES:

IMPLEMENTACI¿N DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACI¿N EN LA V¿A LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.

ASEGURADO/BENEFICIARIO: ASOCIACI¿N SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO", IDENTIFICADA CON EL NIT 901.445.387-3 Y EL CONTRATISTA.

SISTEMA BASE DE COBERTURA POR OCURRENCIA.

AMPARO DE BIENES BAJO CUIDADO, TENENCIA Y CONTROL
SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR HURTO SIMPLE NI CALIFICADO, AS¿ COMO TAMPOCO LOS DA¿OS A LOS BIENES COMO TAL.

AMPAROS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS Y RC CRUZADA
OPERAN EN EXCESO DE LA P¿LIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL INDIVIDUAL, CONTRATADA O NO, POR CADA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA, CON UN L¿MITE M¿NIMO POR EVENTO DE $50.000.000. ESTOS AMPAROS APLICAN SIEMPRE QUE EL ASEGURADO PRINCIPAL SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE.

EXCLUSIÓN DE TRANSCCIONES PROHÍBIDAS, EMBARGOS Y SANCIONES ECONÓMICAS: LA COMPAÑÍA NO PROVEERA COBERTURA NI ESTARÁ OBLIGADA A PAGAR NINGUNA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO EN VIRTUD DE ESTA PÓLIZA SI LA PROVISIÓN DE DICHA COBERTURA, O EL PAGO DE DICHA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO PUDIERE EXPONER A LA COMPAÑÍA A ALGUNA SANCIÓN, PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN CONFORME A LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O SANCIONES COMERCIALES O ECONÓMICAS, LEYES O NORMATIVAS DE CUALQUIER JURISDICCIÓN APLICABLE A LA COMPAÑÍA.

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA. ***LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO.*** LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO SE DEBERA HACERA MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACION DE LA VIGENCIA DE LA POLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA. LAS CARÁTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL. CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LOS CANALES DE ATENCIÓN QUE SE ENCUENTAN EN LA PÁGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO, ***VER NOTA*** EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETANDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ÁRTICULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES. LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS. AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A. INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL. EL PRESENTE CERTIFICADO DE SEGUROS SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA 802091981 Y CERTIFICADO RE18993

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TOMADOR

(415)7709998911901(8020)0000000000

María Juanna Herrera Rodriguez
CC: 52.420.596

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

SU-FO-10-01

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE - PRIMERA COPIA - GARANTIZADO

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA 802091981
CERTIFICADO RE19045
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO

SUCURSAL: C. ANDINO USUARIO: KDMORA TIPO CERTIFICADO: Endoso FECHA EXPEDICION: DD 16 MM 06 AAAA 2026

TOMADOR	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD:	SAN ANDRES
E-MAIL:	GRACIELA.RODRIGUEZ@EISA.COM.CO	TELÉFONO:	6684343
ASEGURADO:	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD: SAN ANDRES	TEL. 6684343
BENEFICIARIO:	TERCEROS AFECTADOS	C.C. O NIT:	0000000000
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	TEL.

VIGENCIA		VALOR ASEGURADO EN PESOS		
DESDE DD 23 MM 04 AAAA 2026	HASTA DD 08 MM 03 AAAA 2027	ANTERIOR	ESTA MODIFICACIÓN	NUEVA
		700,362,000.00	0.00	700,362,000.00

INTERMEDIARIO		COASEGURO				PRIMA		
%PART	NOMBRE	COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRM:	MONEDA	VALORES
100.00	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS SAR LTDA ASESORES DE SEGU					PRIMA NETA	PESOS	
						CARGOS DE EMISIÓN	PESOS	
						IVA	PESOS	
						TOTAL		

AMPARO DE VEH¿CULOS PROPIOS O NO PROPIOS
OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DE LA P¿LIZA DE AUTOM¿VIL, CONTRATADA O NO, CON L¿MITES M¿NIMOS POR EVENTO DE $100.000.000 / $100.000.000 / $200.000.000. EN CASO DE SINIESTRO, SE DEBE DEMOSTRAR LA RELACI¿N QUE EXISTE ENTRE EL VEH¿CULO SINIESTRADO Y EL CONTRATO AMPARADO BAJO LA P¿LIZA.

CL¿USULA DE GARANT¿A:
EL CONTRATISTA DEBE IMPLEMENTAR TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS PARA PREVENIR CUALQUIER CLASE DE ACCIDENTES A TERCEROS, COMO LO ES LA DEBIDA SE¿ALIZACI¿N, AVISOS, LOS RESPECTIVOS CERRAMIENTOS, DEMARCACI¿N DE LA OBRA, DEBIDO ESTUDIO DE LOS TRAZAMIENTOS DE RUTAS ALTERNAS Y DE LAS RUTAS INMEDIATAMENTE ADYACENTES A LA OBRA.

NOTA:
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PRESENTE P¿LIZA NO AMPARA LAS FALLAS Y/O INTERRUPCIONES EN LOS SERVICIOS P¿BLICOS, AS¿ COMO TAMPOCO LOS DA¿OS CONSECUENCIALES DERIVADOS DE DICHAS INTERRUPCIONES. EL TOMADOR ASEGURADO SE COMPROMETE A QUE SUS EMPLEADOS CUMPLAN ESTRICTAMENTE CON EL REGLAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

SEGUIR TODAS Y CADA UNA DE LAS DISPOSICIONES CONSIGNADAS EN EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PROTECCI¿N CONTRA CA¿DAS EN TRABAJO EN ALTURAS, RESOLUCI¿N 1409 DE 2012; DISPONER DE UN COORDINADOR, TRABAJADOR Y CERTIFICADO DE COMPETENCIA DE TRABAJO EN ALTURAS, DEBIDAMENTE CERTIFICADO SEG¿N LO ESTABLECIDO EN LA LEY COLOMBIANA.

EXCLUSIÓN DE TRANSCCIONES PROHIBIDAS, EMBARGOS Y SANCIONES ECONÓMICAS: LA COMPAÑÍA NO PROVEERA COBERTURA NI ESTARÁ OBLIGADA A PAGAR NINGUNA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO EN VIRTUD DE ESTA PÓLIZA SI LA PROVISIÓN DE DICHA COBERTURA, O EL PAGO DE DICHA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO PUDIERE EXPONER A LA COMPAÑÍA A ALGUNA SANCIÓN, PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN CONFORME A LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O SANCIONES COMERCIALES O ECONÓMICAS, LEYES O NORMATIVAS DE CUALQUIER JURISDICCIÓN APLICABLE A LA COMPAÑÍA.

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA. ***LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO.*** LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO SE DEBERA HACERA MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACION DE LA VIGENCIA DE LA POLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA. LAS CARÁTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL. CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LOS CANALES DE ATENCIÓN QUE SE ENCUENTAN EN LA PÁGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO, ***VER NOTA*** EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETÁNDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ÁRTICULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES. LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS. AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL. EL PRESENTE CERTIFICADO DE SEGUROS SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA 802091981 Y CERTIFICADO RE18993

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

(415)7709998911501(8020)0000000000

TOMADOR

María Juana Herrera Rodríguez
CC: 52.420.598

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

SU-FO-10-01

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA 802091981
CERTIFICADO RE19045
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO

SUCURSAL: C. ANDINO USUARIO: KDMORA TIPO CERTIFICADO: Endoso FECHA EXPEDICION: DD 16 MM 06 AAAA 2026

TOMADOR	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD:	SAN ANDRES
E-MAIL:	GRACIELA.RODRIGUEZ@EISA.COM.CO	TELÉFONO:	6684343
ASEGURADO:	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD: SAN ANDRES	TEL. 6684343
BENEFICIARIO:	TERCEROS AFECTADOS	C.C. O NIT:	0000000000
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	TEL.

VIGENCIA		VALOR ASEGURADO EN PESOS		
DESDE DD 23 MM 04 AAAA 2026	HASTA DD 08 MM 03 AAAA 2027	ANTERIOR 700,362,000.00	ESTA MODIFICACIÓN 0.00	NUEVA 700,362,000.00

INTERMEDIARIO		COASEGURO				PRIMA		
%PART	NOMBRE	COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRM:	MONEDA	VALORES
100.00	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS SAR LTDA ASESORES DE SEGU					PRIMA NETA	PESOS	
						CARGOS DE EMISIÓN	PESOS	
						IVA	PESOS	
						TOTAL		

AMPAROS	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta	VALOR ASEGURADO ANTERIOR EN PESOS	VALOR ASEGURADO NUEVO EN PESOS	VALOR PRIMA EN PESOS	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE Mínimo	DEDUCIBLE Hr
Predios Labores Operaciones / Vigencia	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	0
Predios Labores Operaciones / Evento	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Perjuicios Patrim Lucro Cesante / Vigencia	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Perjuicios Patrim Lucro Cesante / Evento	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Perjuicios Extrapatrimoniales / Vigencia	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Perjuicios Extrapatrimoniales / Evento	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Gastos Judiciales de Defensa / Vigencia	23-04-2026	08-03-2027	140,072,400.00	140,072,400.00		10	7,000,000.00	
Gastos Judiciales de Defensa / Evento	23-04-2026	08-03-2027	140,072,400.00	140,072,400.00		10	7,000,000.00	
Gastos Médicos de Urgencia / Vigencia	23-04-2026	08-03-2027	140,072,400.00	140,072,400.00				
Gastos Médicos de Urgencia / Evento	23-04-2026	08-03-2027	140,072,400.00	140,072,400.00				
Resp Civil Patronal / vigencia	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Resp Civil Patronal / Evento	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Resp Civil Contratistas Y Subcont / Vigencia	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Resp Civil Contratistas Y Subcont / Evento	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Resp Civil Vehículos Prop Y No Prop / Vigencia	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	100,000.00	
Resp Civil Vehículos Prop Y No Prop / Evento	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	

OBJETO DE LA PÓLIZA:

OBJETO DE MOFICICACIÓN: POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO CON FECHA DE JUNIO 09,2026.
DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

EXCLUSIÓN DE TRANSCCIONES PROHIBIDAS, EMBARGOS Y SANCIONES ECONÓMICAS: LA COMPAÑÍA NO PROVEERA COBERTURA NI ESTARÁ OBLIGADA A PAGAR NINGUNA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO EN VIRTUD DE ESTA PÓLIZA SI LA PROVISIÓN DE DICHA COBERTURA, O EL PAGO DE DICHA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO PUDIERE EXPONER A LA COMPAÑÍA A ALGUNA SANCIÓN, PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN CONFORME A LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O SANCIONES COMERCIALES O ECONÓMICAS, LEYES O NORMATIVAS DE CUALQUIER JURISDICCIÓN APLICABLE A LA COMPAÑÍA.

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA. ***LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO.*** LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO SE DEBERA HACERA MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACION DE LA VIGENCIA DE LA POLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA. LAS CARÁTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL. CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LOS CANALES DE ATENCIÓN QUE SE ENCUENTAN EN LA PÁGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO. ***VER NOTA*** EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETÁNDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ÁRTICULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES. LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS. AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL. EL PRESENTE CERTIFICADO DE SEGUROS SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA 802091981 Y CERTIFICADO RE18993

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TOMADOR

(415)7709998911901(8020)0000000000

María Juana Herrera Rodríguez
CC: 52.420.596

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

SU-FO-10-01

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE - SEGUNDA COPIA - INTERMEDIARIO

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA 802091981
CERTIFICADO RE19045
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO

SUCURSAL: C. ANDINO USUARIO: KDMORA TIPO CERTIFICADO: Endoso FECHA EXPEDICION: DD 16 MM 06 AAAA 2026

TOMADOR	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD:	SAN ANDRES
E-MAIL:	GRACIELA.RODRIGUEZ@EISA.COM.CO	TELÉFONO:	6684343
ASEGURADO:	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD: SAN ANDRES	TEL. 6684343
BENEFICIARIO:	TERCEROS AFECTADOS	C.C. O NIT:	0000000000
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	TEL.

VIGENCIA		VALOR ASEGURADO EN PESOS		
DESDE DD 23 MM 04 AAAA 2026	HASTA DD 08 MM 03 AAAA 2027	ANTERIOR	ESTA MODIFICACIÓN	NUEVA
		700,362,000.00	0.00	700,362,000.00

INTERMEDIARIO		COASEGURO				PRIMA		
%PART	NOMBRE	COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRM:	MONEDA	VALORES
100.00	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS SAR LTDA ASESORES DE SEGU					PRIMA NETA	PESOS	
						CARGOS DE EMISIÓN	PESOS	
						IVA	PESOS	
						TOTAL		

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y DE ACUERDO A REQUERIMIENTO, SE ACLARA:

ASEGURADO/BENEFICIARIO: ASOCIACI¿N SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO", IDENTIFICADA CON EL NIT 901.445.387-3, EL MUNICIPIO DE YOPAL Y EL CONTRATISTA.

INDEMNIZAR LOS DA¿OS Y/O PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES, SIEMPRE QUE DERIVEN DE UN DA¿O F¿SICO Y/O MATERIAL IMPUTABLES AL TOMADOR Y/O ASEGURADO DE LA P¿LIZA, Y CAUSADOS POR LESIONES, MUERTE Y/O DA¿OS A LA PROPIEDAD DE TERCEROS, Y DERIVADOS DE LA EJECUCI¿N DEL CONTRATO N.¿ 019 DE 2026, CUYO OBJETO ES:

IMPLEMENTACI¿N DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACI¿N EN LA V¿A LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.

ASEGURADO/BENEFICIARIO: ASOCIACI¿N SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO", IDENTIFICADA CON EL NIT 901.445.387-3 Y EL CONTRATISTA.

SISTEMA BASE DE COBERTURA POR OCURRENCIA.

AMPARO DE BIENES BAJO CUIDADO, TENENCIA Y CONTROL
SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR HURTO SIMPLE NI CALIFICADO, AS¿ COMO TAMPOCO LOS DA¿OS A LOS BIENES COMO TAL.

AMPAROS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS Y RC CRUZADA
OPERAN EN EXCESO DE LA P¿LIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL INDIVIDUAL, CONTRATADA O NO, POR CADA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA, CON UN L¿MITE M¿NIMO POR EVENTO DE $50.000.000. ESTOS AMPAROS APLICAN SIEMPRE QUE EL ASEGURADO PRINCIPAL SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE.

EXCLUSIÓN DE TRANSCCIONES PROHIBIDAS, EMBARGOS Y SANCIONES ECONÓMICAS: LA COMPAÑÍA NO PROVEERA COBERTURA NI ESTARÁ OBLIGADA A PAGAR NINGUNA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO EN VIRTUD DE ESTA PÓLIZA SI LA PROVISIÓN DE DICHA COBERTURA, O EL PAGO DE DICHA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO PUDIERE EXPONER A LA COMPAÑÍA A ALGUNA SANCIÓN, PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN CONFORME A LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O SANCIONES COMERCIALES O ECONÓMICAS, LEYES O NORMATIVAS DE CUALQUIER JURISDICCIÓN APLICABLE A LA COMPAÑÍA.

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA. ***LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO.*** LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO SE DEBERA HACERA MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA POLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA. LAS CARÁTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL, CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LOS CANALES DE ATENCIÓN QUE SE ENCUENTAN EN LA PÁGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO. ***VER NOTA*** EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETÁNDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ÁRTICULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA; DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES. LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS. AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL. EL PRESENTE CERTIFICADO DE SEGUROS SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA 802091981 Y CERTIFICADO RE18993

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TOMADOR

(415)7709998911901(8020)0000000000

María Juana Herrera Rodríguez
CC: 52.420.598

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

SU-FO-10-01

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE - SEGUNDA COPIA - INTERMEDIARIO

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA 802091981
CERTIFICADO RE19045
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO

SUCURSAL: C. ANDINO USUARIO: KDMORA TIPO CERTIFICADO: Endoso FECHA EXPEDICION: DD 16 MM 06 AAAA 2026

TOMADOR	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD:	SAN ANDRES
E-MAIL:	GRACIELA.RODRIGUEZ@EISA.COM.CO	TELÉFONO:	6684343
ASEGURADO:	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD: SAN ANDRES	TEL. 6684343
BENEFICIARIO:	TERCEROS AFECTADOS	C.C. O NIT:	0000000000
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	TEL.

VIGENCIA		VALOR ASEGURADO EN PESOS		
DESDE DD 23 MM 04 AAAA 2026	HASTA DD 08 MM 03 AAAA 2027	ANTERIOR	ESTA MODIFICACIÓN	NUEVA
		700,362,000.00	0.00	700,362,000.00

INTERMEDIARIO		COASEGURO				PRIMA		
%PART	NOMBRE	COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRM:	MONEDA	VALORES
100,00	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS SAR LTDA ASESORES DE SEGU					PRIMA NETA	PESOS	
						CARGOS DE EMISIÓN	PESOS	
						IVA	PESOS	
						TOTAL		

AMPARO DE VEH¿CULOS PROPIOS O NO PROPIOS
OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DE LA P¿LIZA DE AUTOM¿VIL, CONTRATADA O NO, CON L¿MITES M¿NIMOS POR EVENTO DE $100.000.000 / $100.000.000 / $200.000.000. EN CASO DE SINIESTRO, SE DEBE DEMOSTRAR LA RELACI¿N QUE EXISTE ENTRE EL VEH¿CULO SINIESTRADO Y EL CONTRATO AMPARADO BAJO LA P¿LIZA.

CL¿USULA DE GARANT¿A:
EL CONTRATISTA DEBE IMPLEMENTAR TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS PARA PREVENIR CUALQUIER CLASE DE ACCIDENTES A TERCEROS, COMO LO ES LA DEBIDA SE¿ALIZACI¿N, AVISOS, LOS RESPECTIVOS CERRAMIENTOS, DEMARCACI¿N DE LA OBRA, DEBIDO ESTUDIO DE LOS TRAZAMIENTOS DE RUTAS ALTERNAS Y DE LAS RUTAS INMEDIATAMENTE ADYACENTES A LA OBRA.

NOTA:
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PRESENTE P¿LIZA NO AMPARA LAS FALLAS Y/O INTERRUPCIONES EN LOS SERVICIOS P¿BLICOS, AS¿ COMO TAMPOCO LOS DA¿OS CONSECUENCIALES DERIVADOS DE DICHAS INTERRUPCIONES. EL TOMADOR ASEGURADO SE COMPROMETE A QUE SUS EMPLEADOS CUMPLAN ESTRICTAMENTE CON EL REGLAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

SEGUIR TODAS Y CADA UNA DE LAS DISPOSICIONES CONSIGNADAS EN EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PROTECCI¿N CONTRA CA¿DAS EN TRABAJO EN ALTURAS, RESOLUCI¿N 1409 DE 2012; DISPONER DE UN COORDINADOR, TRABAJADOR Y CERTIFICADO DE COMPETENCIA DE TRABAJO EN ALTURAS, DEBIDAMENTE CERTIFICADO SEG¿N LO ESTABLECIDO EN LA LEY COLOMBIANA.

EXCLUSIÓN DE TRANSCCIONES PROHIBIDAS, EMBARGOS Y SANCIONES ECONÓMICAS: LA COMPAÑÍA NO PROVEERA COBERTURA NI ESTARÁ OBLIGADA A PAGAR NINGUNA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO EN VIRTUD DE ESTA PÓLIZA SI LA PROVISIÓN DE DICHA COBERTURA, O EL PAGO DE DICHA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO PUDIERE EXPONER A LA COMPAÑÍA A ALGUNA SANCIÓN, PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN CONFORME A LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O SANCIONES COMERCIALES O ECONÓMICAS, LEYES O NORMATIVAS DE CUALQUIER JURISDICCIÓN APLICABLE A LA COMPAÑÍA.

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA. ***LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO.*** LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO SE DEBERA HACERA MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA POLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA. LAS CARÁTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL, CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LOS CANALES DE ATENCIÓN QUE SE ENCUENTAN EN LA PÁGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO, ***VER NOTA*** EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETÁNDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ÁRTICULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARÁ EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES. LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS. AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL. EL PRESENTE CERTIFICADO DE SEGUROS SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA 802091981 Y CERTIFICADO RE18993

(415)7709998911901(8020)0000000000

TOMADOR

María Juana Herrera Rodríguez
CC: 52.420.558

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

SU-FO-10-01

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA 802091981
CERTIFICADO RE19045
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO

SUCURSAL: C. ANDINO USUARIO: KDMORA TIPO CERTIFICADO: Endoso FECHA EXPEDICION: DD 16 MM 06 AAAA 2026

TOMADOR	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD:	SAN ANDRES
E-MAIL:	GRACIELA.RODRIGUEZ@EISA.COM.CO	TELÉFONO:	6684343
ASEGURADO:	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD: SAN ANDRES	TEL. 6684343
BENEFICIARIO:	TERCEROS AFECTADOS	C.C. O NIT:	0000000000
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	TEL.

VIGENCIA		VALOR ASEGURADO EN PESOS		
DESDE DD 23 MM 04 AAAA 2026	HASTA DD 08 MM 03 AAAA 2027	ANTERIOR	ESTA MODIFICACIÓN	NUEVA
		700,362,000.00	0.00	700,362,000.00

INTERMEDIARIO		COASEGURO				PRIMA		
%PART	NOMBRE	COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRM:	MONEDA	VALORES
100.00	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS SAR LTDA ASESORES DE SEGU					PRIMA NETA	PESOS	
						CARGOS DE EMISIÓN	PESOS	
						IVA	PESOS	
						TOTAL		

AMPAROS	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta	VALOR ASEGURADO ANTERIOR EN PESOS	VALOR ASEGURADO NUEVO EN PESOS	VALOR PRIMA EN PESOS	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE Mínimo	DEDUCIBLE Hr
Predios Labores Operaciones / Vigencia	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	0
Predios Labores Operaciones / Evento	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Perjuicios Patrim Lucro Cesante / Vigencia	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Perjuicios Patrim Lucro Cesante / Evento	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Perjuicios Extrapatrimoniales / Vigencia	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Perjuicios Extrapatrimoniales / Evento	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Gastos Judiciales de Defensa / Vigencia	23-04-2026	08-03-2027	140,072,400.00	140,072,400.00		10	7,000,000.00	
Gastos Judiciales de Defensa / Evento	23-04-2026	08-03-2027	140,072,400.00	140,072,400.00		10	7,000,000.00	
Gastos Médicos de Urgencia / Vigencia	23-04-2026	08-03-2027	140,072,400.00	140,072,400.00				
Gastos Médicos de Urgencia / Evento	23-04-2026	08-03-2027	140,072,400.00	140,072,400.00				
Resp Civil Patronal / vigencia	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Resp Civil Patronal / Evento	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Resp Civil Contratistas Y Subcont / Vigencia	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Resp Civil Contratistas Y Subcont / Evento	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	
Resp Civil Vehículos Prop Y No Prop / Vigencia	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	100,000.00	
Resp Civil Vehículos Prop Y No Prop / Evento	23-04-2026	08-03-2027	700,362,000.00	700,362,000.00		10	7,000,000.00	

OBJETO DE LA PÓLIZA:

OBJETO DE MOFICICACIÓN: POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO CON FECHA DE JUNIO 09,2026.
DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

EXCLUSIÓN DE TRANSCCIONES PROHIBIDAS, EMBARGOS Y SANCIONES ECONÓMICAS: LA COMPAÑÍA NO PROVEERA COBERTURA NI ESTARÁ OBLIGADA A PAGAR NINGUNA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO EN VIRTUD DE ESTA PÓLIZA SI LA PROVISIÓN DE DICHA COBERTURA, O EL PAGO DE DICHA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO PUDIERE EXPONER A LA COMPAÑÍA A ALGUNA SANCIÓN, PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN CONFORME A LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O SANCIONES COMERCIALES O ECONÓMICAS, LEYES O NORMATIVAS DE CUALQUIER JURISDICCIÓN APLICABLE A LA COMPAÑÍA.

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA. ***LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO.*** LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO SE DEBERA HACERA MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACION DE LA VIGENCIA DE LA POLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA. LAS CARÁTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL. CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LOS CANALES DE ATENCIÓN QUE SE ENCUENTAN EN LA PÁGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO. ***VER NOTA*** EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETÁNDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ÁRTICULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES. LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS. AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL. EL PRESENTE CERTIFICADO DE SEGUROS SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA 802091981 Y CERTIFICADO RE18993

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TOMADOR

(415)7709998911901(8020)0000000000

María Juana Herrera Rodriguez
CC: 52.420.598

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

SU-FO-10-01

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE - TERCERA COPIA - SUCURSAL/OFICINA EXPEDIDORA

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA 802091981
CERTIFICADO RE19045
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO

SUCURSAL: C. ANDINO USUARIO: KDMORA TIPO CERTIFICADO: Endoso FECHA EXPEDICION: DD 16 MM 06 AAAA 2026

TOMADOR	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD:	SAN ANDRES
E-MAIL:	GRACIELA.RODRIGUEZ@EISA.COM.CO	TELÉFONO:	6684343
ASEGURADO:	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD: SAN ANDRES	TEL. 6684343
BENEFICIARIO:	TERCEROS AFECTADOS	C.C. O NIT:	0000000000
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	TEL.

VIGENCIA		VALOR ASEGURADO EN PESOS		
DESDE DD 23 MM 04 AAAA 2026	HASTA DD 08 MM 03 AAAA 2027	ANTERIOR	ESTA MODIFICACIÓN	NUEVA
		700,362,000.00	0.00	700,362,000.00

INTERMEDIARIO		COASEGURO				PRIMA		
%PART	NOMBRE	COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRM:	MONEDA	VALORES
100.00	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS SAR LTDA ASESORES DE SEGU					PRIMA NETA	PESOS	
						CARGOS DE EMISIÓN	PESOS	
						IVA	PESOS	
						TOTAL		

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y DE ACUERDO A REQUERIMIENTO, SE ACLARA:

ASEGURADO/BENEFICIARIO: ASOCIACI¿N SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO", IDENTIFICADA CON EL NIT 901.445.387-3, EL MUNICIPIO DE YOPAL Y EL CONTRATISTA.

INDEMNIZAR LOS DA¿OS Y/O PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES, SIEMPRE QUE DERIVEN DE UN DA¿O F¿SICO Y/O MATERIAL IMPUTABLES AL TOMADOR Y/O ASEGURADO DE LA P¿LIZA, Y CAUSADOS POR LESIONES, MUERTE Y/O DA¿OS A LA PROPIEDAD DE TERCEROS, Y DERIVADOS DE LA EJECUCI¿N DEL CONTRATO N.¿ 019 DE 2026, CUYO OBJETO ES:

IMPLEMENTACI¿N DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACI¿N EN LA V¿A LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.

ASEGURADO/BENEFICIARIO: ASOCIACI¿N SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO", IDENTIFICADA CON EL NIT 901.445.387-3 Y EL CONTRATISTA.

SISTEMA BASE DE COBERTURA POR OCURRENCIA.

AMPARO DE BIENES BAJO CUIDADO, TENENCIA Y CONTROL
SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR HURTO SIMPLE NI CALIFICADO, AS¿ COMO TAMPOCO LOS DA¿OS A LOS BIENES COMO TAL.

AMPAROS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS Y RC CRUZADA
OPERAN EN EXCESO DE LA P¿LIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL INDIVIDUAL, CONTRATADA O NO, POR CADA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA, CON UN L¿MITE M¿NIMO POR EVENTO DE $50.000.000. ESTOS AMPAROS APLICAN SIEMPRE QUE EL ASEGURADO PRINCIPAL SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE.

EXCLUSIÓN DE TRANSCCIONES PROHIBIDAS, EMBARGOS Y SANCIONES ECONÓMICAS: LA COMPAÑÍA NO PROVEERA COBERTURA NI ESTARÁ OBLIGADA A PAGAR NINGUNA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO EN VIRTUD DE ESTA PÓLIZA SI LA PROVISIÓN DE DICHA COBERTURA, O EL PAGO DE DICHA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO PUDIERE EXPONER A LA COMPAÑÍA A ALGUNA SANCIÓN, PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN CONFORME A LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O SANCIONES COMERCIALES O ECONÓMICAS, LEYES O NORMATIVAS DE CUALQUIER JURISDICCIÓN APLICABLE A LA COMPAÑÍA.

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA. ***LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO.*** LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO SE DEBERA HACERA MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACION DE LA VIGENCIA DE LA POLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA. LAS CARÁTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL, CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LOS CANALES DE ATENCIÓN QUE SE ENCUENTAN EN LA PÁGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO, **VER NOTA** EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETANDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES. LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS. AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL. EL PRESENTE CERTIFICADO DE SEGUROS SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA 802091981 Y CERTIFICADO RE18993

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

(415)7709998911901(8020)0000000000

TOMADOR

María Juana Herrera Rodríguez
CC: 52.420.598

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

SU-FO-10-01

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE - TERCERA COPIA - SUCURSAL/OFICINA EXPEDIDORA

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA 802091981
CERTIFICADO RE19045
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO

SUCURSAL: C. ANDINO USUARIO: KDMORA TIPO CERTIFICADO: Endoso FECHA EXPEDICION: DD 16 MM 06 AAAA 2026

TOMADOR	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD:	SAN ANDRES
E-MAIL:	GRACIELA.RODRIGUEZ@EISA.COM.CO	TELÉFONO:	6684343
ASEGURADO:	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.E.I.A. S.A. EN REESTRUCTURACION	C.C. O NIT:	860533206 8
DIRECCIÓN:	CR Av. Circunvalar 01 Km 6 Vía El Cove, San Andrés B 166 73	CIUDAD: SAN ANDRES	TEL. 6684343
BENEFICIARIO:	TERCEROS AFECTADOS	C.C. O NIT:	0000000000
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	TEL.

VIGENCIA		VALOR ASEGURADO EN PESOS		
DD MM AAAA	DD MM AAAA	ANTERIOR	ESTA MODIFICACIÓN	NUEVA
DESDE 23 04 2026	HASTA 08 03 2027	700,362,000.00	0.00	700,362,000.00

INTERMEDIARIO		COASEGURO				PRIMA		
%PART	NOMBRE	COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRM:	MONEDA	VALORES
100.00	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS SAR LTDA ASESORES DE SEGU					PRIMA NETA	PESOS	
						CARGOS DE EMISIÓN	PESOS	
						IVA	PESOS	
						TOTAL		

AMPARO DE VEH¿CULOS PROPIOS O NO PROPIOS
OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DE LA P¿LIZA DE AUTOM¿VIL, CONTRATADA O NO, CON L¿MITES M¿NIMOS POR EVENTO DE $100.000.000 / $100.000.000 / $200.000.000. EN CASO DE SINIESTRO, SE DEBE DEMOSTRAR LA RELACI¿N QUE EXISTE ENTRE EL VEH¿CULO SINIESTRADO Y EL CONTRATO AMPARADO BAJO LA P¿LIZA.

CL¿USULA DE GARANT¿A:
EL CONTRATISTA DEBE IMPLEMENTAR TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS PARA PREVENIR CUALQUIER CLASE DE ACCIDENTES A TERCEROS, COMO LO ES LA DEBIDA SE¿ALIZACI¿N, AVISOS, LOS RESPECTIVOS CERRAMIENTOS, DEMARCACI¿N DE LA OBRA, DEBIDO ESTUDIO DE LOS TRAZAMIENTOS DE RUTAS ALTERNAS Y DE LAS RUTAS INMEDIATAMENTE ADYACENTES A LA OBRA.

NOTA:
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PRESENTE P¿LIZA NO AMPARA LAS FALLAS Y/O INTERRUPCIONES EN LOS SERVICIOS P¿BLICOS, AS¿ COMO TAMPOCO LOS DA¿OS CONSECUENCIALES DERIVADOS DE DICHAS INTERRUPCIONES. EL TOMADOR ASEGURADO SE COMPROMETE A QUE SUS EMPLEADOS CUMPLAN ESTRICTAMENTE CON EL REGLAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

SEGUIR TODAS Y CADA UNA DE LAS DISPOSICIONES CONSIGNADAS EN EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PROTECCI¿N CONTRA CA¿DAS EN TRABAJO EN ALTURAS, RESOLUCI¿N 1409 DE 2012; DISPONER DE UN COORDINADOR, TRABAJADOR Y CERTIFICADO DE COMPETENCIA DE TRABAJO EN ALTURAS, DEBIDAMENTE CERTIFICADO SEG¿N LO ESTABLECIDO EN LA LEY COLOMBIANA.

EXCLUSIÓN DE TRANSCCIONES PROHÍBIDAS, EMBARGOS Y SANCIONES ECONÓMICAS: LA COMPAÑÍA NO PROVEERA COBERTURA NI ESTARÁ OBLIGADA A PAGAR NINGUNA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO EN VIRTUD DE ESTA PÓLIZA SI LA PROVISIÓN DE DICHA COBERTURA, O EL PAGO DE DICHA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO PUDIERE EXPONER A LA COMPAÑÍA A ALGUNA SANCIÓN, PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN CONFORME A LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O SANCIONES COMERCIALES O ECONÓMICAS, LEYES O NORMATIVAS DE CUALQUIER JURISDICCIÓN APLICABLE A LA COMPAÑÍA.

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA. ***LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO.*** LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO SE DEBERA HACERA MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACION DE LA VIGENCIA DE LA POLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA. LAS CARÁTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL. CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LOS CANALES DE ATENCIÓN QUE SE ENCUENTAN EN LA PÁGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO. ***VER NOTA*** EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETANDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ÁRTICULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES. LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS. AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL. EL PRESENTE CERTIFICADO DE SEGUROS SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA 802091981 Y CERTIFICADO RE18993

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TOMADOR

(415)7709998911901(8020)0000000000

María Juana Herrera Rodríguez
CC 52.420.398

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

SU-FO-10-01

CONFIANZA

Swiss Re Corporate Solutions

NIT: 860.070.374-9

Canales de Pago:

- PSE en nuestra pagina web www.confianza.com.co en Pagos Confianza PC, registrese con c.c. o nit y el dígito de verificación, seleccione la opción: PSE/tarjeta de crédito.

- En entidades bancarias y corresponsales: (con código de barras, presentando este cupón)

Bancos:
BBVA Davivienda Banco de Bogotá

Corresponsales bancarios:
Corresponsales bancarios de Bancolombia
Grupo Éxito-Carulla
Surtimax
Olímpica
Movilred
Grupo Gelsa
Corresponsal Daviplata-punto red
Otros consúltelos en nuestra página web.

Copidrogas
Red Cerca
EDEQ
Full recarga

Referencia para pago electrónico: 0000000000

Nit: 860533206 **DV:** 8

Tomador: ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A. QUE PODRA ABREVIARSE E I A S.A

Póliza: 802091981 **Certificado:** RE19045 **SUCURSAL:** C. ANDINO

Valor Póliza:$ 0

FECHA DE DD MM AAAA

CANTIDAD DE CHEQUES	COD. BANCO	CHEQUE No.	VALOR
		CHEQUES $	
		EFECTIVO $	
		(*) TOTAL	

(415)7709998911901(8020)0000000000

IMPORTANTE:

- Si se requiere pagar más de una póliza, genere su cupón de pago en www.confianza.com.co en Pagos Confianza PC, regístrese con c.c. o nit y el dígito de verificación y seleccione las pólizas en la opción: Cupón de pagos.
- Es importante que esté actualizado su correo electrónico ya que a este le llegará su recibo de caja en línea, si paga por estos medios.
- No se reciben pagos mixtos.

(*) el valor a pagar puede ser menor o igual al valor de la póliza. No se reciben valores mayores al estipulado en este cupón.

- CLIENTE -

Dirección para notificaciones: Calle 82 Nº 11 - 37 Piso 7 - Bogotá, D.C.- Colombia. centrodecontacto@confianza.com.co

CONFIANZA

Swiss Re Corporate Solutions

NIT: 860.070.374-9

Canales de Pago:

- PSE en nuestra pagina web www.confianza.com.co en Pagos Confianza PC, registrese con c.c. o nit y el dígito de verificación, seleccione la opción: PSE/tarjeta de crédito.

- En entidades bancarias y corresponsales: (con código de barras, presentando este cupón)

Bancos:
BBVA Davivienda Banco de Bogotá

Corresponsales bancarios:
Corresponsales bancarios de Bancolombia
Grupo Éxito-Carulla
Surtimax
Olímpica
Movilred
Grupo Gelsa
Corresponsal Daviplata-punto red
Otros consúltelos en nuestra página web.

Copidrogas
Red Cerca
EDEQ
Full recarga

Referencia para pago electrónico: 0000000000

Nit: 860533206 **DV:** 8

Tomador: ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A. QUE PODRA ABREVIARSE E I A S.A

Póliza: 802091981 **Certificado:** RE19045 **SUCURSAL:** C. ANDINO

Valor Póliza:$ 0

FECHA DE DD MM AAAA

CANTIDAD DE CHEQUES	COD. BANCO	CHEQUE No.	VALOR
		CHEQUES $	
		EFECTIVO $	
		(*) TOTAL	

(415)7709998911901(8020)0000000000

IMPORTANTE:

- Si se requiere pagar más de una póliza, genere su cupón de pago en www.confianza.com.co en Pagos Confianza PC, regístrese con c.c. o nit y el dígito de verificación y seleccione las pólizas en la opción: Cupón de pagos.
- Es importante que esté actualizado su correo electrónico ya que a este le llegará su recibo de caja en línea, si paga por estos medios.
- No se reciben pagos mixtos.

(*) el valor a pagar puede ser menor o igual al valor de la póliza. No se reciben valores mayores al estipulado en este cupón.

- BANCO -

Dirección para notificaciones: Calle 82 Nº 11 - 37 Piso 7 - Bogotá, D.C.- Colombia. centrodecontacto@confianza.com.co

ANEXO F-2

INFORME EJECUTIVO AVANCE DE TOPOGRAFÍA EIA

PROYECTOS TRIPLE O S.A.S.
Nit. 901017241-1

SEGUIMIENTO A DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL

Durante el periodo objeto del presente informe, la Interventoría realizó el seguimiento y revisión de la documentación presentada por el Contratista, correspondiente al Informe Ejecutivo de Avance de Topografía.

2. Informe Ejecutivo de Avance de Topografía

La Interventoría realizó la revisión del Informe Ejecutivo de Avance de Topografía presentado por el Contratista, correspondiente al levantamiento y replanteo del tramo de 13,45 km.

De acuerdo con la información presentada y el seguimiento efectuado, se evidenció que el levantamiento topográfico base de los 13,45 km fue culminado. No obstante, el replanteo topográfico definitivo se encuentra en proceso de consolidación final, debido al ajuste técnico del diseño relacionado con la modificación de las interdistancias de 35 m a 30 m, orientada a garantizar los niveles de iluminancia (Lux) exigidos por el RETILAP.

En particular, se reporta que el proceso de replanteo definitivo correspondiente al sector comprendido entre las estructuras N.° 244 y N.° 246 se encuentra temporalmente suspendido en campo, mientras se adelanta el ajuste planimétrico requerido en gabinete.

Como parte del proceso de ajuste, el Contratista deberá realizar el modelamiento y recálculo del sector mediante el software DIALux, considerando los parámetros técnicos aplicables del RETILAP, especialmente los relacionados con iluminancia, uniformidad y control del deslumbramiento para las vías clasificadas como M5/M6.

La Interventoría realizará el seguimiento a la reingeniería propuesta, verificando que las modificaciones planteadas para la ubicación de los apoyos y las interdistancias resulten técnicamente viables, cumplan con los criterios de seguridad establecidos y mantengan el retiro mínimo de 1,50 m respecto del borde de la calzada, sin generar afectaciones a la propiedad privada.

Una vez finalizada la validación de las simulaciones, se deberá verificar la entrega de la base de datos topográfica corregida en formato digital y de los planos correspondientes al replanteo definitivo.

Carrera 54D # 135 - 34
Int. 2 Apto 403
Tel. 313 408 3199
Sfé de Bogotá

PROYECTOS TRIPLE O S.A.S.
Nit. 901017241-1

Estado: En proceso de consolidación y ajuste técnico.


Concepto de la Interventoría

La Interventoría considera que el avance del levantamiento topográfico base presenta un cumplimiento satisfactorio, encontrándose culminado el levantamiento correspondiente a los 13,45 km. Sin embargo, permanece pendiente la consolidación del replanteo topográfico definitivo en el sector comprendido entre las estructuras N.° 244 y N.° 246, actividad que deberá ser objeto de seguimiento hasta la culminación de los ajustes de diseño, validación de las simulaciones y entrega de los productos topográficos definitivos.

La Interventoría continuará realizando el seguimiento técnico correspondiente, con el fin de verificar que los ajustes propuestos sean debidamente soportados y que los productos finales sean consistentes con el diseño aprobado, las condiciones de campo y los requisitos técnicos y normativos aplicables.

Se adjuntan soportes entregados por el contratista.

Carrera 54D # 135 - 34
Int. 2 Apto 403
Tel. 313 408 3199
Sfé de Bogotá



ENERGÍA INTEGRAL ANDINA.

www.eia.com.co

INFORME TÉCNICO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y REPLANTEO

PROYECTO

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE

CONTRATO N°	019 de 2026
ITEM 1.1	Replanteo de Obra
TRAMO	Vía Terciaria – 13.45 KM

JUNIO 2026

Introducción

El presente informe técnico detalla los trabajos de topografía realizados para el replanteo y ubicación de postes con luminarias solares aisladas a lo largo de un tramo de vía terciaria de 13.45 kilómetros en el sector La Pedrera, municipio de Yopal. El objetivo principal es garantizar la correcta materialización en campo de los puntos de iluminación proyectados, asegurando el cumplimiento de las distancias de seguridad, la normativa vial vigente y las directrices de los operadores de redes de servicios públicos.

Es importante señalar que los datos de campo presentados constituyen una base preliminar avanzada, dado que la localización definitiva de los apoyos se encuentra en proceso de validación y ajuste planimétrico mediante simulación computarizada de ingeniería fotométrica.


Objetivos

Objetivo General:

Ejecutar el replanteo topográfico de precisión para la ubicación de postes de alumbrado público solar en una longitud de 13.45 km, garantizando la compatibilidad del diseño con la infraestructura existente de gas natural y energía eléctrica de los operadores de la región.

Objetivos Específicos:

1. Materializar en campo los ejes y puntos de excavación para la cimentación de los postes de forma segura.
2. Verificar las condiciones del terreno e identificar interferencias críticas con redes de servicios públicos existentes (gas, electricidad, telecomunicaciones) y otros elementos (vegetación, accesos).
3. Incorporar las cartografías de redes de distribución disponibles para mitigar riesgos de excavación en campo.
4. Adoptar e integrar las distancias mínimas de aislamiento exigidas por las empresas prestadoras de servicios públicos.
5. (Pendiente - Alcance Parcial) Culminar el ajuste planimétrico definitivo de la ubicación de los postes de alumbrado público. Este objetivo no ha sido alcanzado al 100% debido a que se encuentra en ejecución la ingeniería de detalle y la simulación luminotécnica obligatoria, la cual modificará la posición de los puntos de acuerdo con los parámetros de entrada y criterios normativos de diseño que se detallan a continuación.



ENERGÍA INTEGRAL ANDINA.

www.eia.com.co

Cuadro de Parametrización para DIALux (Interdistancia: 30m)

El ajuste planimétrico final y la aprobación del 100% de los puntos de excavación en campo dependen de la validación de los siguientes criterios técnicos y normativos en el software de simulación:

Categoría en DIALux	Parámetro de Entrada /	Valor a Configurar en DIALux	Impacto Técnico por Cambio a 30m
Arreglo de Postes	Interdistancia (Separación)	30,00 metros	Parámetro fijo para esta simulación.
Geometría de la Vía	Ancho de la calzada	6,10 metros	Dos carriles de 3,05 m en doble sentido de circulación.
Geometría de la Vía	Retiro del poste (Setback)	1,50 metros	Distancia de seguridad desde el borde de vía al eje del poste.
Arreglo de Postes	Altura de montaje (H)	12,00 metros	Altura del punto de luz (fuente led) sobre el suelo.
Arreglo de Postes	Longitud del brazo	2,00 metros	Sobrevuelo constante de 0,50 m sobre la calzada.
Arreglo de Postes	Inclinación del brazo	10° (Grados)	Ángulo fijo orientado hacia el flujo vehicular.
Arreglo de Postes	Disposición de los postes	Unilateral	Todos los postes ubicados en un solo costado de la vía.
Datos Técnicos Luminaria	Modelo de luminaria	Unilumin 653 Elite PRO 35W	Cargar archivo fotométrico .IES o .LDT de 7350 lm.
Mantenimiento	Factor de mantenimiento (\(F_{m}\))	0,80	Factor de depreciación por suciedad y entorno periurbano.
Perfil del Proyecto	Classification de la vía	M5 / M6	Criterio de comparación para vías terciarias / locales.
Resultados Esperados	Iluminancia promedio (\(E_{prom}\))	≥ 9,00 a 11,00 Lux	Incremento: El nivel de Lux subirá un ~15% frente a la opción de 35m.
Resultados Esperados	Uniformidad general (U_0)	≥ 0,45	Mejora: Se logra una distribución de luz altamente homogénea.
Resultados Esperados	Deslumbramiento (TI)	TI ≤ 10%	Se mantiene muy seguro y confortable para ambos sentidos de tránsito.

Metodología y Equipos Utilizados

Para garantizar la precisión exigida por el proyecto y la protección de las redes de servicios públicos, se empleó un método combinado de posicionamiento global por satélite (GNSS) y medición de precisión con Estación Total.

Equipos Empleados

- Línea Base / Control: Par de Receptores GNSS Diferencial (RTK).
- Levantamiento/Replanteo: Estación Total de precisión angular de 1".
- Accesorios: Prismas, bastones telescópicos, tiralíneas, pintura de tráfico y estacas de madera/acero.

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO		
NOMBRE	GNSS RTK	
SERIAL	TA 11660672	
MARCA	HI-TARGET-V30 PLUS	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO		
NOMBRE	GNSS RTK	
SERIAL	TA 11660575	
MARCA	HI-TARGET-V30 PLUS	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO		
NOMBRE	GNSS RTK	
SERIAL	TA 11660274	
MARCA	HI-TARGET-V30 PLUS	

Procedimiento de Campo y Coordinación de Interdisciplinar

1. Enlace Geodésico: Se tomaron como base los vértices geodésicos oficiales más cercanos para amarrar el proyecto al sistema de coordenadas local (Magna-Sirgas / WGS84).
2. Poligonal de Apoyo: Se estableció una poligonal cerrada a lo largo de los 13.45 km para asegurar el control altimétrico y planimétrico.
3. Cruce Cartográfico de Seguridad: Previo al marcado, se superpuso el diseño digital con las cartografías de las redes de distribución de gas natural en el municipio de Yopal.
4. Replanteo y Ajuste: Con las coordenadas verificadas y aplicando la nueva interdistancia reglamentaria de 30 metros derivada de los criterios DIALux, se procede a reajustar físicamente en el terreno la posición de cada apoyo mediante estacas y pintura reflectiva, indicando su respectiva progresiva.

Resumen de Datos Técnicos del Tramo (Proyectado con Ajuste a 30m)

Parámetro	Descripción / Valor
Longitud Total del Tramo	13.45 km (13,450 metros)
Interdistancia Fija de Diseño	30.00 metros (ajustada por criterio luminotécnico)
Total de Postes Estimados	~425 unidades (sujeto a la distribución final por geometría vial)
Sistema de Coordenadas	UTM / Proyección Local Oficial MAGNA-SIRGAS
Tolerancia Planimétrica Máxima	± 2 cm
Tolerancia Altimétrica Máxima	± 3 cm

Lineamientos Técnicos y Distancias Mínimas de Seguridad (Obligatorios)

Conforme a los manuales de prevención de daños de los operadores de gas natural y energía, la excavación de las bases de los postes debe cumplir estrictamente las siguientes condiciones de aislamiento:

Distancia a Redes Eléctricas: Las fundaciones de los postes y sus canalizaciones deben mantener una distancia mínima de 50 cm respecto a las instalaciones eléctricas existentes (RETIE).

Distancia a Redes de Gas Natural: Se debe mantener una distancia mínima de 30 cm respecto a las tuberías subterráneas de gas y otras redes (agua, telefonía).

Ubicación de Tuberías: Las redes plásticas (generalmente amarillas) cuentan con una cinta de advertencia situada aproximadamente a 20 cm sobre el tubo. La red de acero de alta presión de Cusianagas se encuentra a 1.20 metros de profundidad y está señalizada mediante mojones. No se debe interferir con sus trayectorias.

Restricción Biológica: No se permite la siembra o reubicación de árboles de raíces profundas o fuertes sobre las áreas de paso de las tuberías de gas natural.

Principales Hallazgos e Interferencias

Durante el desarrollo del replanteo preliminar se identificaron los siguientes puntos críticos que requerirán un tratamiento especial al aplicar la nueva interdistancia de 30 metros:

Progresiva K2+340 al K2+410: Presencia de arbolado denso que obstruye la proyección de la luminaria solar. Se recomienda poda selectiva o reajuste fino del poste en el software para optimizar la captación fotovoltaica y evitar raíces sobre ductos.

Progresiva K7+150: Cruce con red subterránea de fibra óptica existente. Se modificó el punto de excavación para cumplir con la distancia mínima de 30 cm respecto a otras redes.

Proximidad a Redes de Gas: Con base en la cartografía de los operadores locales, se identificaron las poliválvulas y mojones de señalización de la red. Los puntos de excavación definitivos se ajustarán para no obstruir las tapas de las poliválvulas ni alterar los elementos de señalización del gasoducto.

Interferencia Crítica por Geometría Vial y Predios (Postes N° 244, N° 245 y N° 246): Durante la verificación y correlación planimétrica en el software de diseño, se evidenció que la ubicación proyectada para los apoyos N° 244, N° 245 y N° 246 presenta una inconsistencia geométrica grave: sus puntos de cimentación quedan localizados dentro de áreas privadas (predios de terceros) o invadiendo directamente la calzada vial. Esta condición impide su materialización física bajo el esquema actual, requiriendo un rediseño geométrico inmediato en este sector para garantizar que los postes permanezcan estrictamente dentro de la faja de retiro o zona de espacio público autorizado.

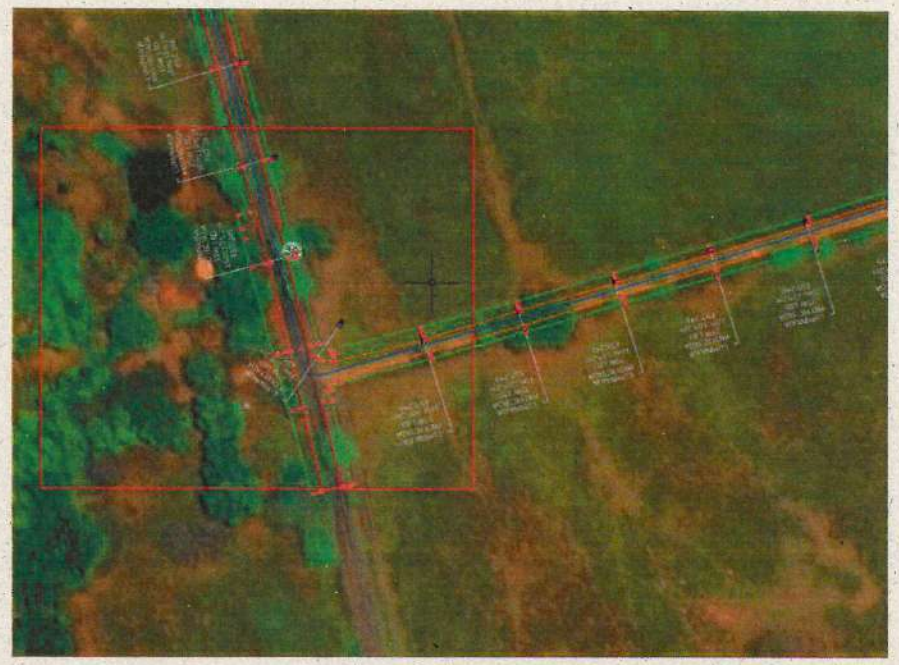


Imagen 1: Interferencia Crítica por Geometría Vial y Predios (Postes N° 244, N° 245 y N° 246)



Imagen 2: Interferencia Crítica por Geometría Vial y Predios (Postes N° 329)

Conclusiones y Protocolos Obligatorios para la Obra

1. El trabajo de levantamiento topográfico base de los 13.45 km se culminó con éxito. Sin embargo, el replanteo definitivo se encuentra en fase de consolidación final debido a la migración técnica del diseño de interdistancias de 35 m a 30 m para garantizar los Lux exigidos por el RETILAP.

2. El proceso de replanteo topográfico definitivo para el sector que comprende las estructuras N° 244 a N° 246 se encuentra oficialmente suspendido en campo. El paso inmediato a seguir es realizar un ajuste planimétrico riguroso en gabinete.

3. Se procederá a modelar y recalcular el sector afectado mediante el software DIALux, aplicando de manera estricta los parámetros de la normativa RETILAP (especialmente los criterios de iluminancia, uniformidad general y control de deslumbramiento para vías clase M5/M6).

4. El objetivo de esta reingeniería es desplazar lateral o longitudinalmente los apoyos comprometidos, modificando si es necesario las interdistancias adyacentes en un rango seguro, hasta obtener una configuración que sea técnicamente viable ante el operador de red y que cumpla con el retiro (setback) de seguridad de 1,50 metros respecto al borde de la calzada vial, sin afectar la propiedad privada.

5. Se entregará la base de datos corregida en formato digital y los planos de replanteo finales una vez se valide el 100% de las simulaciones.

Anexos

Anexo A: Cuadro de Coordenadas de Postes Replanteados (Poste 1 al Poste Final - En proceso de ajuste).

Anexo B: Monografías de los Puntos de Control Topográfico (BMs).

Anexo C: Registro fotográfico de los puntos materializados.

Anexo D: Cartografía de redes de distribución de gas - ENERCA / Cusianagas

Fanny Barrera González
Topógrafa LP N°10-580 CPNT
