

ENERGÍA INTEGRAL ANDINA

www.eia.com.co

INFORME MENSUAL DEL OBRA No. 2

Del 01 de julio al 31 de Julio de 2026

OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE

CONTRATISTA:

ENERGIA INTEGRAL ANDINA

INTERVENTORÍA:

PROYECTOS TRIPLE O S.A.S.

VILLAVICENCIO, META.

LISTA DE CHEQUEO CONTRATO DE OBRA
INFORME MENSUAL

No BPIN (Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional):	**2025850010003**		
CONTRATO N°	**019 de 2026**	**FECHA:**	**24/04/2026**
OBJETO DEL CONTRATO	**IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE**		
PERIDO COMPRENDIDO ENTRE EL:	**01 al 31 de julio de 2026**		

INFORME MENSUAL No 02	**FORMATO DE LA ASOSUPRO**	**CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO / N/A**
INFORME DE OBRA, y los siguientes anexos**:**	SI	SI
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO (contratista manifieste, su plan de trabajo, frentes de obra, Orden de ejecución, descripción general de la ejecucion del proyecto - **Aplica para el primer informe de obra)**	N/A	N/A
ACTA APROBACIÓN PERSONAL OPERATIVO. (Según Anexo tecnico, la aprobacion es generada por la Interventoria en concordancia con el perfil profesional según el anexo tecnico de obra, del proceso de licitación).	N/A	N/A
CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DEL CONTRATISTA (Antecedentes Judiciales, disciplinarios y fiscales). Nota: En caso de que el contratista sea consorcio y/o unión temporal, se debe adjuntar de cada persona natural y/o jurídica que la conforman.	NO	SI
HOJA DE VIDA PERSONAL en concordancia con al perfil solicitado en el proceso de contratación.	NO	N/A
APU - ANALISIS DE PRECIO UNITARIO OBRA (De todas las actividades incluidas en la lista de cantidades y precios presentados en la oferta); Aplica para el primer informe.	N/A	N/A
LISTA DE INSUMOS (Aprobada por la Interventoria); Aplica para el primer informe.	N/A	N/A
COPIA ACTA DE VECINDAD, Cuando aplique cada mes.	N/A	SI
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO- PMT, Se entrega con el primer informe mensual, validado por la interventoría y aprobado por la autoridad competente. Si Aplica	NO	SI
ENTREGA DE DOTACIÓN Y/O ELEMENTOS PROTECCIÓN PERSONAL	SI	SI
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Informe de las acciones realizadas en cumplimiento del plan.	NO	SI
INFORME IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	SI	SI
ACTA RESUMEN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO - CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA	SI	N.A
CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	SI	SI

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA	SI	SI
BITACORA DE OBRA (Copia)	SI	SI
ACTA APROBACIÓN CAMBIO DE PERSONAL (Cuando Aplique)	N/A	N/A
INFORME DE INTERVENTORIA	SI	SI

NOTAS

*TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER ORIGINALES, IMPRESIÓN CLARA Y A COLOR, SERÁN RADICADOS ÚNICAMENTE POR EL SUPERVISOR DONDE DEBEN ESTAR FOLIADOS 1-200 EN CARPETAS DE CONFORMIDAD A LA LEY DE ARCHIVO Y CARGADOS A LAS PLATAFORMAS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD . *LA LISTA DE CHEQUEO DEBE IR FIRMADA POR LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DEL PROCESO, COMO INDICADOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS AQUI ESTABLECIDOS.

OBSERVACIONES

Firma
Nombre: LAURO DANIEL LEÓN GARZÓN
DIRECTOR OBRA
M.P. 20641705

Firma
Nombre: Miguel Angel Caro Jimenez
DIRECTOR INTERVENTORIA
M.P. CN205-139465

Firma
Nombre: JEFFERSON PARRA CAPERA
APOYO A LA SUPERVISOR
M.P. CN205-68996

Firma
Nombre: LINA MELISA ROJAS VALBUENA
SUPERVISOR
M.P. A1202018-1122138384

Nota: Una vez cumplido el proceso de verificación por cada responsable se debe firmar la lista de chequeo



ENERGÍA INTEGRAL ANDINA.

www.eia.com.co

ACTAS DE COMITÉ

INFORME DE OBRA

INFORME MENSUAL No. 02

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

INFORME MENSUAL
Periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026
Fecha de Presentación: 16/09/2026

INFORMACIÓN BÁSICA	
OBJETO CONTRATO DE OBRA:	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.
VALOR DEL CONTRATO:	$5.369.899.707
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	$5.369.899.707
CONTRATISTA DE OBRA	Energía Integral Andina S.A.
CORREO ELECTRÓNICO:	gerencia@eiasa.com.co; carlos.naranjo@eiasa.com.co
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	019 de 2026
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	Proyectos Triple O S.A.S.
CORREO ELECTRÓNICO:	Juamclp0315@hotmail.com; tripleosas@hotmail.com

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL			
FECHA DE INICIACIÓN:			09/06/2026
PRÓRROGA:			N/A
SUSPENSIÓN:			N/A
TIEMPO:			N/A
REINICIO:			N/A
FECHA DE TERMINACIÓN		08/03/2027	
TIEMPO DE EJECUCIÓN			Nueve (9) meses
9	Meses	0	Días

INFORME MENSUAL No. 02

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

MUNICIPIO:	YOPAL CASANARE	VEREDA:	Vía La Pedrera
CORREGIMIENTO:	N/A	BARRIO:	Vía La Pedrera
COMUNA:	N/A		

COORDENADAS:


TRAMO A INTERVENIR							
PUNTO INICIAL				PUNTO FINAL			
K0+000				K12+7353,93			
PLANAS		GEOGRAFICAS		PLANAS		GEOGRAFICAS	
N: 1079910.452	E:855282.146	LAT: 5.317450°	LONG: -72.383000°	N:1078981.067	E:854818.949	LAT: 5.309039°	LONG:-72.387160°

MAPA DE LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO



INFORME MENSUAL No. 02

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

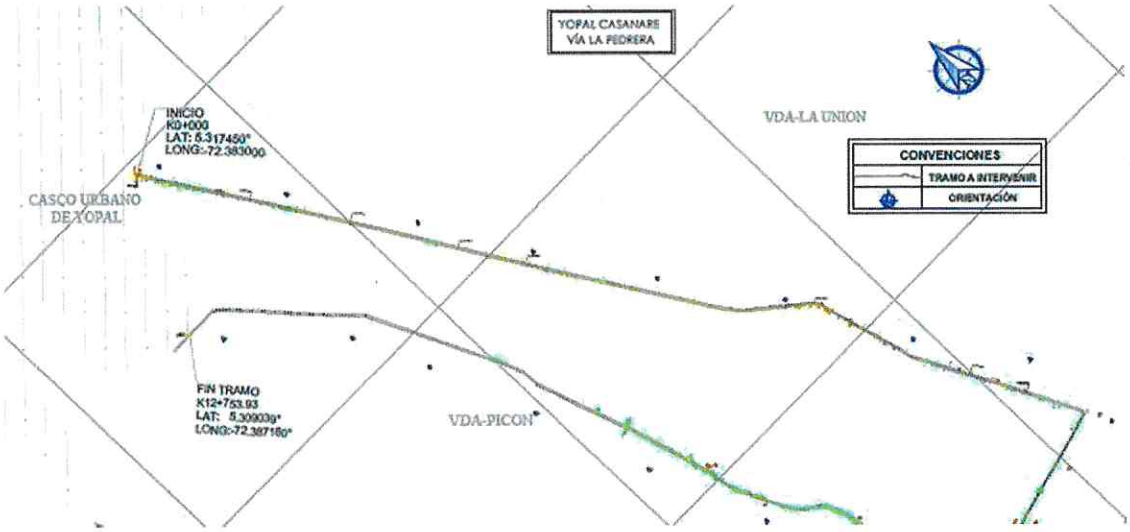

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La alternativa de solución consiste en instalar un sistema de alumbrado público basado en tecnología solar fotovoltaica, mediante luminarias autónomas que captan, almacenan y utilizan la energía solar para la iluminación nocturna de la vía la pedrera del municipio de Yopal, Casanare. Esta solución busca suplir la carencia de infraestructura eléctrica convencional, aprovechando las condiciones de irradiación solar de la región, garantizando así una solución eficiente, sostenible y de bajo impacto ambiental.

Esta solución tecnológica corresponde a un sistema de iluminación solar autónomo de baja potencia, diseñado especialmente para aplicaciones de alumbrado en zonas rurales, senderos peatonales, parques, áreas comunes o vías secundarias con baja densidad vehicular.

Esta alternativa se compone de los siguientes elementos:

- Luminaria LED de 35W, con eficiencia lumínica mayor a 140 lm/W, garantizando un nivel de iluminación adecuado para áreas de baja exigencia.
- Panel solar monocristalino, de alta eficiencia, optimizado para cargas solares diarias promedio y dimensionado para garantizar una autonomía mínima de 44 horas, incluso en días consecutivos con baja radiación solar.
- Batería de Litio $LiFePO_4$, con vida útil estimada de entre 8 y 10 años, diseñada para soportar 2.000 ciclos de descarga al 50%.
- Controlador inteligente con tecnología MPPT, que optimiza la conversión de energía solar, gestiona la carga y descarga de la batería.

INFORME MENSUAL No. 02

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

A. INFORME TÉCNICO

1. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el mes de julio de 2026, se continuó con la ejecución del Contrato de Obra No. 019 de 2026. Una vez culminadas las actividades logísticas y de alistamiento requeridas para el inicio de las labores operativas, se dio inicio a las actividades de excavación manual para la construcción de las cimentaciones de los postes, así como a la continuidad del replanteo y localización de los puntos de instalación.

En desarrollo de estas actividades, durante el periodo objeto del presente informe se ejecutaron las siguientes labores:

1. **Replanteo topográfico:**

   Se continuó con el análisis del corredor vial con el propósito de identificar y localizar los puntos proyectados para la instalación de los postes, verificando las interdistancias establecidas en los diseños, la ubicación respecto al eje de la vía y las condiciones físicas y del terreno en cada sector intervenido.

   No obstante, el replanteo topográfico no ha podido finalizarse en su totalidad, debido a la ausencia de información técnica y administrativa suficiente que permita certificar el perfil vial requerido para la totalidad de los puntos proyectados entre los postes 194 al 244. De acuerdo con la revisión realizada por parte del equipo de planeación de la Alcaldía, de los actos administrativos disponibles, se evidenció que en ninguno de los doce (12) actos administrativos revisados se encuentra incorporado o certificado de manera expresa el perfil vial correspondiente a la vía principal de La Pedrera.

   Adicionalmente, se identificó que las condiciones actualmente construidas en algunos sectores del corredor presentan diferencias respecto de las características y perfiles que pueden ser soportados documentalmente, situación que impide establecer con el nivel de certeza requerido la ubicación definitiva de determinados puntos de instalación.

   En consecuencia, y con el fin de evitar que el replanteo se realice sobre información que posteriormente pueda resultar inconsistente con las condiciones oficialmente reconocidas de la vía, se mantiene pendiente la culminación del replanteo en los sectores afectados, hasta contar con la información, certificación o definición correspondiente por parte de la entidad competente.

   Se realizará mesa de trabajo conjunta con la Interventoría para definir cómo se procederá a completar el replanteo y a validar las ubicaciones definitivas de los postes conforme a los diseños y criterios técnicos del proyecto.

2. **Ajuste de diseño y localización:**

Con base en los resultados obtenidos durante el replanteo topográfico (de la zona con perfila víal) y la verificación de las condiciones encontradas en campo, se procedió a realizar los ajustes correspondientes a los planos constructivos y archivos KMZ, con el fin de definir y documentar la ubicación de los puntos de instalación. Estos ajustes permiten establecer la localización precisa de cada poste, garantizando su correspondencia con los criterios técnicos, las interdistancias previstas en el diseño y las condiciones reales del corredor vial.

3. **Gestión administrativa y logística:**

Durante el periodo se adelantaron las actividades de coordinación administrativa, gestión de compras, programación y planificación de los recursos humanos, técnicos, materiales y logísticos, de acuerdo con las necesidades del proyecto y en concordancia con los plazos establecidos y la ruta crítica del cronograma de ejecución. Estas actividades estuvieron orientadas a garantizar la disponibilidad oportuna de los recursos requeridos para el desarrollo continuo de las actividades operativas en campo.

4. **Desmonte y limpieza en zonas no boscosas:**

Una vez el equipo de topografía realiza la localización, señalización y verificación de los puntos de instalación, de acuerdo con las interdistancias definidas en los diseños y la distancia requerida respecto al eje de la vía, se procede con las actividades de desmonte y limpieza del área.

Estas actividades comprenden el retiro manual de la cobertura vegetal y del material superficial en un área aproximada de 4 m2 alrededor de cada punto de instalación, utilizando herramientas manuales, principalmente machete. El objetivo es adecuar, despejar y acondicionar el área de trabajo, garantizando las condiciones necesarias para la posterior ejecución de las excavaciones y la construcción de las cimentaciones de los postes.

5. **Excavación manual del sitio para cimentación de postes:**

Una vez finalizadas las actividades de desmonte y limpieza, se procede con la excavación manual de los puntos destinados a la cimentación de los postes, de acuerdo con las dimensiones establecidas en los diseños previamente elaborados y aprobados. Para cada punto se contempla una excavación de aproximadamente 0,50m x 0,5m de área y 1,80 m de profundidad, garantizando las dimensiones requeridas para la posterior ejecución de la cimentación y la instalación de los postes.

6. **Señalización de la excavación:**

Una vez finalizada la apertura de cada excavación, se procede a su señalización y delimitación mediante cinta de seguridad, con el propósito de advertir y restringir el acceso al área intervenida, prevenir caídas y minimizar los riesgos asociados a la presencia de excavaciones abiertas para el personal que transita o desarrolla actividades en la zona de trabajo.

INFORME MENSUAL No. 02

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

PROGRAMACIÓN INICIÓN

"IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE"

ITEM	ACTIVIDAD	INICIO	FIN	DURACION (días)	VALOR CONTRATO	VALOR MGA	VALOR x DÍA	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
1	PRELIMINARES				$ 56.977.806,00	$ 60.172.549,00	$ 1.326.531,33											
1,01	Replanteo de obra	9/06/2026	24/07/2026	46	$ 49.225.360,00	$ 51.965.965,76	$ 1.070.116,52	$ 23.542.563,48	$ 25.682.796,52									$ 49.225.360,00
1,02	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas del sitio (incluye retiro disposición final)	1/06/2026	30/06/2026	30	$ 7.752.446,00	$ 8.186.583,24	$ 258.414,67			$ 7.752.446,00								$ 7.752.446,00
2	ALUMBRADO PÚBLICO				$ 5.252.176.585,00	$ 5.547.325.439,00	$ 30.638.954,37											
2,02	Excavación manual en material común del sitio para cimentación de postes de alumbrado público solar (incluye retiro y disposición final)	1/09/2026	15/10/2026	45	$ 34.758.796,00	$ 36.705.288,84	$ 772.417,69				$ 23.172.530,67	$ 11.586.265,33						$ 34.758.796,00
2,02	Suministro e instalación de poste en fibra de vidrio para alumbrado público (12mt 510kgf)	1/08/2026	30/01/2027	180	$ 1.985.686.509,00	$ 2.097.249.099,00	$ 11.031.591,72			$ 330.947.751,50	$ 330.947.751,50	$ 330.947.751,50	$ 330.947.751,50	$ 330.947.751,50	$ 330.947.751,50			$ 1.985.686.509,00
2,03	Cimentación para postes de alumbrado público solar	15/09/2026	15/12/2026	91	$ 173.164.630,00	$ 182.910.858,24	$ 1.902.908,02				$ 30.446.528,36	$ 57.067.240,66	$ 57.067.240,66	$ 28.543.620,33				$ 173.164.630,00
2,04	Suministro e instalación de luminarias solar ELITE III PRO INI-SL Incluye (Luminaria LED, Panel solar fotovoltaico y batería, soporte para conectores, brazo metálico galvanizado y soliarin ant vandalico)	1/08/2026	30/01/2027	180	$ 3.058.566.650,00	$ 3.230.460.150,72	$ 16.992.036,94			$ 509.761.108,33	$ 509.761.108,33	$ 509.761.108,33	$ 509.761.108,33	$ 509.761.108,33	$ 509.761.108,33		$ 296.343.597,00	$ 3.356.910.247,00
TOTAL PROGRAMADO (AIU INCLUIDO)					$ 5.309.154.391,00	$ 5.607.497.988,00	$ 32.027.486,00	$ 23.542.563,48	$ 25.682.796,52	$ 848.461.305,85	$ 894.327.518,85	$ 909.382.365,83	$ 897.796.100,49	$ 869.252.480,16	$ 840.708.859,83		$ 296.343.597,00	$ 5.607.497.988,00
PORCENTAJE A COBRAR INTEVENTORIA								0,42%	0,46%	15,13%	15,94%	16,22%	16,01%	15,50%	14,99%		5,29%	100,00%
4	RETILAP	1/02/2027	14/03/2027	44	$ 14.277.144,00	$ 14.280.000,00	$ 324.480,55								$ 1.946.563,27	$ 9.734.416,36	$ 2.598.700,36	$ 14.280.000,00
5	PMA	9/06/2026	9/02/2027	240	$ 46.468.172,00	$ 46.468.172,00	$ 193.617,38	$ 4.259.582,43	$ 5.808.521,50	$ 5.808.521,50	$ 5.808.521,50	$ 5.808.521,50	$ 5.808.521,50	$ 5.808.521,50	$ 5.808.521,50	$ 1.548.939,07		$ 46.468.172,00
COSTO TOTAL OBRA					$ 5.369.899.707,00	$ 5.668.246.160,00												

INFORME MENSUAL No. 02

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

REPROGRAMACIÓN

"IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE"

ITEM	ACTIVIDAD	INICIO	FIN	DURACIÓN (días)	VALOR CONTRATO	VALOR MGA	VALOR x DÍA	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
1.1.1	REALIZAR PRELIMINARES				$ 58,977,896.00	$ 60,121,721.00	$ 1,038,531.39	$ 23,542,563.48	$ 25,682,796.52	$ 7,752,446.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 58,977,806.00
1,01	Replanteo de obra	09/06/2026	24/07/2026	46	$ 49,225,360.00	$ 51,985,965.76	$ 1,070,116.52	$ 23,542,563.48	$ 25,682,796.52									$ 49,225,360.00
1,02	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas del sitio (incluye retiro disposición final)	01/08/2026	30/08/2026	30	$ 7,752,446.00	$ 8,186,583.24	$ 258,414.87			$ 7,752,446.00								$ 7,752,446.00
1.1.2	REALIZAR ALUMBRADO PÚBLICO				$ 5,252,174,545.00	$ 5,547,325,438.00	$ 30,686,964.37	$ -	$ -	$ 840,708,858.83	$ 894,327,618.85	$ 909,382,365.83	$ 897,796,100.49	$ 869,252,480.16	$ 840,708,859.83	$ -	$ -	$ 5,252,174,545.00
2,01	Excavación manual en material común del sitio para cimentación de postes de alumbrado público solar (incluye retiro y disposición final)	01/09/2026	15/10/2026	45	$ 34,758,796.00	$ 36,705,288.84	$ 772,417.69				$ 23,172,530.67	$ 11,586,265.33						$ 34,758,796.00
2,02	Suministro e Instalación de poste en fibra de vidrio para alumbrado público (12mt 510 kgf)	01/09/2026	30/01/2027	180	$ 1,985,686,509.00	$ 2,097,249,099.00	$ 11,031,591.72			$ 330,947,751.50	$ 330,947,751.50	$ 330,947,751.50	$ 330,947,751.50	$ 330,947,751.50	$ 330,947,751.50			$ 1,985,686,509.00
2,03	Cimentación para postes de alumbrado público solar	15/09/2026	15/12/2026	91	$ 173,164,630.00	$ 182,910,858.24	$ 1,902,908.02				$ 30,446,528.35	$ 57,087,240.66	$ 57,087,240.66	$ 28,543,620.33				$ 173,164,630.00
2,04	Suministro e instalación de luminarias solar ELITE III PRO INI-SL Incluye (Luminaria LED, Panel solar fotovoltaico y batería, soporte para conexiones, brazo metálico galvanizado y collarín anti vandálico)	01/09/2026	30/01/2027	180	$ 3,058,566,650.00	$ 3,230,460,150.72	$ 16,992,036.94			$ 509,761,108.33	$ 509,761,108.33	$ 509,761,108.33	$ 509,761,108.33	$ 509,761,108.33	$ 509,761,108.33			$ 3,058,566,650.00
TOTAL, PROGRAMADO (AIU INCLUIDO)					$ 5,309,154,391.00	$ 5,607,497,160.00	$ 32,027,485.76	$ 23,542,563.48	$ 25,682,796.52	$ 848,461,305.83	$ 894,327,618.85	$ 909,382,365.83	$ 897,796,100.49	$ 869,252,480.16	$ 840,708,859.83		$ -	$ 5,309,154,391.00
1.1.4	REALIZAR CERTIFICACIÓN RETIE AP	1/02/2027	14/03/2027	44	$ 14,277,144.00	$ 14,240,000.00	$ 324,480.55								$ 1,942,883.27	$ 9,734,416.36	$ 2,599,844.36	$ 14,277,144.00
1.1.3	REALIZAR PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA	09/06/2026	05/02/2027	240	$ 44,468,172.00	$ 44,469,000.00	$ 185,283.63	$ 4,259,658.33	$ 5,808,625.00	$ 5,808,625.00	$ 5,808,625.00	$ 5,808,625.00	$ 5,808,625.00	$ 5,808,625.00	$ 5,808,625.00	$ 1,946,726.67		$ 46,468,172.00
COSTO TOTAL OBRA					$ 5,368,899,707.00	$ 5,666,246,160.00		$ 27,802,221.81	$ 31,491,421.52	$ 854,269,930.83	$ 900,136,243.85	$ 915,190,990.83	$ 903,604,725.49	$ 875,061,105.16	$ 848,464,368.11	$ 11,282,555.03	$ 2,595,844.36	$ 5,368,899,707.00

Justificación de la reprogramación de obra

La programación inicial del proyecto fue elaborada con base en el alcance contractual, las actividades previstas, la información presupuestal disponible y los criterios de planificación definidos para la ejecución, contando para su estructuración con el acompañamiento y seguimiento de la supervisión.

Esta programación constituyó la línea de referencia para la planificación inicial de las actividades del proyecto.

Posteriormente, a partir de las observaciones y precisiones realizadas durante el seguimiento por parte de la Supervisión, se efectuaron los ajustes correspondientes a la programación, con el propósito de armonizarla con los criterios establecidos para el seguimiento y presentación del avance de obra.

En consecuencia, la reprogramación presentada corresponde a una actualización de la programación inicialmente estructurada, manteniendo la secuencia y lógica de ejecución de las actividades, y atendiendo los criterios definidos durante el proceso de seguimiento del proyecto, modificando solo el ajuste del MGA.

BITÁCORA

Se deja constancia de que el desarrollo y avance de las actividades de obra se registra y verifica mediante una bitácora diaria de obra, instrumento técnico y de seguimiento que permite documentar de manera detallada, sistemática y cronológica las labores ejecutadas durante cada jornada.

En la bitácora se consignan las actividades desarrolladas, los avances alcanzados, las condiciones encontradas en campo, los recursos utilizados, las novedades e incidencias presentadas, así como las instrucciones y observaciones relevantes para el adecuado seguimiento y control de la ejecución del proyecto. Este registro constituye un mecanismo de trazabilidad y soporte de la ejecución, permitiendo realizar el seguimiento oportuno de las actividades programadas y de las situaciones que puedan afectar el normal desarrollo de la obra.

2. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE OBRA

Avance físico

INFORME MENSUAL No. 02

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

ACTIVIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
PERIODO 1 (09/06/2026-30/06/2026)	0,518%	$ 27.802.221,81	0,518 %	$ 27.802.221,81	0,519%	$ 27.887.755,43	0,519%	$ 27.887.755,43
PERIODO 2 (01/07/2026-31/07/2026)	0,556%	$ 31.491.421,52	1,074%	$ 59.293.643,33	0,539%	$ 28.948.518,84	1,058%	$ 56.836.274,27
PERIODO 3 (01/08/2026-31/08/2026)	15,908%	$ 854.269.930,83	16,982%	$ 913.563.574,17	%	$	%	$
PERIODO 4 (01/09/2026-30/09/2026)	16,763%	$ 900.136.543,85	33,745%	$ 1.813.700.118,02	%	$	%	$
PERIODO 5 (01/10/2026-31/10/2026)	17,043%	$ 915.190.990,83	50,788%	$ 2.728.891.108,84	%	$	%	$
PERIODO 6 (01/11/2026-30/11/2026)	16,827%	$ 903.604.725,49	67,615%	$ 3.632.495.834,34	%	$	%	$
PERIODO 7 (01/12/2026-31/12/2026)	16,296%	$ 875.061.105,16	83,911%	$ 4.507.556.939,50	%	$	%	$
PERIODO 8 (01/01/2027-31/01/2027)	15,800%	$ 848.464.368,11	99,711%	$ 5.356.021.307,61	%	$	%	$
PERIODO 9 (01/02/2027-28/02/2027)	0,210%	$ 11.282.555,03	99,921%	$ 5.367.303.862,64	%	$	%	$
PERIODO 10 (01/03/2027-08/03/2027)	0,079%	$ 2.595.844,36	100,00%	$ 5.369.899.707,00	%	$	%	$

NOTA: En la presente tabla, los porcentajes de avance se presentan con tres (3) decimales para facilitar su visualización y seguimiento, mientras que el porcentaje de programación registrado en GESPROY se presenta con dos (2) decimales.

Gráfica Avance Físico

INFORME MENSUAL No. 02

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003



AVANCE DE OBRA %

1.1.1	REALIZAR PRELIMINARES	UNIDADES	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDADES EJECUTADAS EN PERIODOS ANTERIORES	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO 2	CANTIDAD ACUMULADA
1.01	Replanteo de obra	Und	425	204	66	270
1.02	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas del sitio (incluye retiro disposición final)	m2	1700	0	193	193
1.1.2	REALIZAR ALUMBRADO PÚBLICO					
2.01	Excavación manual en material común del sitio para cimentación de postes de alumbrado público solar (incluye retiro y disposición final)	m3	459	0	193	193
2.02	Suministro e instalación de poste en fibra de vidrio para alumbrado público (12m 510kg)	UND	425	0	0	0
2.03	Cimentación para postes de alumbrado público solar	UND	425	0	0	0
2.04	Suministro e instalación de luminarias solar ELITE III PRO IN-SL. Incluye (Luminaria LED, Panel solar fotovoltaico y batería, soporte para conexiones, brazo metálico galvanizado y collarín antivandálico)	UND	425	0	0	0
1.1.4	REALIZAR CERTIFICACIÓN RETILAP	N/A	1	0	0	0
1.1.5	REALIZAR PLAN DE MANEJO AMBIENTAL-PMA	UND	9	1	1	2
	% Avance de obra	0,539%				


INFORME MENSUAL No. 02

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO

De acuerdo con lo establecido en la cláusula 10 contrato de obra 019 de 2026, literal 11, indica: Se deberá colocar o instalar una valla para la identificación de la obra, la cual debe seguir los lineamientos del manual de imagen expedido por la Presidencia de la República. La valla será instalada al momento del inicio de las obras del inmueble o sector sobre el cual se ejecutará el proyecto y en lugar visible para la ciudadanía, y su costo deberá incluirlos dentro de la administración.
La valla informativa fue elaborada e instalada de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Resolución No. 031 del 30 de diciembre de 2022, mediante la cual se establecen la distribución, el diseño y los parámetros aplicables a las vallas informativas de obras públicas y proyectos contratados por la Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso – ASOSUPRO, así como las demás disposiciones aplicables.

Para su elaboración e instalación se consideraron los criterios técnicos y normativos establecidos, incluyendo diseño, dimensiones, materiales, legibilidad, visibilidad y durabilidad, con el fin de garantizar que la información del proyecto sea claramente identificable y permanezca en condiciones adecuadas durante su permanencia en el sitio de obra. Con lo anterior, se da cumplimiento a las exigencias contractuales, técnicas y normativas aplicables al proyecto

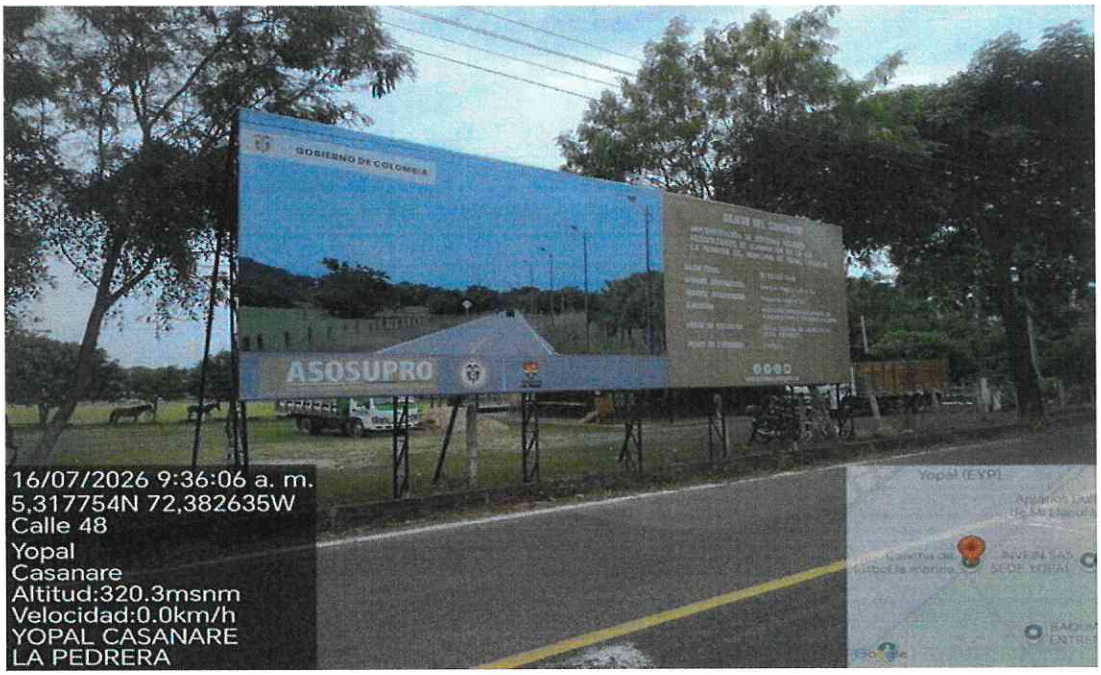

INFORME MENSUAL No. 02

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

3. GESTIÓN TÉCNICA Y DOCUMENTAL

Oficios y documentos elaborados por el contrato de obra sobre el desarrollo del contrato: solicitudes comunidad, entidades, temas varios e Informes presentados.

- **CORRESPONDENCIA ENVIADA**

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
15 de julio de 2026	EIA-003-26	Radicación informe mensual No. 001 -Contrato de Obra 019 de 2026, cuyo objeto es "implementación de sistemas solares fotovoltaicos de iluminación en la vía la pedrera del municipio de Yopal, Casanare.	Daniel León Garzón Director de Proyecto	PROYECTOS TRIPLE O S.A.S. Interventoría Contrato No. 019 de 2026 Atn. LUZ NEILA DÍAZ MOGOLLÓN Representante Legal
28 de julio de 2026	EIA-004-26	Respuesta a la solicitud de información sobre instalación de valla de obra.	Daniel León Garzón Director de Proyecto	PROYECTOS TRIPLE O S.A.S. Interventoría Contrato No. 019 de 2026 Atn. LUZ NEILA DÍAZ MOGOLLÓN Representante Legal

29 de julio de 2026	EIA-005-26	Respuesta a la solicitud de información sobre el estado de aprobación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT).	Daniel León Garzón Director de Proyecto	PROYECTOS TRIPLE O S.A.S. Interventoría Contrato No. 019 de 2026 Atn. LUZ NEILA DÍAZ MOGOLLÓN Representante Legal.

- **CORRESPONDENCIA RECIBIDA**

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
08/07/2026	N/A	Aprobación del Plan de Manejo de Tráfico (PMT).	LUZ NEILA DÍAZ MOGOLLÓN Representante Legal PROYECTOS TRIPLE O S.A.S.	Ing. Carlos Naranjo Apoyo a la Dirección del proyecto
17 de julio de 2026	INT-CTO-019-202 6-002	Aprobación del Informe de Gestión de Obra No. 1	LUZ NEILA DÍAZ MOGOLLÓN Representante Legal PROYECTOS TRIPLE O S.A.S.	ENERGÍA INTEGRAL ANDINA Atn. Ing. DANIEL LEÓN GARZÓN Director de Proyecto .

INFORME MENSUAL No. 02

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

24 de julio de 2026	INT-CTO-019-202 6-004	Solicitud de bitácoras desde el día 09 de julio 2026 hasta 23 de julio del 2026.	LUZ NEILA DÍAZ MOGOLLÓN Representante Legal PROYECTOS TRIPLE O S.A.S.	ENERGÍA INTEGRAL ANDINA Atn. Ing. DANIEL LEÓN GARZÓN Director de Proyecto .
24 de julio de 2026	INT-CTO-019-202 6-005	Solicitud de información del estado de aprobación del plan de manejo de tránsito PMT radicado 2026134028.	LUZ NEILA DÍAZ MOGOLLÓN Representante Legal PROYECTOS TRIPLE O S.A.S.	ENERGÍA INTEGRAL ANDINA Atn. Ing. DANIEL LEÓN GARZÓN Director de Proyecto
27 de julio de 2026	INT-CTO-019-202 6-007	Solicitud de información instalación de valla de obra.	LUZ NEILA DÍAZ MOGOLLÓN Representante Legal PROYECTOS TRIPLE O S.A.S.	ENERGÍA INTEGRAL ANDINA Atn. Ing. DANIEL LEÓN GARZÓN Director de Proyecto

Comités y/o reuniones de trabajo:

INFORME MENSUAL No. 02

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

FECHA	TEMAS TRATADOS	PARTICIPANTES
03/07/2026	Reunión de trabajo con el apoyo de la supervisión Temas tratados- Acta No. 3: Realizar el seguimiento al estado actual del proyecto y evaluar las condiciones preliminares identificadas en el corredor vial objeto de intervención, con el propósito de determinar y gestionar oportunamente los aspectos asociados a la gestión predial, elaboración de actas de vecindad, identificación de posibles interferencias y demás actividades requeridas como parte de la preparación previa a la ejecución de las obras.	LINA MELISA ROJAS VALBUENA SUPERVISOR ASOSUPRO JEFFERSON PARRA CAPERA APOYO A LA SUPERVISIÓN CAROLINA REYES-Interventoría LAURO DANIEL LEÓN DIRECTOR DE OBRA ESNEIDER RAFAEL TORRES SUAREZ DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
03/07/2026	Durante el Comité Técnico No. 04 se realizó la definición de la metodología de trabajo para la ejecución del contrato, estableciendo mecanismos de coordinación entre el contratista y la interventoría. Así mismo, se definieron los roles y responsabilidades del equipo de trabajo, los canales oficiales de comunicación y los procedimientos para la organización y centralización de la documentación técnica y administrativa del proyecto mediante el uso de formatos estandarizados. Se abordó la importancia de mantener actualizados los registros de avance de obra y las evidencias fotográficas como soporte de las actividades ejecutadas. Igualmente, se revisaron los requerimientos técnicos para el desarrollo de las actividades de topografía y diseño fotométrico, orientadas a la definición de la ubicación de postes y brazos de luminarias, y finalmente se acordó la realización de reuniones periódicas de seguimiento para evaluar el avance del proyecto, verificar el cumplimiento de los compromisos y atender oportunamente las situaciones que se presenten durante la ejecución contractual.	JOSUÉ NEFTALÍ VALERO CAMARGO REPRESENTANTE LEGAL ENERGIA INTEGRAL ANDINA SA LUZ NEILA DIAZ MOGOLLON REPRESENTANTE LEGAL PROYECTOS TRIPLE O SAS LAURO DANIEL LEÓN GARZÓN DIRECTOR DE OBRA ENERGÍA INTEGRAL ANDINA SA ESNEIDER RAFAEL TORRES SUAREZ DIRECTOR INTERVENTORIA PROYECTOS TRIPLE O SAS SANDRA MILENA HERNÁNDEZ ESGUERRA PROFESIONAL SISOMA OBRA ENERGIA INTEGRAL ANDINA SA

INFORME MENSUAL No. 02

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

10/07/2026	Comité Técnico No.5: Realizar seguimiento al estado de elaboración del primer informe mensual de obra e interventoría, revisar las situaciones técnicas que actualmente afectan la ejecución del proyecto y definir los compromisos necesarios para garantizar la adecuada presentación de los informes y la continuidad de las actividades del contrato	LINA MELISA ROJAS VALBUENA SUPERVISOR-ASOSUPRO JEFFERSON PARRA CAPERA APOYO A LA SUPERVISIÓN-ASOSUPRO LAURO DANIEL LEÓN GARZÓN DIRECTOR DE OBRA ENERGIA INTEGRAL ANDINA SA ESNEIDER RAFAEL TORRES SUAREZ DIRECTOR INTERVENTORIA PROYECTOS TRIPLE O SAS SANDRA MILENA HERNÁNDEZ ESGUERRA PROFESIONAL SISOMA OBRA ENERGIA INTEGRAL ANDINA SA
24/07/2026	Comité Técnico No. 6: Realizar la presentación y revisión de los planos de replanteo correspondientes a la ubicación de los postes de alumbrado, junto con la información topográfica y fotométrica asociada, con el propósito de establecer las condiciones necesarias para continuar con las actividades constructivas y garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP).	LAURO DANIEL LEÓN GARZÓN DIRECTOR DE OBRA ENERGIA INTEGRAL ANDINA SA MIGUEL ANGEL CARO JIMENEZ DIRECTOR INTERVENTORIA PROYECTOS TRIPLE O SAS BRAYAN JOSÉ FONTALVO RÚA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA PROYECTOS TRIPLE O SAS SANDRA MILENA HERNÁNDEZ ESGUERRA PROFESIONAL SISOMA OBRA ENERGIA INTEGRAL ANDINA SA
30/07/2026	Reunión de trabajo - Avance informe mensual No.2 	CAROLINA REYES-Interventoría SANDRA MILENA HERNÁNDEZ ESGUERRA PROFESIONAL SISOMA OBRA ENERGIA INTEGRAL ANDINA SA

31/07/2026	Comité Técnico No. 7: Realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato de obra, revisar el estado de las actividades desarrolladas en campo, verificar el cumplimiento de los compromisos contractuales y definir lineamientos para la presentación de informes y trámites administrativos asociados a la ejecución del proyecto.	JEFFERSON PARRA CAPERA APOYO A LA SUPERVISIÓN ASOSUPRO LAURO DANIEL LEÓN GARZÓN DIRECTOR DE OBRA ENERGÍA INTEGRAL ANDINA SA MIGUEL ANGEL CARO JIMENEZ DIRECTOR INTERVENTORIA PROYECTOS TRIPLE O SAS BRAYAN JOSE FONTALVO RUA RESIDENTE DE INTERVENTORIA PROYECTOS TRIPLE O SAS SANDRA MILENA HERNÁNDEZ ESGUERRA PROFESIONAL SISOMA OBRA ENERGIA INTEGRAL ANDINA SA

4. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MECANISMOS DE SOLUCIÓN PROPUESTOS

A continuación, se presentan las situaciones e incidencias identificadas durante el periodo de ejecución, junto con las acciones de gestión, prevención y corrección implementadas para su atención. Estas medidas estuvieron orientadas a mitigar los impactos sobre la programación, garantizar la continuidad de las actividades y mantener el cumplimiento de los requisitos técnicos y contractuales del proyecto.

4.1. Actividad: Preliminares

- **Problema Presentado**: Durante la inspección realizada en la zona objeto de intervención, se identificó preliminarmente que tres (3) predios colindantes con la vía hacia La Pedrera presentan posibles ocupaciones o intervenciones sobre el área asociada a la zona vial, situación que podría incidir en la ubicación inicialmente prevista para la instalación de los postes de alumbrado.

- **Mecanismos de Solución / Mitigación:** En atención a la situación identificada, se estableció la elaboración de las respectivas actas de vecindad, con el propósito de documentar las condiciones actuales de los predios colindantes, verificar la ubicación y características de los

cerramientos existentes, y contar con elementos técnicos que permitan determinar su eventual incidencia sobre la zona vial y los puntos previstos para la instalación de los postes.

La información recopilada mediante estas actas constituirá un insumo para la revisión y definición de las acciones y medidas que resulten pertinentes antes de la ejecución de las actividades constructivas y de la instalación definitiva de los postes y luminarias.

Actividad: Replanteo Topográfico

- **Problemas Presentados:** Durante el periodo se adelantaron las actividades de replanteo topográfico de acuerdo con la programación establecida. No obstante, la actividad no ha podido culminarse en su totalidad, debido a las situaciones relacionadas con la disponibilidad y validación de la información técnica correspondiente al perfil vial, particularmente del poste 194 al 244 en los sectores donde se requiere confirmar las condiciones oficialmente reconocidas de la vía. Esta situación limita la definición definitiva de algunos puntos de instalación y, por tanto, impide concluir el replanteo integral del corredor.

- **Mecanismos de Solución / Mitigación:** Como medida de control, se ha mantenido la ejecución del replanteo en los sectores donde existe información técnica suficiente y condiciones verificables en campo. Paralelamente, se adelanta la revisión y gestión de la información técnica y administrativa requerida, con el propósito de validar los perfiles y condiciones del corredor vial pendientes de definición. Una vez se cuente con la información correspondiente, se procederá a completar el replanteo y a efectuar la validación definitiva de los puntos de instalación, evitando realizar intervenciones sobre ubicaciones que posteriormente puedan requerir modificaciones.

4.2. Excavación manual del sitio para cimentación de postes:

- **Problemas Presentados:**

Durante la ejecución de las excavaciones manuales se presentaron dificultades asociadas a las condiciones y características del terreno, las cuales incrementaron el nivel de esfuerzo requerido para la apertura de los puntos de cimentación. No obstante, estas condiciones no generaron retrasos significativos en la programación ni afectaron la continuidad de las actividades, permitiendo mantener un avance diario satisfactorio.

En relación con las condiciones climáticas, durante el periodo objeto del informe se presentó un evento de lluvia con una duración aproximada de dos (2) horas, durante el cual fue necesario suspender temporalmente las labores de campo, con el propósito de garantizar la seguridad del personal y evitar condiciones inadecuadas para la ejecución de las actividades. Esta situación fue puntual y no representó una afectación significativa al desarrollo general del proyecto.

- **Mecanismos de Solución / Mitigación:**

Como medida de mitigación, se implementó una gestión operativa permanente de las cuadrillas de trabajo, ajustando las actividades de acuerdo con las condiciones particulares encontradas en cada punto de excavación. Se realizó seguimiento continuo al rendimiento y avance diario, priorizando los frentes de trabajo con mejores condiciones para mantener la productividad y compensar oportunamente

las dificultades presentadas.

Frente a las condiciones climáticas, se realizó el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y del estado del terreno, suspendiendo las actividades durante el periodo de lluvia y retomándolas una vez se restablecieron condiciones seguras para el personal y adecuadas para la ejecución de los trabajos.

5. ESTADO DEL TIEMPO

Frecuencia.

ESTADO	N° DE DÍAS
NUBLADO	0
LLUVIOSO	0
SOLEADO	31
TOTAL DIAS MES	31

OBSERVACIONES:

Estado de las Actividades: Normalidad absoluta (Sin retrasos).

Desarrollo de Labores en Campo: Durante el período reportado, las actividades de campo se ejecutaron bajo condiciones de total normalidad y fluidez, cumpliendo rigurosamente con el cronograma establecido. Este rendimiento óptimo se vio favorecido de manera directa por las condiciones climáticas favorables, dentro de este periodo solo un día registró tiempo de lluvias por un periodo de 2 horas en el cual no se lograron desarrollar actividades, sin embargo esto no logró afectar el rendimiento del personal o de los equipos.

Continuidad de Labores Administrativas: Asimismo, se garantiza que la continuidad del proyecto no se vió interrumpida en ningún momento. De manera paralela e integrada, se avanzó con éxito en las labores administrativas, de coordinación y de organización de la información recolectada en campo. Esto permitió un procesamiento eficiente de los datos técnicos y una planificación estructurada para las siguientes fases.

Conclusión del Periodo: Las condiciones meteorológicas idóneas, sumadas a una correcta alternancia y gestión entre el trabajo de campo y las tareas de gabinete/oficina, permitieron mantener el ritmo de ejecución sin reportar ningún tipo de retraso.

B. CUMPLIMIENTO DE PLANES Y ESPECIFICACIONES

1. MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

Dentro del desarrollo del proyecto se contempla la ejecución de las actividades de cimentación de los postes, para las cuales se establecieron dos tipos de concreto, de acuerdo con las condiciones y requerimientos constructivos.

El primer tipo corresponde a un concreto con resistencia de 2.500 PSI, destinado a la ejecución del solado de cimentación, el cual se dispone en la base con un espesor de 10 cm, con el propósito de proporcionar una superficie de apoyo adecuada para la instalación del poste. El segundo corresponde a un concreto con resistencia de 3.000 PSI, utilizado como relleno de la excavación una vez realizado el hincado del poste, con el fin de proporcionar el confinamiento, estabilidad y soporte requeridos para garantizar su correcta fijación, de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto.

Con el fin de garantizar el cumplimiento de las resistencias especificadas y establecer las proporciones adecuadas de los materiales, se contrató al laboratorio **IBS LAB DE COLOMBIA S.A.S.**, con domicilio en la ciudad de Yopal, para la elaboración del diseño de mezcla correspondiente; para ello el laboratorio tomó muestras del material a usar y con base en esteos realizar el diseño de mezcla según las características de resistencia requeridas.

El primer tipo corresponde a un concreto con resistencia de 2.500 PSI, destinado a la ejecución del solado de cimentación, el cual se dispone en la base con un espesor de 10 cm, con el propósito de proporcionar una superficie de apoyo adecuada para la instalación del poste, según los resultados entregados por el laboratorio la dosificación de materiales para este concreto es la siguiente.

PARA 1m3 (VOLUMEN SUELTO)				PARA 1 bulto de 50 kg			
AGUA (m3/m3)	CEMENTO (Bulto 50 kg)	AGDO FINO (m3/m3)	AGDO GSO (m3/m3)	AGUA (m3/bulto)	CEMENTO (Bulto)	AGDO FINO (m3/bulto)	AGDO GSO (m3/bulto)
0,160	6,4	0,769	0,630	0,025	1	0,120	0,098

Dosificación 1 bulto (Baldes de 9 -10 lts)			
AGUA	CEMENTO	AGDO FINO	AGDO GSO
2,8	5,6	13,4	10,9

El segundo corresponde a un concreto con resistencia de 3.000 PSI, utilizado como relleno de la excavación una vez realizado el hincado del poste, con el fin de proporcionar el confinamiento, estabilidad y soporte requeridos para garantizar su correcta fijación, de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto, para este tipo de concreto la dosificación de materiales es la siguiente.

PARA 1m3 (VOLUMEN SUELTO)				PARA 1 bulto de 50 kg			
AGUA (m3/m3)	CEMENTO (Bulto 50 kg)	AGDO FINO (m3/m3)	AGDO GSO (m3/m3)	AGUA (m3/bulto)	CEMENTO (Bulto)	AGDO FINO (m3/bulto)	AGDO GSO (m3/bulto)
0,200	7,7	0,706	0,577	0,026	1	0,092	0,075

Dosificación 1 bulto (Baldes de 9 -10 lts)			
AGUA	CEMENTO	AGDO FINO	AGDO GSO
2,9	5,6	10,2	8,3

Todos los resultados obtenidos y mostrados en el presente informe, se pueden encontrar en la carpeta de DRIVE destinada a esta información, la cual podrán encontrar en el siguiente link.

https://drive.google.com/drive/folders/1hPSnC1INJaK53jHXa_E-0BI7mUeB_V5k?usp=drive_link

Se recuerda que el laboratorio brindará acompañamiento y apoyo técnico durante la ejecución de las actividades de cimentación de los postes, realizando las verificaciones y controles necesarios sobre la calidad del concreto y su proceso de colocación, con el propósito de asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Densidad en terreno Ensayo a compresión en cilindros de concreto C.B.R Muestra inalterada Flexión de Vigas de Concreto Rodadura Asfáltica Límite de Consistencia Desgaste Proctor Gradación Abrasión de Agregados en la Máquina de los ángeles Granulometría Equivalente de Arena otros (Especificar)	N/A	N/A

2. SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Relacionar la aplicación de la normatividad vigente sobre seguridad industrial, salud ocupacional y señalización

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACION /ACCION
17/07/2026	Aprobación del PMT por la secretaría de tránsito y transporte de Yopal	La resolución de aprobación del PMT se puede evidenciar en el informe mensual SST.
27/07/2026	Evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso y periódicas	Los soportes de los exámenes médicos se encuentran en el informe SST mensual.
27/07/2026	Ingreso de personal operativo-Afiliación Parafiscales	Anexo certificados de afiliación
27/07/2026	Entrega de dotación y EPP al personal operativo.	Los soportes de entrega de EPP y dotación se pueden evidenciar en el informe mensual SST.

27/07/2026	Inducción en obra	Los soportes se pueden evidenciar en el informe mensual SST.
28/07/2026	Charlas pre operacionales	Los soportes se pueden evidenciar en el informe mensual SST.
28/07/2026	Registros de Análisis de Trabajo seguro	Los soportes se pueden evidenciar en el informe mensual SST.
28/07/2026	Inspecciones de seguridad	Los soportes se pueden evidenciar en el informe mensual SST.
28/07/2026	Socialización PMT	Los soportes se pueden evidenciar en el informe mensual SST.
30/07/2026	Validación pago de seguridad social	Planillas de pago adjuntas en el informe SST mensual.
30/07/2026	Implementación PMT	Registro fotográfico en el informe mensual

3. MANEJO AMBIENTAL

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
Inducción al personal operativo que ingresa	CUMPLE	Esta actividad se implementa de forma continua, con el personal nuevo que ingresa a obra, como parte del proceso
Charlas de sensibilización	CUMPLE	Actividad ejecutada con el personal operativo vinculado al proyecto, mediante sesiones de socialización referente a los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental (PMA).
Cronograma de capacitaciones	CUMPLE	Se está formulando el cronograma de capacitaciones.
Implementación del PMA	CUMPLE	Durante el periodo reportado se dio inicio a la implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) en obra, en concordancia con las actividades ejecutadas y las medidas ambientales establecidas para cada programa. En este marco, se realizó la socialización del PMA con el personal operativo, se instaló un punto ecológico para la adecuada separación de residuos y se implementaron medidas de protección del suelo en las áreas destinadas al acopio de materiales. Asimismo, se cuenta con el proveedor autorizado SIMA para la gestión y disposición final de los residuos generados en obra, garantizando su manejo conforme a los lineamientos ambientales aplicables.

INFORME MENSUAL No. 02

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

C. INFORME

1. PERSONAL ACTUAL PROFESIONAL VIGENTE

NOMBRE	CARGO	% DEDICACIÓN PERSONA- MES
Lauro Daniel León Garzón	Director de obra	50%
Joaquín Vargas Rodríguez	Residente de obra	100%
Laura Camila Caballero Roldan	Ingeniero Ambiental	30%
Néstor Raúl Canchón Casas	Tecnólogo Electricista	100%
Sandra Milena Hernández Esguerra	Profesional SISOMA	50%

PERSONAL OPERATIVO-

Dentro del personal operativo que tenemos en el momento se encuentran:

No.	APELLIDO -NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
1	Alberto Manrique Gómez	1074486092	Ayudante	27/7/2026	
2	Edwar Santiago Amórtegui Rodríguez	1071062177	Ayudante	27/7/2026	
3	Félix Amórtegui Sánchez	1070613623	Ayudante	27/7/2026	
4	John Andrés Barrios Rivera	1070592353	Ayudante	27/7/2026	
5	Luis Alfredo Barrios Rivera	1070600122	Ayudante	27/7/2026	
6	Fanny Barrera González	46,370,853	Topógrafa	Servicio de Topografía	
7	Elber Ignacio Gamboa García	7,311,566	Cadenero	Servicio de Topografía	

2. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se presenta planilla de pago N°: 6030580702-6030573722,9510788431, 6033264283, 6033397097.

INFORME MENSUAL No. 02

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

Anexo: ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA

3. GESTIÓN SOCIAL

EMPLEO	CANTIDAD
Total empleos generados:	12
Empleos directos generados:	10
Empleos indirectos generados:	2

4. CLASIFICACIÓN DEMOGRÁFICA DE LOS EMPLEOS GENERADOS

CLASIFICACIÓN	DETALLE	CANTIDAD
Etaria (Edad)	15 a 19 años	0
Etaria (Edad)	20 a 59 años	11
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	1
Grupos étnicos	Población Indígena	0
Grupos étnicos	Población Afrocolombiana	0
Grupos étnicos	Población Raizal	0
Género	Masculino	9
Género	Femenino	3
Población Vulnerable	Desplazados	0
Población Vulnerable	Discapacitados	0
Población Vulnerable	Víctimas	0
Total		12

D. INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURÍDICA DEL PROYECTO

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIO		
ACTA N° Y FECHA	TIEMPO (MESES / DIAS)	JUSTIFICACIÓN
N/A	N/A	N/A

INFORME MENSUAL No. 02

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

ADICIÓN		
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	VALOR ($)	JUSTIFICACIÓN
N/A	N/A	N/A

MODIFICACIÓN		
ACTA N° Y FECHA	VALOR ACTUALIZADO ($)	JUSTIFICACIÓN
N/A	N/A	N/A

2. **GARANTÍAS**: <Describa las pólizas de acuerdo con los actos administrativo-celebrados>

SEGÚN ACTA DE INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	801056816		
ANEXO N°	1	FECHA DE EXPEDICIÓN:	16/06/2026
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	802091981		
ANEXO N°	1		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	17/06/2026		
COMPAÑÍA DE SEGUROS	CONFIANZA- COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.		

GARANTÍAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	09/06/2026	08/09/2027	$ 1,073,979,941.40
Anticipo	09/06/2026	08/09/2027	$ 2,684,949,853.50
Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09/06/2026	08/03/2030	$ 536,989,970.70
Estabilidad de la obra	08/03/2027	08/03/2032	$ 1,073,979,941.40
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	09/06/2026	08/03/2029	$ 1,073,979,941.40
Responsabilidad civil extracontractual	23/04/2026	08/03/2027	$ 700,362,000.00

INFORME MENSUAL No. 02

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

E. INFORME FINANCIERO

1. PAGOS REALIZADOS

ACTA No.	EGRESO No.	FECHA	% EJECUCIÓN	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DESCUENTO	VALOR ACUMULADO
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
TOTALES							


NOTA: Se informa que el contrato cuenta con el debido trámite de anticipo el cual fue desembolsado el día 30 de Junio para el cumplimiento de la cláusula 6 del contrato de obra 019 de 2026.

F. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.1.1	Realizar Preliminares	EJECUTADO	%
	Replanteo de Obra	66 Und	15,53%

INFORME MENSUAL No. 02

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

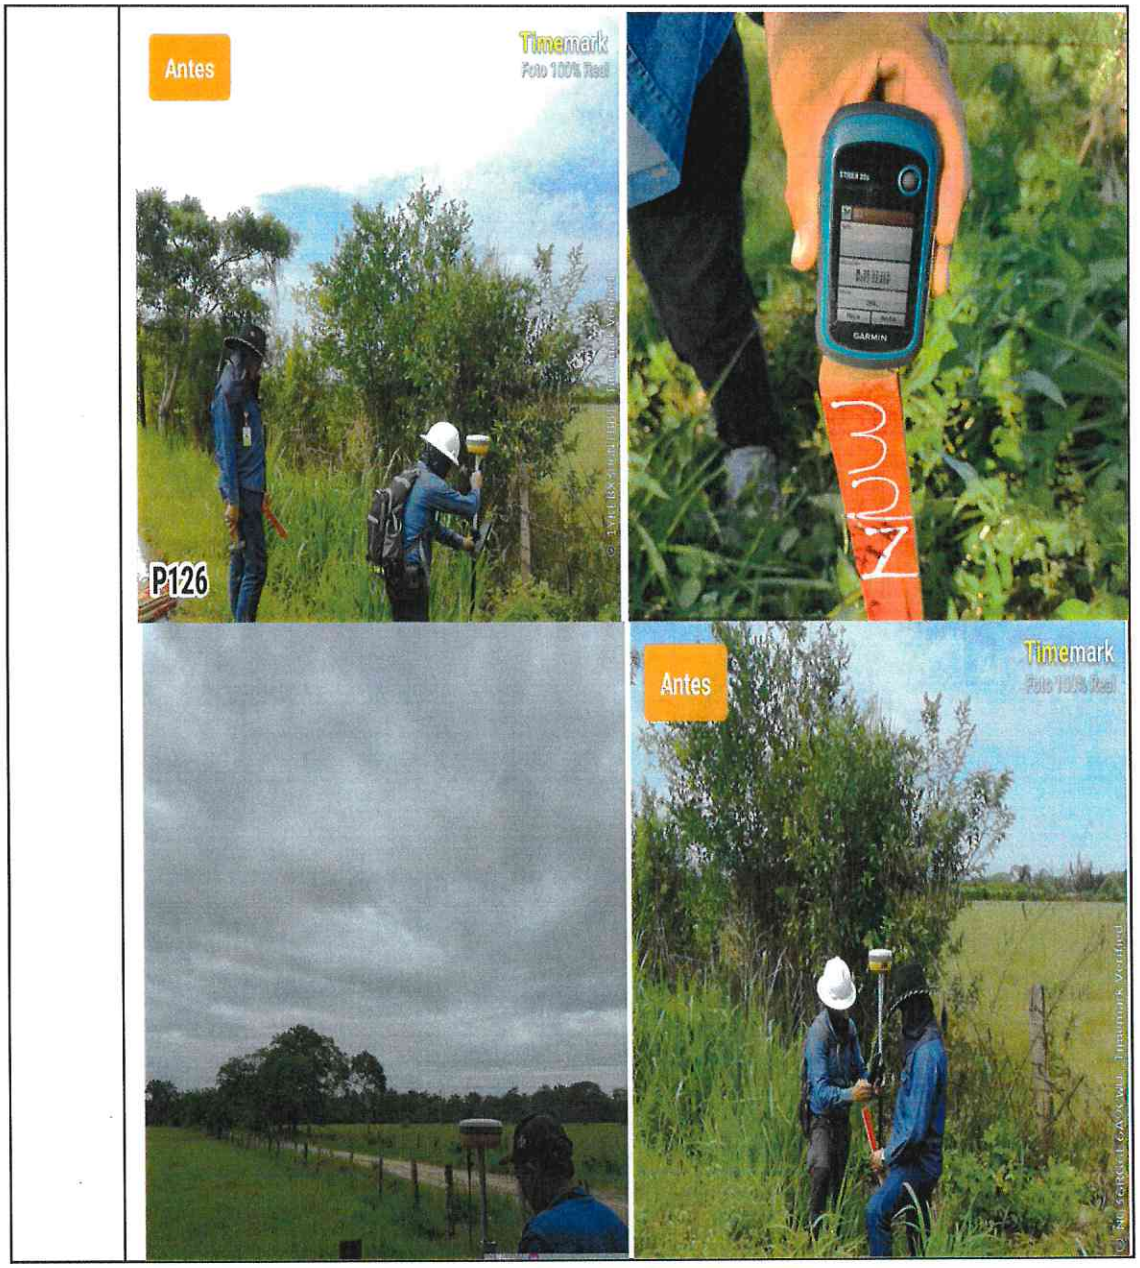

INFORME MENSUAL No. 02

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

	OBSERVACIONES: Replanteo topográfico: Se llevó a cabo el análisis técnico y topográfico del corredor vial, junto con la evaluación de las condiciones reales del suelo, con el fin de ajustar la proyección inicial y establecer la ubicación definitiva de las luminarias de manera precisa y segura. Como resultado de este proceso de georreferenciación y validación en terreno, se ha alcanzado la localización e identificación final de 66 puntos de iluminación, lo que representa un avance físico del 15,53% respecto al total programado para el proyecto.

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.1.1	**Realizar Preliminares**	EJECUTADO	%
	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas del sitio	193	11,353%



INFORME MENSUAL No. 02

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003





OBSERVACIONES: Desmonte y limpieza en zonas no boscosas del sitio: Se llevaron a cabo las labores de desmonte y limpieza en las zonas no boscosas del proyecto, alcanzando una intervención de 772 m² que representa un avance del 45,41% del total programado.
Estas actividades permitieron remover la vegetación baja, maleza y capa superficial del suelo, adecuando el terreno para dejar las áreas despejadas y en condiciones óptimas para iniciar con las excavaciones y la apertura de huecos para las cimentaciones.

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.1.2	**Realizar Alumbrado Público**	**EJECUTADO**	**%**
	Excavación manual en material común del sitio para cimentación de postes de alumbrado público solar	**193**	**42.048%**

INFORME MENSUAL No. 02

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003










INFORME MENSUAL No. 02

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

	OBSERVACIONES: Excavación manual en material común del sitio para cimentación de postes de alumbrado público solar: Se avanzó en las labores de excavación manual en material común del sitio para la cimentación y posterior hincado de los postes de alumbrado público solar, alcanzando un volumen ejecutado de 208,44 m³, lo que representa un avance del 45,41% respecto al total programado. Esta actividad permitió dejar las cavidades adecuadamente preparadas y perfiladas según las especificaciones técnicas requeridas, garantizando la estabilidad y el correcto asentamiento de la estructura de los postes.

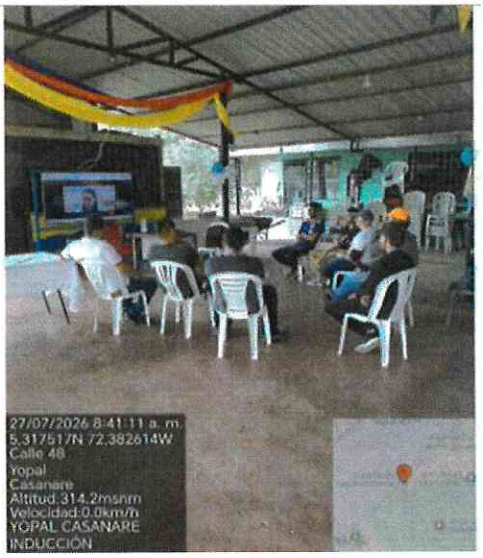
ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1.1.5	**Realizar Plan de Manejo Ambiental-PMA**	
	Inducción al personal operativo que ingresa (Socialización PMA) **Charlas de sensibilización** **Cronograma de capacitaciones** **Implementación del PMA**	
	 	

INFORME MENSUAL No. 02

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003





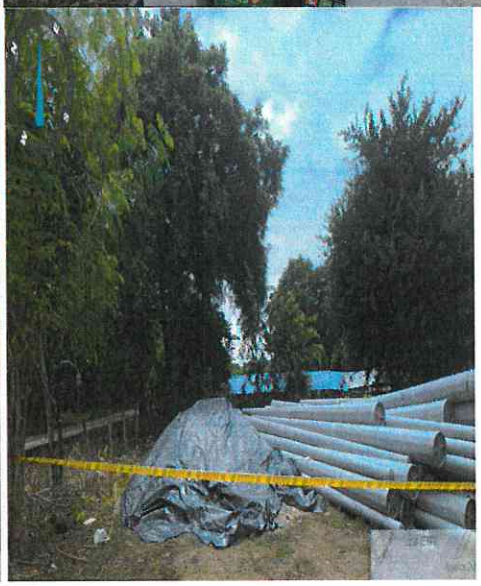

INFORME MENSUAL No. 02

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

	OBSERVACIONES: Socialización del PMA con el personal operativo. Acopio temporal de los materiales de construcción en obra, con aislamiento del suelo y apilados de manera que no genere compactación, con barreras perimetrales para su contención. Instalación de contenedores (punto ecológico) para la clasificación de residuos generados.

G. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

1. Comentarios generales

Durante el periodo objeto del presente informe se dio continuidad a la ejecución del Contrato de Obra No. 019 de 2026, desarrollando las actividades previstas para la etapa operativa del proyecto. Se adelantaron labores de replanteo topográfico, desmonte y limpieza, excavación manual para cimentaciones, señalización y protección de excavaciones, así como las actividades administrativas y logísticas necesarias para soportar la ejecución en campo.

Las actividades desarrolladas permitieron mantener un avance progresivo de los frentes de trabajo, a pesar de las dificultades puntuales asociadas a las condiciones del terreno y a las condiciones climáticas presentadas durante el periodo.

Se destaca la importancia del seguimiento permanente mediante la bitácora diaria de obra, instrumento que ha permitido documentar las actividades ejecutadas, las condiciones encontradas en campo, las novedades presentadas y las acciones adoptadas para garantizar la continuidad de los trabajos.

En relación con el replanteo topográfico, se ha avanzado en la localización y verificación de los puntos proyectados; sin embargo, su culminación integral se encuentra condicionada por la necesidad de contar con información técnica y administrativa que permita validar determinados aspectos relacionados con el perfil y las condiciones del corredor vial.

2. Conclusiones

Durante el periodo comprendido entre el 01 de julio y el 31 de julio de 2026 se mantuvo la continuidad de las actividades de ejecución del proyecto, desarrollando los trabajos conforme a las condiciones encontradas en campo y a la programación establecida.

Las actividades de desmonte, limpieza y excavación manual permitieron habilitar progresivamente los puntos destinados a la instalación de los postes y continuar con el desarrollo de los frentes de trabajo.

Las condiciones particulares del terreno generaron dificultades puntuales durante las excavaciones; sin embargo, estas no ocasionaron afectaciones significativas al avance general del proyecto.

Las condiciones climáticas presentadas durante el periodo tuvieron una incidencia limitada sobre la ejecución. La suspensión temporal de actividades durante el evento de lluvia permitió mantener las condiciones de seguridad requeridas para el personal.

Se mantuvo el registro sistemático de las actividades mediante la bitácora diaria de obra, garantizando trazabilidad sobre la ejecución, las novedades y las condiciones encontradas durante las jornadas de trabajo.

La culminación del replanteo topográfico en los sectores pendientes requiere la validación de la información técnica relacionada con el corredor vial, con el fin de garantizar que la localización definitiva de los postes responda a criterios técnicos y a las condiciones oficialmente establecidas.

3. Recomendaciones generales

Continuar con el seguimiento diario de las actividades, manteniendo actualizada la bitácora de obra como mecanismo principal de control y trazabilidad.

Mantener la coordinación permanente entre el personal de topografía, residente de obra y cuadrillas operativas, con el propósito de garantizar que las actividades de campo se ejecuten sobre puntos previamente verificados y autorizados.

Dar continuidad a la gestión de la información técnica y administrativa pendiente relacionada con el perfil vial, procurando obtener oportunamente las definiciones requeridas para culminar el replanteo topográfico.

Mantener la señalización, delimitación y protección de las excavaciones abiertas, especialmente en sectores con circulación de personal, peatones o vehículos, dando cumplimiento a los procedimientos de seguridad establecidos.

Continuar con el monitoreo de las condiciones climáticas y del terreno, ajustando la programación diaria cuando las condiciones puedan representar riesgos para el personal o afectar la calidad de los trabajos.

Mantener una adecuada planificación y disponibilidad de materiales, equipos, herramientas y personal, de manera que los frentes de trabajo puedan avanzar de forma continua y se reduzcan posibles tiempos improductivos.

Realizar seguimiento periódico al cronograma de ejecución y a las actividades que hacen parte de la ruta crítica, identificando oportunamente cualquier desviación y estableciendo las acciones de mitigación necesarias.

Garantizar que cualquier modificación derivada de las condiciones encontradas en campo sea previamente verificada, documentada y técnicamente soportada, antes de proceder con su implementación.

INFORME MENSUAL No. 02

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

H.

El informe debe contener como mínimo los siguientes soportes documentales:

- Registro fotográfico detallado
- Correspondencia generada entre el contratista – Interventor – supervisor – entidad contratante.
- Estado del tiempo
- Actas de comité técnico.
- Copia afiliaciones del personal y pagos de seguridad social (Anexo en informe SST mensual).

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los 16 días del mes de Septiembre del 2026.

Firma

Nombre: LAURO DANIEL LEÓN GARZÓN
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 20641705

Firma

Nombre: JOAQUÍN VARGAS RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: BY25007973

ACTA COMITÉ TÉCNICO No. 03

ASOSUPRO

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
Villavicencio	03	07	2026	10:00am	12:00am

I. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE CONTRATO:

OBRA E INTERVENTORÍA

CONTRATO OBRA N°: 019 DE 2026
CONTRAO INTERVENTORÍA N°: 019 de 2026 **PROYECTO N°:** 2025850010003

OBJETO:

OBRA
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.
INTERVENTORÍA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.

CONTRATISTA:

OBRA
ENERGÍA INTEGRAL ANDINA SA
INTERVENTORÍA
PROYECTOS TRIPLE O SAS

II. CONVOCADOS

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
LINA MELISA ROJAS VALBUENA	SUPERVISOR	ASOSUPRO -ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
JEFFERSON PARRRA CAPERA	APOYO A LA SUPERVISIÓN	ASOSUPRO -ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
LAURO DANIEL LEÓN	DIRECTOR DE OBRA	ENERGIA INTEGRAL ANDINA SA

ACTA COMITÉ TÉCNICO No. 03

ASOSUPRO

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
Villavicencio	03	07	2026	10:00am	12:00am

ESNEIDER RAFAEL TORRES SUAREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	PROYECTOS TRIPLE O SAS

III. OBJETIVO

Realizar seguimiento al estado actual del proyecto y evaluar las condiciones preliminares identificadas en el corredor vial objeto de intervención, con el fin de verificar la necesidad de adelantar procesos de gestión predial, identificación de interferencias y demás actividades previas a la ejecución de las obras.

IV. DESARROLLO DEL COMITÉ

Siendo las 8:00am del día tres (03) de julio de 2026, se llevó a cabo reunión virtual donde se expusieron los resultados de la inspección visual realizada previamente en el área donde se proyecta la implementación de los sistemas solares fotovoltaicos de iluminación sobre la vía La Pedrera del Municipio de Yopal, con la participación del **Ing. Lauro Daniel León Garzón**, Director de Obra; **Ing. Esneider Rafael Torres Suárez**, Director de Interventoría; **Arq. Lina Melisa Rojas**, Supervisora de ASOSUPRO; y **Jefferson Parra Capera**, profesional de apoyo a la supervisión de ASOSUPRO, con el propósito de revisar el estado de avance de las actividades ejecutadas, analizar las situaciones técnicas identificadas durante el inicio de la ejecución y establecer las acciones necesarias para garantizar el adecuado desarrollo del contrato.

Durante la reunión, el contratista de Obra informó que se inició la actividad correspondiente al **replanteo de obra**, la cual, por criterios técnicos y metodológicos, fue dividida en dos etapas: **Pretopografía** y **Topografía**. En el desarrollo de las labores preliminares se evidenció la presencia de redes de gas dentro del corredor de intervención, situación que representa una condición que debe ser considerada antes de definir la ubicación de los postes proyectados.

En atención a lo anterior, el contratista de obra manifestó que el día 8 de Junio fue radicada una solicitud ante **Cusianagas** y **ENERCA**, con el fin de obtener la cartografía e información técnica de las redes de existentes en el sector, la cual ya fue respondida permitiendo así que el topógrafo desarrolle las actividades de levantamiento y localización de los puntos de instalación de los postes con las condiciones de seguridad requeridas y evitando posibles interferencias con la infraestructura existente.

El contratista informa que, durante la inspección realizada en la zona objeto de intervención, se identificó de manera preliminar que tres (3) predios colindantes con la vía a La Pedrera aparentemente presentan ocupación o invasión de la zona vial, situación que podría afectar la ubicación prevista para los postes de las luminarias.

En atención a lo anterior, se define realizar las actas de vecindad correspondientes, con el propósito de

documentar las condiciones existentes, verificar la situación de los cerramientos y establecer las posibles afectaciones sobre la zona vial, como insumo para determinar las acciones que correspondan previo a la ejecución de las obras.

Posteriormente, los asistentes realizaron la revisión del formato de seguimiento registrado en la plataforma **GESPROY-SGR**, identificando inconsistencias en la clasificación de algunos capítulos asociados a la MGA. Como resultado de esta revisión, se efectuaron las correcciones correspondientes para garantizar la adecuada relación entre las actividades del proyecto y la estructura registrada en la plataforma.

La programación fue presentada por la supervisión, luego se evidencio la necesidad de incluir los Rubros del apoyo de la supervisión y la interventoría, toda vez que en la programación inicial no se tuvieron en cuenta. Por lo tanto, se requiere realizar al ajuste de la programación.

En consecuencia, los asistentes acordaron realizar la correspondiente **reprogramación del cronograma**, incorporando las actividades omitidas y ajustando los tiempos de ejecución, con el propósito de reflejar de manera adecuada el avance físico y contractual del proyecto y asegurar un seguimiento acorde con las condiciones reales de ejecución.

ACTA COMITÉ TÉCNICO No. 03

ASOSUPRO

CIUDAD	FECHA			HORA	
Villavicencio	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	03	07	2026	10:00am	12:00am

V. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA			
No.	**COMPROMISOS**	**RESPONSABLE**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
1	Corrección al informe de seguimiento GESPROY	Interventoría	6 de julio de 2026
2	Realización de reprogramación	Interventoría – Apoyo a la supervisión	06 de julio de 2026
3	Realizar actas de vecindad	Contratista Obra	07 de julio de 2026

VI PRÓXIMA REUNIÓN
NUEVA REUNIÓN CONVOCADA POR: PENDIENTE DEFINIR
FECHA, HORA Y SITIO DE NUEVA REUNIÓN: Se notificará por correo electrónico

Las decisiones tomadas y los compromisos aquí pactados no modifican por si solos las condiciones de un contrato suscrito con ASOSUPRO.

La presente Acta de Comité es leída y suscrita por los participantes.

ACTA COMITÉ TÉCNICO No. 03

ASOSUPRO

CIUDAD	FECHA			HORA	
Villavicencio	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	03	07	2026	10:00am	12:00am

VII. PARTICIPANTES

NOMBRE	FIRMA
LINA MELISA ROJAS VALBUENA	
JEFFERSON PARRRA CAPERA	
LAURO DANIEL LEÓN	
ESNEIDER RAFAEL TORRES SUAREZ	

ACTA COMITÉ TÉCNICO No. 04

ASOSUPRO

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
Villavicencio	03	07	2026	4:00pm	05:00pm

II. CONVOCADOS		
NOMBRE	**CARGO**	**ENTIDAD**
JOSUÉ NEFTALI VALERO CAMARGO	REPRESENTANTE LEGAL	ENERGIA INTEGRAL ANDINA SA
LUZ NEILA DIAZ MOGOLLON	REPRESENTANTE LEGAL	PROYECTOS TRIPLE O SAS
LAURO DANIEL LEÓN GARZÓN	DIRECTOR DE OBRA	ENERGIA INTEGRAL ANDINA SA
ESNEIDER RAFAEL TORRES SUAREZ	DIRECTOR INTERVENTORIA	PROYECTOS TRIPLE O SAS
SANDRA MILENA HERNÁNDEZ ESGUERRA	PROFESIONAL SISOMA OBRA	ENERGIA INTEGRAL ANDINA SA

III. OBJETIVO
Fortalecer la coordinación técnica, administrativa y documental entre el contratista de obra y la interventoría, definiendo lineamientos de trabajo, canales de comunicación y responsabilidades que permitan garantizar el adecuado seguimiento, control y cumplimiento de las obligaciones contractuales.

ACTA COMITÉ TÉCNICO No. 04

ASOSUPRO

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
Villavicencio	03	07	2026	4:00pm	05:00pm

I. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE CONTRATO:

OBRA E INTERVENTORÍA

CONTRATO OBRA N°: 019 DE 2026
CONTRATO INTERVENTORIA N°: 019 DE 2026 **PROYECTO N°:** 2025850010003

OBJETO:

OBRA
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.

INTERVENTORÍA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.

CONTRATISTA:

OBRA - ENERGÍA INTEGRAL ANDINA SA

INTERVENTORÍA - PROYECTOS TRIPLE O SAS

ACTA COMITÉ TÉCNICO No. 04

ASOSUPRO

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
Villavicencio	03	07	2026	4:00pm	05:00pm

IV. DESARROLLO DEL COMITÉ

Siendo las 04:00pm del día tres (03) de julio de 2026, se llevó a cabo reunión virtual y durante la mesa de trabajo se realizó una revisión integral de la metodología de trabajo que se implementará durante la ejecución del contrato, estableciendo mecanismos de coordinación entre los equipos de obra e interventoría para optimizar el flujo de información y fortalecer el seguimiento de las actividades desarrolladas en campo.

Se definieron los roles y responsabilidades de cada uno de los integrantes del equipo, así como los canales oficiales de comunicación para la atención de requerimientos técnicos, administrativos y documentales, procurando mantener una adecuada trazabilidad de la información generada durante la ejecución del proyecto.

Así mismo, se acordó centralizar la documentación técnica y administrativa del proyecto y utilizar formatos estandarizados para la elaboración de informes y soportes, con el propósito de minimizar observaciones por parte de la entidad contratante y facilitar la revisión de la información presentada.

La interventoría reiteró la importancia de mantener actualizados diariamente los registros de avance de obra y la recopilación de evidencias fotográficas, con el fin de consolidar oportunamente los informes mensuales y contar con soportes suficientes que respalden las actividades ejecutadas.

Igualmente, se socializó la necesidad de contar con apoyo técnico en las actividades de topografía y diseño fotométrico para la definición de la ubicación de postes y brazos de luminarias, garantizando que las soluciones adoptadas cumplan con los criterios técnicos establecidos para el proyecto.

Finalmente, se acordó realizar reuniones periódicas de seguimiento entre obra e interventoría durante la ejecución del contrato, con el fin de evaluar el avance de las actividades, revisar compromisos y atender oportunamente las situaciones que se presenten durante el desarrollo del proyecto.

ACTA COMITÉ TÉCNICO No. 04


ASOSUPRO

CIUDAD	FECHA			HORA	
Villavicencio	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	03	07	2026	4:00pm	05:00pm

TEMAS TRATADOS

- Definición de roles y responsabilidades del equipo de trabajo.
- Lineamientos para la gestión documental del proyecto.
- Estandarización de formatos para informes y soportes.
- Organización y centralización de la documentación contractual.
- Seguimiento diario de avances y evidencias fotográficas.
- Apoyo técnico para actividades de topografía y diseño fotométrico.
- Canales oficiales de comunicación entre obra e interventoría.
- Programación de comités periódicos de seguimiento.


REGISTRO FOTOGRÁFICO

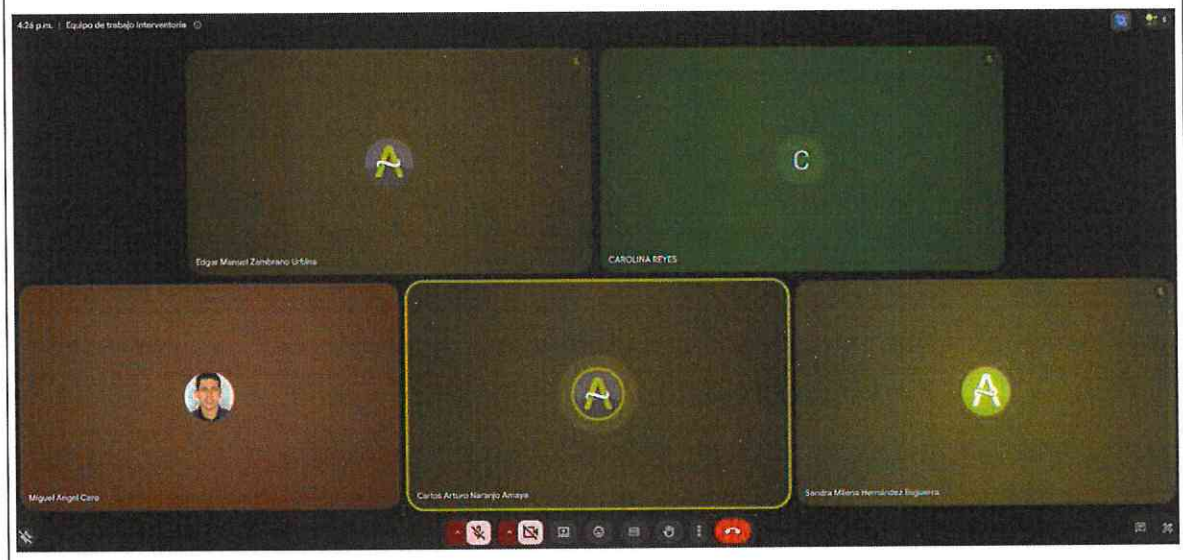

ACTA COMITÉ TÉCNICO No. 04

ASOSUPRO

CIUDAD	FECHA			HORA	
Villavicencio	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	03	07	2026	4:00pm	05:00pm

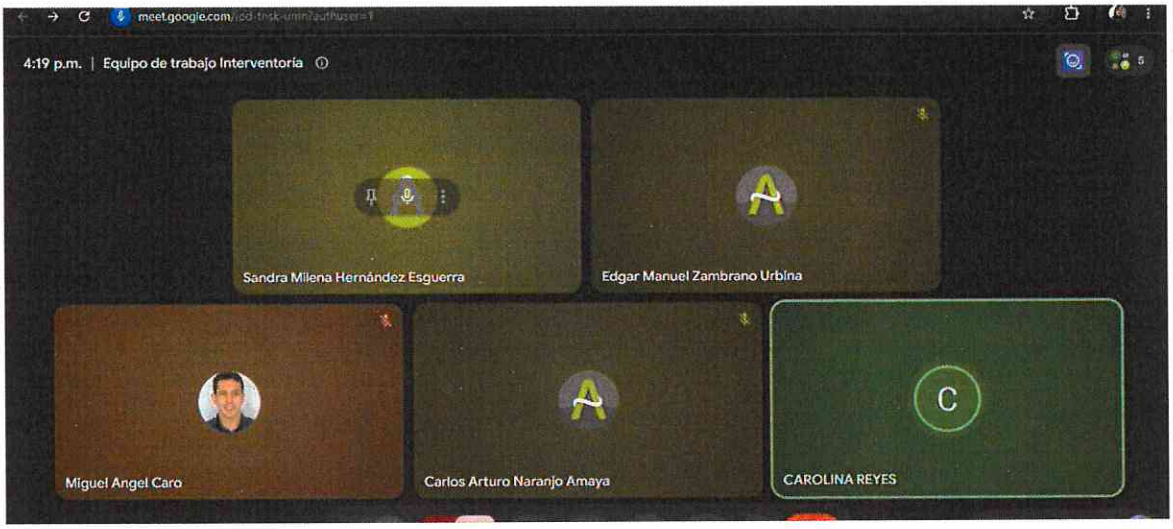

CONCLUSIONES

La reunión permitió establecer los lineamientos de coordinación entre el contratista de obra y la interventoría, fortaleciendo los procesos de comunicación, seguimiento técnico y gestión documental. Los acuerdos alcanzados contribuirán a mejorar la oportunidad en la entrega de información, garantizar la disponibilidad de soportes para los informes mensuales y facilitar el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la ejecución del proyecto.

ACTA COMITÉ TÉCNICO No. 04

ASOSUPRO

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
Villavicencio	03	07	2026	4:00pm	05:00pm

V. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA			
No.	**COMPROMISOS**	**RESPONSABLE**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
1	Centralizar la documentación técnica y administrativa del proyecto y utilizar formatos estandarizados.	Obra e Interventoría	Permanente
2	Alimentar diariamente la información requerida para la elaboración de los informes mensuales de interventoría.	Obra e Interventoría	Una vez recibida la información
3	Remitir los requerimientos de la interventoría mediante correo electrónico para garantizar la trazabilidad documental.	Interventoría	Permanente
4	Enviar diariamente los informes de avance de obra y el registro fotográfico al grupo de trabajo.	Residente de Obra	Permanente
5	Brindar apoyo técnico en las actividades de topografía y diseño fotométrico para la definición de la ubicación de postes y brazos de luminarias.	Director de Obra	Inmediato una vez identificada la situación
6	Realizar dos (2) comités de seguimiento mensuales durante la ejecución del contrato.	Interventoría	Mensualmente

VI. PRÓXIMA REUNIÓN
NUEVA REUNIÓN CONVOCADA POR: PENDIENTE DEFINIR
FECHA, HORA Y SITIO DE NUEVA REUNÍON: Se notificará por correo electrónico


ACTA COMITÉ TÉCNICO No. 04

ASOSUPRO

CIUDAD	FECHA			HORA	
Villavicencio	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	03	07	2026	4:00pm	05:00pm

Las decisiones tomadas y los compromisos aquí pactados no modifican por si solos las condiciones de un contrato suscrito con ASOSUPRO.

La presente Acta de Comité es leída y suscrita por los participantes.

VII. PARTICIPANTES	
NOMBRE	**FIRMA**
JOSUÉ NEFTALI VALERO CAMARGO	
LUZ NEILA DIAZ MOGOLLÓN	
LAURO DANIEL LEÓN GARZÓN	
ESNEIDER RAFAEL TORRES SUAREZ	
SANDRA MILENA HERNÁNDEZ ESGUERRA	

ACTA COMITÉ TÉCNICO No. 05

ASOSUPRO

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
Villavicencio	10	07	2026	8:00am	09:00am

I. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE CONTRATO:

OBRA E INTERVENTORÍA

CONTRATO OBRA N°: 019 DE 2026
CONTRATO INTERVENTORIA N°: 019 DE 2026 **PROYECTO N°:** 2025850010003

OBJETO:

OBRA
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.

INTERVENTORÍA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.

CONTRATISTA:

OBRA - ENERGÍA INTEGRAL ANDINA SA

INTERVENTORÍA - PROYECTOS TRIPLE O SAS

ACTA COMITÉ TÉCNICO No. 05

ASOSUPRO

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
Villavicencio	10	07	2026	8:00am	09:00am

II. CONVOCADOS		
NOMBRE	**CARGO**	**ENTIDAD**
LINA MELISA ROJAS VALBUENA	SUPERVISOR	ASOSUPRO -ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
JEFFERSON PARRA CAPERA	APOYO A LA SUPERVISIÓN	ASOSUPRO -ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
LAURO DANIEL LEÓN GARZÓN	DIRECTOR DE OBRA	ENERGIA INTEGRAL ANDINA SA
ESNEIDER RAFAEL TORRES SUAREZ	DIRECTOR INTERVENTORIA	PROYECTOS TRIPLE O SAS
SANDRA MILENA HERNÁNDEZ ESGUERRA	PROFESIONAL SISOMA OBRA	ENERGIA INTEGRAL ANDINA SA

III. OBJETIVO
Realizar seguimiento al estado de elaboración del primer informe mensual de obra e interventoría, revisar las situaciones técnicas que actualmente afectan la ejecución del proyecto y definir los compromisos necesarios para garantizar la adecuada presentación de los informes y la continuidad de las actividades del contrato.

ACTA COMITÉ TÉCNICO No. 05

ASOSUPRO

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
Villavicencio	10	07	2026	8:00am	09:00am

IV. DESARROLLO DEL COMITÉ

Siendo las 08:00am del día diez (10) de julio de 2026, se llevó a cabo reunión virtual con la intervención de la Arq. Lina, Supervisora del Contrato, quien solicitó al contratista de obra y a la interventoría presentar el estado de avance en la preparación del primer informe mensual, verificando el cumplimiento de los soportes técnicos, administrativos y documentales requeridos para su radicación.

Dentro del estado del avance de obra, el contratista informó que actualmente existen tres (3) puntos en los cuales la ubicación proyectada de la postería presenta interferencia con predios privados. Esta situación continúa pendiente de definición, debido a que la Secretaría de Planeación aún no ha emitido respuesta formal respecto a la solicitud de información relacionada con la planimetría y el ancho oficial de la vía, información indispensable para determinar la ubicación definitiva de las estructuras.

En consecuencia, se indicó que dichos puntos representan la principal restricción para el avance del proyecto. Adicionalmente, se acordó que para estos tres predios deberán elaborarse las respectivas actas de vecindad, dejando consignada la fecha de radicación del oficio mediante el cual se solicitó la información técnica a la Secretaría de Planeación, con el propósito de evidenciar que la gestión fue realizada oportunamente por las partes.

En aquellos casos en que no sea posible obtener la firma de los propietarios por ausencia en el inmueble, se dejará constancia mediante registro fotográfico que evidencie la visita realizada, con el fin de soportar documentalmente la gestión adelantada.

El Director de Interventoría, Ing. Esneider Torres, manifestó que, una vez se cuente con la información definitiva sobre el ancho de la vía o se determine la imposibilidad de obtener una respuesta en un tiempo razonable, podrá evaluarse técnicamente la alternativa de modificar la ubicación de las luminarias o aumentar la Inter distancia entre postes, buscando minimizar las afectaciones sobre los

ACTA COMITÉ TÉCNICO No. 05

ASOSUPRO

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
Villavicencio	10	07	2026	8:00am	09:00am

predios y garantizar la viabilidad técnica del proyecto, siempre que dicha alternativa cumpla con la normatividad aplicable y cuente con la aprobación correspondiente.

Dentro de los temas abordados, se habló sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, donde el contratista de obra informó que, dado que durante el período evaluado aún no se han habilitado frentes activos de obra, el informe correspondiente a Seguridad y Salud en el Trabajo contemplará únicamente el reporte de los cinco (5) profesionales previamente aprobados para el contrato.

Por parte de la interventoría se recomendó incorporar una tabla consolidada con las fechas de ingreso del personal, con el fin de facilitar la revisión documental y la verificación de los soportes asociados al equipo de trabajo.

La Supervisión recordó los lineamientos para la presentación del primer informe mensual y reiteró la importancia de entregar la documentación completamente organizada, con todos los soportes técnicos, administrativos, financieros y fotográficos requeridos.

Así mismo, se acordó mantener un plazo máximo de diez (10) días calendario, contados a partir del cierre del período de corte mensual, para la entrega de los informes por parte del contratista a la interventoría para su revisión. Posteriormente, una vez surtido dicho proceso, la documentación deberá ser presentada en físico en las instalaciones de ASOSUPRO.


Teniendo en cuenta que el primer corte corresponde al 08 de julio de 2026, se estableció como fecha máxima estimada para la radicación física del primer informe el 21 de julio de 2026, previo cumplimiento de la revisión documental por parte de la interventoría.

ACTA COMITÉ TÉCNICO No. 05

ASOSUPRO

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
Villavicencio	10	07	2026	8:00am	09:00am


REGISTRO FOTOGRÁFICO

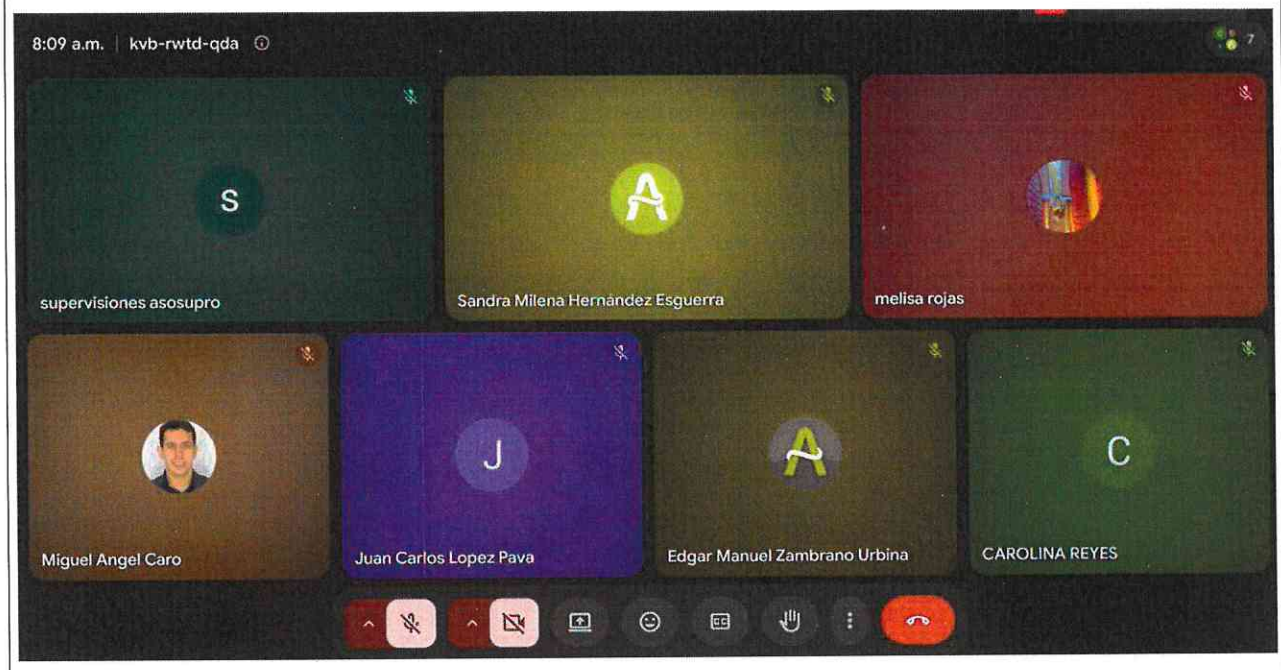


ACTA COMITÉ TÉCNICO No. 05

ASOSUPRO
Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
Villavicencio	10	07	2026	8:00am	09:00am

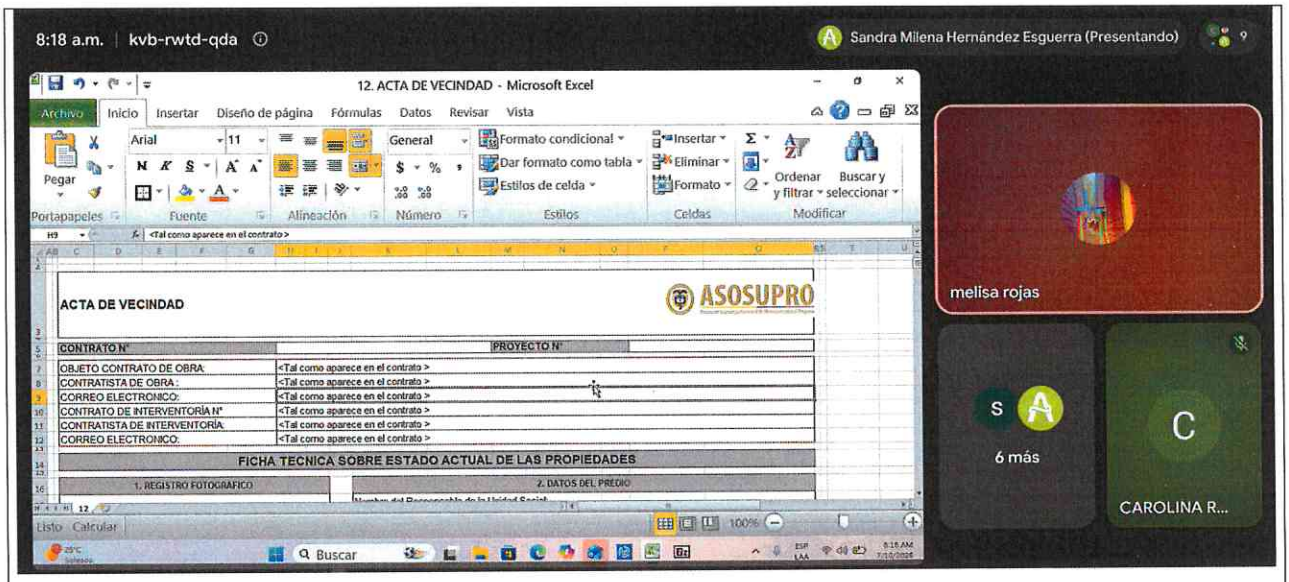

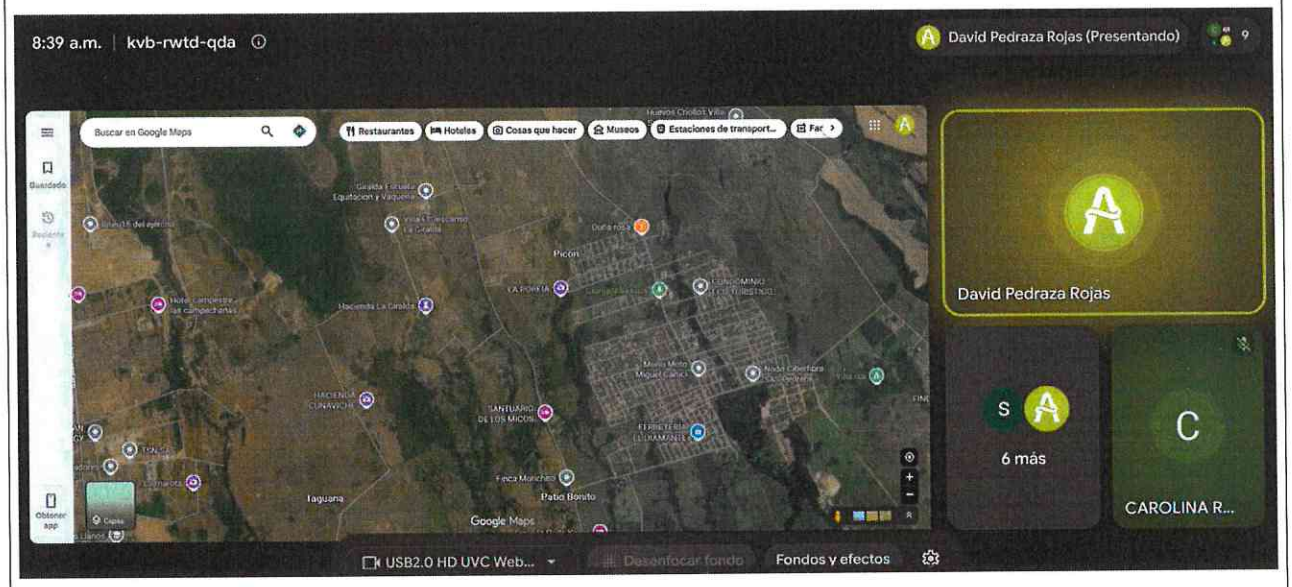

ACTA COMITÉ TÉCNICO No. 05

ASOSUPRO

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
Villavicencio	10	07	2026	8:00am	09:00am



CONCLUSIONES

La Supervisión del Contrato verificó el estado de preparación del primer informe mensual y reiteró la importancia de mantener una gestión documental organizada y oportuna. Se identificó como principal situación pendiente la definición de tres puntos donde la ubicación de la postería podría afectar predios privados, debido a la falta de respuesta de la Secretaría de Planeación respecto al ancho oficial de la vía.

Las partes acordaron adelantar las gestiones necesarias para obtener dicha información y, en caso de persistir la situación, evaluar alternativas técnicas que permitan garantizar la continuidad del proyecto sin afectar las condiciones de diseño ni el cumplimiento de las especificaciones contractuales.

ACTA COMITÉ TÉCNICO No. 05

ASOSUPRO

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
Villavicencio	10	07	2026	8:00am	09:00am

V. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA			
No.	**COMPROMISOS**	**RESPONSABLE**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
1	Remitir oficio reiterando la solicitud de información técnica relacionada con la planimetría y el ancho oficial de la vía.	Interventoría	Inmediato
2	Gestionar una reunión con la Secretaría de Planeación para definir la situación de los tres predios afectados.	Supervisión	Pendiente de programación
3	Elaborar y diligenciar las actas de vecindad correspondientes a los tres predios pendientes, dejando constancia de la radicación del oficio y del registro fotográfico cuando no sea posible obtener la firma de los propietarios.	Contratista de Obra	Antes de la intervención de los puntos
4	Evaluar técnicamente la alternativa de modificar la ubicación de luminarias o aumentar la Inter distancia entre postes, una vez se cuente con la información necesaria o se determine la viabilidad de dicha solución.	Dirección de Interventoría y Contratista	Según avance
5	Presentar el primer informe mensual con la totalidad de los soportes técnicos, administrativos y fotográficos dentro del plazo acordado.	Obra e Interventoría	A más tardar el 21 de julio de 2026

ACTA COMITÉ TÉCNICO No. 05

ASOSUPRO

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
Villavicencio	10	07	2026	8:00am	09:00am

VI. PRÓXIMA REUNIÓN
NUEVA REUNIÓN CONVOCADA POR: PENDIENTE DEFINIR
FECHA, HORA Y SITIO DE NUEVA REUNÍON: Se notificará por correo electrónico

Las decisiones tomadas y los compromisos aquí pactados no modifican por si solos las condiciones de un contrato suscrito con ASOSUPRO.

La presente Acta de Comité es leída y suscrita por los participantes.

VII. PARTICIPANTES	
NOMBRE	**FIRMA**
LINA MELISA ROJAS VALBUENA	
JEFFERSON PARRA CAPERA	
LAURO DANIEL LEÓN GARZÓN	
ESNEIDER RAFAEL TORRES SUAREZ	
SANDRA MILENA HERNÁNDEZ ESGUERRA	

ACTA COMITÉ TÉCNICO No. 06

ASOSUPRO

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
YOPAL	24	07	2026	8:00am	9:00am

I. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE CONTRATO:

OBRA E INTERVENTORÍA

CONTRATO OBRA N°: 019 DE 2026
CONTRATO INTERVENTORIA N°: 019 DE 2026 **PROYECTO N°:** 2025850010003

OBJETO:

OBRA
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.

INTERVENTORÍA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.

CONTRATISTA:

OBRA - ENERGÍA INTEGRAL ANDINA SA

INTERVENTORÍA - PROYECTOS TRIPLE O SAS

ACTA COMITÉ TÉCNICO No. 06

ASOSUPRO

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
YOPAL	24	07	2026	8:00am	9:00am

II. CONVOCADOS		
NOMBRE	**CARGO**	**ENTIDAD**
LAURO DANIEL LEÓN GARZÓN	DIRECTOR DE OBRA	ENERGIA INTEGRAL ANDINA SA
MIGUEL ANGEL CARO JIMENEZ	DIRECTOR INTERVENTORIA	PROYECTOS TRIPLE O SAS
BRAYAN JOSÉ FONTALVO RÚA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	PROYECTOS TRIPLE O SAS
SANDRA MILENA HERNÁNDEZ ESGUERRA	PROFESIONAL SISOMA OBRA	ENERGIA INTEGRAL ANDINA SA

III. OBJETIVO
Realizar la presentación y revisión de los planos de replanteo correspondientes a la ubicación de los postes de alumbrado, junto con la información topográfica y fotométrica asociada, con el propósito de establecer las condiciones necesarias para continuar con las actividades constructivas y garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP).

ACTA COMITÉ TÉCNICO No. 06

ASOSUPRO

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
YOPAL	24	07	2026	8:00am	9:00am

IV. DESARROLLO DEL COMITÉ

Siendo las 8:00am del día veinte cuatro (24) de julio de 2026, se llevó a cabo reunión virtual con la intervención de la Interventoría y el contratista de obra. El comité inició la presentación y revisión de los planos de replanteo correspondientes a la ubicación de los postes de alumbrado por parte del contratista, junto con la información topográfica y fotométrica asociada, con el propósito de establecer las condiciones necesarias para continuar con las actividades constructivas y garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP).

Durante la reunión se realizó la presentación de los planos de replanteo, incorporando la información topográfica correspondiente a la ubicación de los postes comprendidos entre los postes 1 al 193.

De igual manera, se presentó la fotometría de las luminarias, información que permitirá verificar las condiciones técnicas del sistema de iluminación y avanzar en el cumplimiento de los requerimientos reglamentarios establecidos por el RETILAP.

Pregunta la interventoría si la nueva fotometría está tomando de referencia los diseños técnicos que dan origen al contrato de obra que se ejecuta actualmente, a lo que el contratista manifiesta que sí y que solo se está simulando con los archivos .IES de las nuevas luminarias, respetando las condiciones iniciales del proyecto.

En relación con los postes 194 al 244, se informó que, a la fecha de la reunión, no se encuentra definido el perfil vial requerido para establecer de manera definitiva su ubicación y las condiciones de instalación. Esta situación obedece a que el sector corresponde a una zona que actualmente no se encuentra pavimentada, por lo cual se requiere definir previamente la configuración vial y la forma constructiva que deberá implementarse.

Indica la interventoría que los perfiles viales lo debe definir el área encargada por parte del municipio de Yopal, ya sea la secretaría de planeación o infraestructura, según corresponda y que no está dentro de las responsabilidades de la interventoría, por ende se requiere si o si algún tipo de aprobación por parte de la entidad.

ACTA COMITÉ TÉCNICO No. 06

ASOSUPRO

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
YOPAL	24	07	2026	8:00am	9:00am

Sobre este punto, se deja constancia de que la Interventoría y el equipo de Obra continúan trabajando de manera conjunta para gestionar ante el municipio la definición del perfil vial y de la solución constructiva aplicable a este sector, con el fin de establecer posteriormente la ubicación definitiva de los postes 194 al 244.

El equipo de obra seguirá trabajando en el replanteo del poste 245 al 425.

Pregunta el contratista de obra si es posible dar inicio con las actividades de excavación para los puntos que ya han sido levantados topográficamente y que es fácil identificar el perfil vial, en concreto para los puntos del 1 al 193.

La interventoría indica que siempre y cuando cumplan con los requisitos de los anexos técnicos de la invitación, se pueden arrancar las actividades de excavación.

Por otra parte se indica que se debe validar si existe algún operador de alumbrado público para gestionar el aprobado del cambio de luminarias y a su vez la forma del proceso de entrega.

CONCLUSIONES

- Se da por presentada la información correspondiente a los planos de replanteo y topografía de los postes 1 al 193, así como la fotometría de las luminarias.
- La información fotométrica presentada permitirá continuar con la verificación de las condiciones técnicas del proyecto y su correspondiente cumplimiento de los requisitos establecidos en el RETILAP.
- Se deja constancia de que la ubicación de los postes 194 al 244 permanece pendiente de definición, debido a la falta de un perfil vial establecido para el sector no pavimentado.
- La Interventoría y Obra continuarán realizando las gestiones necesarias ante el municipio para definir el perfil vial y la alternativa constructiva correspondiente al tramo donde se ubicarán los postes 194 al 244.

ACTA COMITÉ TÉCNICO No. 06

ASOSUPRO

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
YOPAL	24	07	2026	8:00am	9:00am

- Con base en los planos de replanteo presentados, se autoriza dar inicio al proceso de excavación de los puntos correspondientes a la instalación de los postes 1 al 193, de acuerdo con las ubicaciones indicadas en los planos revisados.

V. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA

No.	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	Continuar de manera conjunta las gestiones ante el municipio para obtener la definición del perfil vial correspondiente al sector donde se proyectan los postes 194 al 244.	Interventoría y obra	Agosto
2	Dar inicio a las actividades de replanteo y excavación de los puntos correspondientes a los postes 1 al 193 y 245 al 425, conforme a los planos de replanteo y la información topográfica presentada.	Contratista de obra	28 de julio
3	Validar la existencia de un operador de alumbrado público y gestionar las aprobaciones que se requieran.	Contratista de Obra	Agosto

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

NUEVA REUNIÓN CONVOCADA POR: PENDIENTE DEFINIR

FECHA, HORA Y SITIO DE NUEVA REUNÍON: Se notificará por correo electrónico

ACTA COMITÉ TÉCNICO No. 06

ASOSUPRO

CIUDAD	FECHA			HORA	
YOPAL	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	24	07	2026	8:00am	9:00am

Las decisiones tomadas y los compromisos aquí pactados no modifican por si solos las condiciones de un contrato suscrito con ASOSUPRO.

La presente Acta de Comité es leída y suscrita por los participantes.

VII. PARTICIPANTES	
NOMBRE	**FIRMA**
LAURO DANIEL LEÓN GARZÓN	
MIGUEL ANGEL CARO JIMENEZ	
SANDRA MILENA HERNÁNDEZ ESGUERRA	

ACTA COMITÉ TÉCNICO No. 07

ASOSUPRO

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
Villavicencio	31	07	2026	10:00am	11:00am

I. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE CONTRATO:

OBRA E INTERVENTORÍA

CONTRATO OBRA N°: 019 DE 2026
CONTRATO INTERVENTORIA N°: 019 DE 2026 **PROYECTO N°:** 2025850010003

OBJETO:

OBRA
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.

INTERVENTORÍA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.

CONTRATISTA:

OBRA - ENERGÍA INTEGRAL ANDINA SA

INTERVENTORÍA - PROYECTOS TRIPLE O SAS

ACTA COMITÉ TÉCNICO No. 07

ASOSUPRO

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
Villavicencio	31	07	2026	10:00am	11:00am

II. CONVOCADOS		
NOMBRE	**CARGO**	**ENTIDAD**
JEFFERSON PARRA CAPERA	APOYO A LA SUPERVISIÓN	ASOSUPRO -ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
LAURO DANIEL LEÓN GARZÓN	DIRECTOR DE OBRA	ENERGIA INTEGRAL ANDINA SA
MIGUEL ANGEL CARO JIMENEZ	DIRECTOR INTERVENTORIA	PROYECTOS TRIPLE O SAS
BRAYAN JOSE FONTALVO RUA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	PROYECTOS TRIPLE O SAS
SANDRA MILENA HERNÁNDEZ ESGUERRA	PROFESIONAL SISOMA OBRA	ENERGIA INTEGRAL ANDINA SA

III. OBJETIVO
Realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato de obra, revisar el estado de las actividades desarrolladas en campo, verificar el cumplimiento de los compromisos contractuales y definir lineamientos para la presentación de informes y trámites administrativos asociados a la ejecución del proyecto.

ACTA COMITÉ TÉCNICO No. 07

ASOSUPRO

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
Villavicencio	31	07	2026	10:00am	11:00am

IV. DESARROLLO DEL COMITÉ

Siendo las 10:00am del día treinta y uno (31) de julio de 2026, se llevó a cabo reunión virtual con la intervención de la Supervisión, Interventoría y Contrato de Obra, El comité inició con la intervención del contratista de obra, quien informó que ya se cuenta con personal en campo ejecutando las actividades correspondientes a la excavación para el hincado de postes. Así mismo, manifestó que, a la fecha de realización del comité, se habían ejecutado aproximadamente ochenta (80) excavaciones, evidenciando el avance de las actividades programadas. De igual manera, indicó que la valla informativa del proyecto ya se encontraba instalada, dando cumplimiento a la obligación contractual correspondiente.

Posteriormente, la supervisión consultó sobre el estado de las actas de vecindad, frente a lo cual se informó que estas fueron entregadas como parte de los soportes anexos al informe correspondiente al período comprendido entre el 09 de junio y el 08 de julio de 2026. Seguidamente, la supervisión indagó si dichas actas habían sido levantadas en presencia de los propietarios de los predios intervenidos. El contratista explicó que, en la mayoría de los casos, los puntos intervenidos corresponden a cercas que delimitan presuntas fincas y no a fachadas o inmuebles habitados, situación que impidió ubicar a los propietarios para la suscripción de las respectivas actas.

En relación con los predios que, presuntamente, invaden el espacio público, la supervisión consultó si esta situación había sido puesta en conocimiento de la Alcaldía de Yopal. Al respecto, la interventoría manifestó que hasta la fecha no se ha remitido comunicación oficial, debido a que se encuentra pendiente la entrega del informe de replanteo por parte del contratista de obra, documento que servirá como soporte técnico para sustentar la respectiva consulta ante la administración municipal.

Por su parte, el contratista informó que tampoco ha elevado dicha consulta a la Alcaldía.
Posteriormente, la supervisión recordó que las solicitudes de pago deberán radicarse juntamente con los informes periódicos, conforme a lo establecido en el contrato, indicando además que cada cuenta de cobro deberá anexar el Registro Único Tributario (RUT) con una vigencia no mayor a noventa (90) días y la certificación bancaria con una expedición no superior a treinta (30) días.


ACTA COMITÉ TÉCNICO No. 07

ASOSUPRO
Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
Villavicencio	31	07	2026	10:00am	11:00am

Finalmente, la interventoría consultó si existía un formato específico para la radicación de las cuentas de cobro, a lo que la supervisión respondió que la documentación deberá presentarse de conformidad con el Acta de Relación de Personal y la Lista de Chequeo establecida para la interventoría. Así mismo, informó que el contrato de obra cuenta con una lista de chequeo propia, la cual deberá ser utilizada para la presentación de los documentos requeridos en cada trámite.


REGISTRO FOTOGRÁFICO

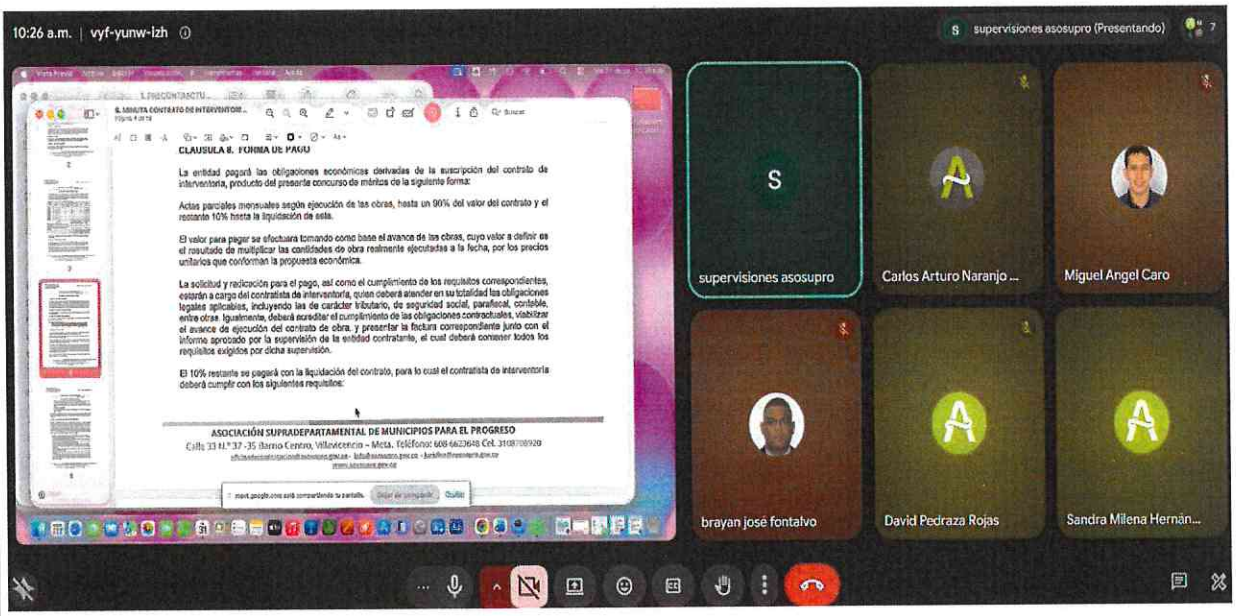

ACTA COMITÉ TÉCNICO No. 07

ASOSUPRO

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
Villavicencio	31	07	2026	10:00am	11:00am

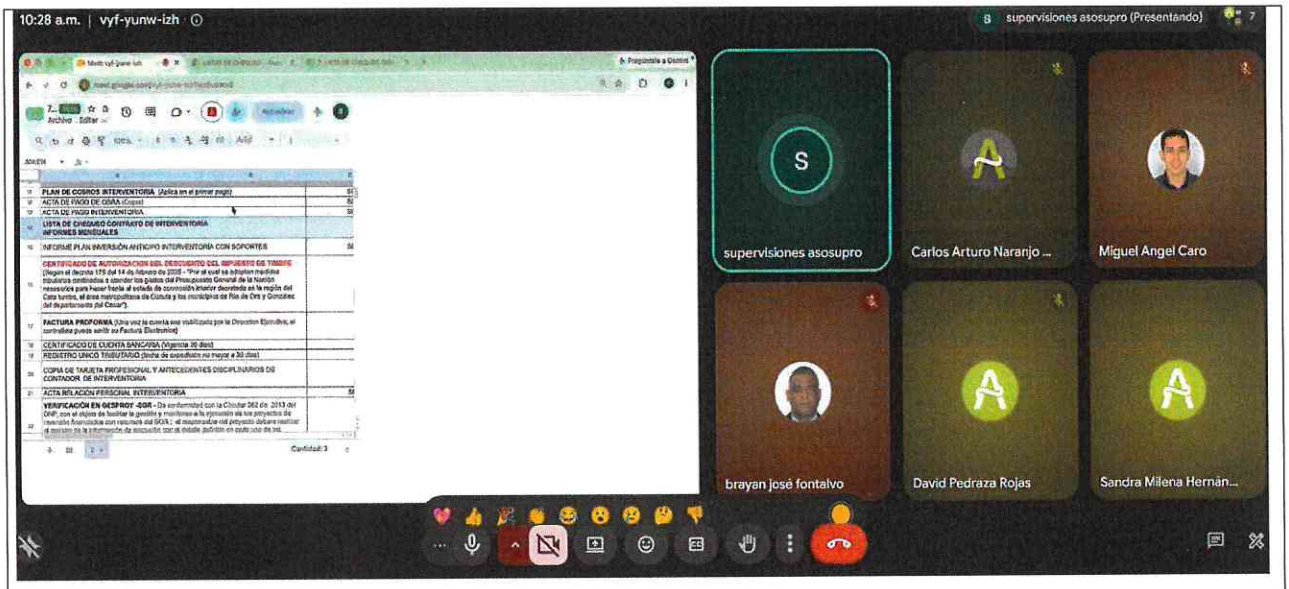

CONCLUSIONES

- Se evidenció el inicio de las actividades constructivas en campo, registrándose un avance de aproximadamente ochenta (80) excavaciones para el hincado de postes.
- Se verificó el cumplimiento de la instalación de la valla informativa del proyecto.
- Se confirmó la entrega de las actas de vecindad junto con el primer informe mensual de ejecución.
- Se identificó la necesidad de contar con el informe de replanteo para soportar técnicamente la consulta ante la Alcaldía de Yopal respecto de los predios que presuntamente invaden el espacio público.
- La supervisión reiteró los requisitos documentales que deberán acompañar la presentación de los informes y las solicitudes de pago.

ACTA COMITÉ TÉCNICO No. 07

ASOSUPRO

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
Villavicencio	31	07	2026	10:00am	11:00am

V. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA			
No.	**COMPROMISOS**	**RESPONSABLE**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
1	Continuar con la ejecución de las actividades de excavación e instalación de postes conforme a la programación del proyecto.	Contratista de obra	Permanente
2	Entregar el informe de replanteo con el fin de soportar la consulta ante la Alcaldía de Yopal respecto de los predios identificados.	Contratista de obra	Próximo comité
3	Una vez recibido el informe de replanteo, elaborar y remitir la comunicación correspondiente a la Alcaldía de Yopal, de ser procedente.	Interventoría	Próximo comité
4	Presentar los informes y las cuentas de cobro con la totalidad de los documentos exigidos contractualmente, incluyendo RUT vigente, certificación bancaria y listas de chequeo correspondientes.	Contratista de obra e Interventoría	En cada radicación
5	Aplicar las listas de chequeo establecidas para la interventoría y para el contrato de obra en cada entrega documental.	Contratista de obra, Interventoría y Supervisión	Permanente

ACTA COMITÉ TÉCNICO No. 07


ASOSUPRO

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
Villavicencio	31	07	2026	10:00am	11:00am

VI. PRÓXIMA REUNIÓN
NUEVA REUNIÓN CONVOCADA POR: PENDIENTE DEFINIR
FECHA, HORA Y SITIO DE NUEVA REUNÍON: Se notificará por correo electrónico

Las decisiones tomadas y los compromisos aquí pactados no modifican por si solos las condiciones de un contrato suscrito con ASOSUPRO.

La presente Acta de Comité es leída y suscrita por los participantes.

VII. PARTICIPANTES	
NOMBRE	**FIRMA**
JEFFERSON PARRA CAPERA	
LAURO DANIEL LEÓN GARZÓN	
MIGUEL ANGEL CARO JIMENEZ	
BRAYAN JOSE FONTALVO RUA	
SANDRA MILENA HERNÁNDEZ ESGUERRA	

CORRESPONDENCIA ENVIADA

Gmail

Sandra Milena Hernández Esguerra <sandra.hernandez@eiasa.com.co>

Comunicado EIA-005-2026 Plan de Manejo de Trafiico

1 mensaje

Sandra Milena Hernández Esguerra <sandra.hernandez@eiasa.com.co> 29 de julio de 2026 a las 5:17 p.m.
Para: "Ing. MACJ" <ing.elec.miguelcaro@gmail.com>
CC: tripleosas@hotmail.com, Carlos Arturo Naranjo Amaya <carlos.naranjo@eiasa.com.co>, Lauro Daniel Leon Garzón <daniel.leon@eiasa.com.co>, David Pedraza Rojas <david.pedraza@eiasa.com.co>

EIA-005-26
Referencia

Yopal, Casanare, 29 de julio de 2026

Señores
PROYECTOS TRIPLE O SAS
Atn. LUZ NEILA DÍAZ MOGOLLÓN
Representante Legal
Interventoría Contrato No. 019 de 2026

Referencia: Respuesta a la solicitud de información sobre el estado de aprobación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT).

Cordial saludo,

En atención a la comunicación INT-CTO-019-2026-005, mediante la cual se solicita información relacionada con el estado de aprobación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) radicado, nos permitimos informar que este fue aprobado por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Yopal, mediante la Resolución N.° 04570 del 17 de julio de 2026.

Para su conocimiento y fines pertinentes, remitimos adjunta la resolución mediante la cual se formaliza la aprobación del PMT.

Sin otro particular, quedamos atentos a cualquier información adicional que se requiera.

Cordialmente,

Daniel León Garzón
Director de proyecto
ENERGÍA INTEGRAL ANDINA S.A.

--
***Cordialmente** / Best Regards*

Sandra Milena Hernández E
Profesional SST | *Professional SST*

+57 3144849210
sandra.hernandez@eiasa.com.co
www.eiasa.com.co
Carrera 19B No. 166-73 Bogotá, Colombia
+57 601 668 4343

2 archivos adjuntos

Resolución N.° 04570 del 17 de julio de 2026-PMT LA PEDRERA.pdf
11219K

EIA-005-26 Respuesta PMT.pdf
161K



ENERGÍA INTEGRAL ANDINA.

www.eia.com.co

EIA-005-26
Referencia

Yopal, Casanare, 29 de julio de 2026.

Señores
PROYECTOS TRIPLE O SAS
Atn. LUZ NEILA DÍAZ MOGOLLÓN
Representante Legal
Interventoría Contrato No. 019 de 2026

Referencia: Respuesta a la solicitud de información sobre el estado de aprobación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT).

Cordial saludo,

En atención a la comunicación INT-CTO-019-2026-005, mediante la cual se solicita información relacionada con el estado de aprobación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) radicado, nos permitimos informar que este fue aprobado por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Yopal, mediante la Resolución N.° 04570 del 17 de julio de 2026.

Para su conocimiento y fines pertinentes, remitimos adjunta la resolución mediante la cual se formaliza la aprobación del PMT.

Sin otro particular, quedamos atentos a cualquier información adicional que se requiera.

Cordialmente,

Daniel León Garzón
Director de proyecto
ENERGÍA INTEGRAL ANDINA S.A.

Gmail

Sandra Milena Hernández Esguerra <sandra.hernandez@eiasa.com.co>

Informe de Obra No. O1- Contrato de Obra 019 2026

1 mensaje

Sandra Milena Hernández Esguerra <sandra.hernandez@eiasa.com.co> 17 de julio de 2026 a las 6:09 p.m.
Para: juamclp0315@hotmail.com, CAROLINA REYES <creyes.admi21@gmail.com>
CC: Carlos Arturo Naranjo Amaya <carlos.naranjo@eiasa.com.co>, Lauro Daniel Leon Garzón <daniel.leon@eiasa.com.co>

EIA-003-26
Referencia

Yopal, Casanare, 15 de julio de 2026

Señores:
PROYECTOS TRIPLE O S.A.S.
Interventoría Contrato No. 019 de 2026
Atn. LUZ NEILA DÍAZ MOGOLLÓN
Representante Legal
Correo: tripleosas@hotmail.com

Asunto: Radicación informe mensual No. 001 -Contrato de Obra 019 de 2026, cuyo objeto es "implementación de sistemas solares fotovoltaicos de iluminación en la vía la pedrera del municipio de Yopal, Casanare.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito realizar la radicación del informe mensual No. 01 correspondiente al Contrato de Obra No. 019 de 2026, de acuerdo con las actividades ejecutadas y los avances registrados durante el periodo objeto del presente informe, para su respectiva revisión y seguimiento en el marco de las funciones de interventoría.

Así mismo, se comparte el enlace de la carpeta digital que contiene el informe y los documentos de soporte asociados al desarrollo del proyecto:

3. INFORMES MENSUALES - Google Drive
Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a las observaciones, comentarios o requerimientos que se deriven de la revisión del informe presentado.

Atentamente,

Daniel León Garzón
Director de Proyecto
ENERGIA INTEGRAL ANDINA

Comunicado EIA-003-26- Radicación informe mensual 01 ASOSUPRO (2).pdf
328K



ENERGÍA INTEGRAL ANDINA.

www.eia.com.co

EIA-003-26
Referencia

Yopal, Casanare, 15 de julio de 2026

Señores:
PROYECTOS TRIPLE O S.A.S.
Interventoría Contrato No. 019 de 2026
Atn. LUZ NEILA DÍAZ MOGOLLÓN
Representante Legal
Correo: tripleosas@hotmail.com

Asunto: Radicación informe mensual No. 001 -Contrato de Obra 019 de 2026, cuyo objeto es "implementación de sistemas solares fotovoltaicos de iluminación en la vía la pedrera del municipio de Yopal, Casanare.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito realizar la radicación del informe mensual No. 01 correspondiente al Contrato de Obra No. 019 de 2026, de acuerdo con las actividades ejecutadas y los avances registrados durante el periodo objeto del presente informe, para su respectiva revisión y seguimiento en el marco de las funciones de interventoría.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a las observaciones, comentarios o requerimientos que se deriven de la revisión del informe presentado.

Atentamente,

Daniel León Garzón
Director de Proyecto
ENERGIA INTEGRAL ANDINA

Gmail

Sandra Milena Hernández Esguerra <sandra.hernandez@eiasa.com.co>

Comunicado EIA-004-26 Instalación de valla de obra-ASOSUPRO

1 mensaje

Sandra Milena Hernández Esguerra <sandra.hernandez@eiasa.com.co> 29 de julio de 2026 a las 10:00 a.m.
Para: "Ing. MACJ" <ing.elec.miguelcaro@gmail.com>
CC: tripleosas@hotmail.com, Carlos Arturo Naranjo Amaya <carlos.naranjo@eiasa.com.co>, Lauro Daniel Leon Garzón <daniel.leon@eiasa.com.co>, David Pedraza Rojas <david.pedraza@eiasa.com.co>

EIA-004-26
Referencia

Yopal, Casanare, 28 de julio de 2026

Señores
PROYECTOS TRIPLE O SAS
Atn. LUZ NEILA DÍAZ MOGOLLÓN
Representante Legal
Interventoría Contrato No. 019 de 2026

Referencia: Respuesta a la solicitud de información sobre instalación de valla de obra.

Cordial saludo,

En atención a la comunicación INT-CTO-019-2026-007, mediante la cual se solicita informar la fecha programada para el cumplimiento de la obligación relacionada con la instalación de la valla de identificación de la obra, nos permitimos informar que dicha obligación ya fue atendida, toda vez que la valla de obra fue instalada el día 15 de julio de 2026, en cumplimiento de lo establecido en la Cláusula 10 – Obligaciones Específicas del Contratista del Contrato No. 019 de 2026.

En consecuencia, la obligación contractual referente a la instalación de la valla de identificación del proyecto fue cumplida con anterioridad al inicio de las actividades de obra programadas, garantizando su ubicación en un lugar visible para la ciudadanía, de conformidad con las disposiciones contractuales aplicables.

Sin otro particular, quedamos atentos a cualquier información adicional que se requiera.

Cordialmente,

Daniel León Garzón
Director de proyecto
ENERGÍA INTEGRAL ANDINA S.A.

EIA-004-26 Comunicado Interventoria Valla.pdf
236K

EIA-004-26
Referencia

Yopal, Casanare, 28 de julio de 2026

Señores
PROYECTOS TRIPLE O SAS
Atn. LUZ NEILA DÍAZ MOGOLLÓN
Representante Legal
Interventoría Contrato No. 019 de 2026

Referencia: Respuesta a la solicitud de información sobre instalación de valla de obra.

Cordial saludo,


En atención a la comunicación INT-CTO-019-2026-007, mediante la cual se solicita informar la fecha programada para el cumplimiento de la obligación relacionada con la instalación de la valla de identificación de la obra, nos permitimos informar que dicha obligación ya fue atendida, toda vez que la valla de obra fue instalada el día 15 de julio de 2026, en cumplimiento de lo establecido en la Cláusula 10 – Obligaciones Específicas del Contratista del Contrato No. 019 de 2026.

En consecuencia, la obligación contractual referente a la instalación de la valla de identificación del proyecto fue cumplida con anterioridad al inicio de las actividades de obra programadas, garantizando su ubicación en un lugar visible para la ciudadanía, de conformidad con las disposiciones contractuales aplicables.

Sin otro particular, quedamos atentos a cualquier información adicional que se requiera.

Cordialmente,

Daniel León Garzón
Director de proyecto
ENERGÍA INTEGRAL ANDINA S.A.



ENERGÍA INTEGRAL ANDINA.

www.eia.com.co

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

PROYECTOS TRIPLE O S.A.S.
Nit. 901017241-1

Yopal, Casanare, 8 de julio de 2026

Señores
ENERGÍA INTEGRAL ANDINA
Atn. Ing. Carlos Naranjo
Carlos.naranjo@eiasa.com.co
Yopal, Casanare

Asunto: Aprobación del Plan de Manejo de Tráfico (PMT).

Respetados señores:

En calidad de Interventoría del Contrato No. 019 de 2026, nos permitimos informar que, una vez revisado el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) presentado por ENERGÍA INTEGRAL ANDINA, se emite concepto de **APROBACIÓN**, al evidenciar que cumple con los requisitos técnicos y las condiciones necesarias para su implementación.

La presente aprobación se otorga con el entendido de que durante la ejecución de las actividades deberán cumplirse estrictamente las medidas de señalización, seguridad vial, control del tránsito y demás disposiciones establecidas en el PMT aprobado, así como la normatividad vigente aplicable.

Cualquier modificación al Plan de Manejo de Tráfico deberá ser previamente informada y sometida a revisión y aprobación por parte de esta Interventoría antes de su implementación.

Sin otro particular, cordialmente,

LUZ NEILA DÍAZ MOGOLLÓN
Representante Legal
PROYECTOS TRIPLE O S.A.S.
NIT 901.017.241-1
Interventoría Contrato No. 019 de 2026
Correo: tripleosas@hotmail.com

Carrera 54D # 135 - 34
Int. 2 Apto 403
Tel. 313 408 3199
Sfé de Bogotá

PROYECTOS TRIPLE O S.A.S.
Nit. 901017241-1

INT-CTO-019-2026-002

Yopal, Casanare, 17 de julio de 2026

Señores
ENERGÍA INTEGRAL ANDINA
Atn. Ing. DANIEL LEÓN GARZÓN
Director de Proyecto
Yopal, Casanare

Asunto: Aprobación del Informe de Gestión de Obra No. 1

Respetados señores:

En calidad de Interventoría del Contrato No. 019 de 2026, nos permitimos informar que, una vez efectuada la revisión del Informe de Gestión de Obra No. 1, radicado el día 15 de julio de 2026 por ENERGÍA INTEGRAL ANDINA, esta Interventoría emite concepto de **APROBACIÓN**, al verificar que la información presentada cumple con los requisitos contractuales y técnicos establecidos para el seguimiento de la ejecución del contrato.

En consecuencia, el Informe de Gestión de Obra No. 1 queda aprobado para los fines pertinentes, sin perjuicio de las verificaciones y controles que puedan realizarse durante el desarrollo del contrato.

Agradecemos la atención prestada y reiteramos nuestra disposición para continuar con el acompañamiento técnico correspondiente.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por PROYECTOS TRIPLE O S.A.S
Fecha: 2026.07.17 18:21:33 -05'00'

LUZ NEILA DÍAZ MOGOLLÓN
Representante Legal
PROYECTOS TRIPLE O S.A.S.
NIT 901.017.241-1
Interventoría Contrato No. 019 de 2026
Correo: tripleosas@hotmail.com

Carrera 54D # 135 - 34
Int. 2 Apto 403
Tel. 313 408 3199
Sfé de Bogotá

PROYECTOS TRIPLE O S.A.S.
Nit. 901017241-1

INT-CTO-019-2026-004

Yopal, Casanare, 24 de julio de 2026

Señores
ENERGÍA INTEGRAL ANDINA
Atn. Ing. DANIEL LEÓN GARZÓN
Director de Proyecto

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE, CONTRATO 019 DE 2026.

Asunto: Solicitud de bitácoras desde el día 09 de julio 2026 hasta 23 de julio del 2026.

Cordial saludo.

De acuerdo con lo establecido en la cláusula 10 obligaciones específicas del contratista del contrato de obra 019 de 2026, literal 33 que indica:
Llevar un cuaderno, denominado Libro de Bitácora, en el cual se anotarán diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así como tas observaciones o sugerencias que haga la interventoría, además, se dejará constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo. Personal laborando, estado del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, uso de dotación y de elementos de protección del personal. Cada anotación diaria deberá ser fechada y suscrita por los ingenieros residentes del contratista y del interventor.

Solicitamos amablemente las bitácoras desde el día 09 de julio al 23 de julio del 2026, donde se relacione las actividades ejecutadas de tipo técnico, SSGT y ambiental.

Atentamente,

Firmado digitalmente por PROYECTOS TRIPLE O S.A.S
Fecha: 2026.07.24 09:56:23 -05'00'

LUZ NEILA DÍAZ MOGOLLÓN
Representante Legal
Interventoría Contrato No. 019 de 2026

Carrera 54D # 135 - 34
Int. 2 Apto 403
Tel. 313 408 3199
Sfé de Bogotá

PROYECTOS TRIPLE O S.A.S.
Nit. 901017241-1

INT-CTO-019-2026-005

Yopal, Casanare, 24 de julio de 2026

Señores
ENERGÍA INTEGRAL ANDINA
Atn. Ing. DANIEL LEÓN GARZÓN
Director de Proyecto

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE, CONTRATO 019 DE 2026.

Asunto: Solicitud de información del estado de aprobación del plan de manejo de tránsito PMT radicado 2026134028.

Cordial saludo.

Amablemente solicitamos información sobre el estado de aprobación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), radicado bajo el No. 2026134028 el día 10 de julio, teniendo en cuenta que las actividades de intervención en la vía La Pedrera, correspondientes al desmonte y limpieza en zonas no boscosas, se encuentran programadas para iniciar el día 1 de agosto de 2026. Para la ejecución de estas actividades se requiere la ubicación de vehículos sobre la vía para la operación y recolección de los residuos.

En este sentido, agradecemos informar el estado del trámite y, de ser posible, la fecha estimada de su aprobación, toda vez que dicho permiso es indispensable para el desarrollo de las actividades programadas y el cumplimiento del cronograma del proyecto.

Atentamente,

Firmado digitalmente por PROYECTOS TRIPLE O S.A.S
Fecha: 2026.07.24 10:29:05 -05'00'

LUZ NEILA DÍAZ MOGOLLÓN
Representante Legal
Interventoría Contrato No. 019 de 2026

Carrera 54D # 135 - 34
Int. 2 Apto 403
Tel. 313 408 3199
Sfé de Bogotá

PROYECTOS TRIPLE O S.A.S.
Nit. 901017241-1

INT-CTO-019-2026-007

Yopal, Casanare, 27 de julio de 2026

Señores
ENERGÍA INTEGRAL ANDINA
Atn. Ing. DANIEL LEÓN GARZÓN
Director de Proyecto

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE, CONTRATO 019 DE 2026.

Asunto: Solicitud de información instalación de valla de obra.

Cordial saludo.

De acuerdo con lo establecido en la cláusula 10 obligaciones específicas del contratista del contrato de obra 019 de 2026, literal 11 que indica:
Se deberá colocar o instalar una valla para la identificación de la obra, la cual debe seguir los lineamientos del manual de imagen expedido por la Presidencia de la República. La valla será instalada al momento del inicio de las obras del inmueble o sector sobre el cual se ejecutará el proyecto y en lugar visible para la ciudadanía, y su costo deberá incluirlos dentro de la administración. Donde según la programación las actividades de desmonte y limpieza en zonas no boscosas inicia el día 01 de agosto del 2026, siendo el motivo por el cual solicitamos información de la fecha programada para el cumplimiento de esta obligación.

Atentamente,

Firmado digitalmente por PROYECTOS TRIPLE O S.A.S
Fecha: 2026.07.27 11:24:22 -05'00'

LUZ NEILA DÍAZ MOGOLLÓN
Representante Legal
Interventoría Contrato No. 019 de 2026

Carrera 54D # 135 - 34
Int. 2 Apto 403
Tel. 313 408 3199
Sfé de Bogotá

ESTADO DEL TIEMPO

ASOSUPRO
Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso

ESTADO DEL CLIMA

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	202585001 0003

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	019 de 2026
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	Proyectos Triple O S.A.S.

HORAS	DEL 01 AL 31 DE JULIO 2026																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
07:00 AM - 8:00 AM	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
08:00 AM - 9:00 AM	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
10:00 AM - 11:00 AM	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
11:00 AM - 12:00 M	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
12:00 M - 1:00 PM	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1:00 PM - 2:00 PM	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
2:00 PM - 3:00 PM	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
3:00 PM - 4:00 PM	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
4:00 PM - 5:00 PM	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
5:00 PM - 6:00 PM	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
HORAS PERDIDAS POR LLUVIA	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
TOTAL HORAS LLUVIA	0																														

OBSERVACIONES: Durante el periodo reportado no se registraron horas perdidas por lluvia.

FIRMA:

LAURO DANIEL LEÓN GARZÓN
DIRECTOR OBRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INFORME MENSUAL No. 02


CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

REGISTRO FOTOGRAFICO

Actividades preliminares

1.1.1 Replanteo de obra- Actividades de levantamiento topográfico.



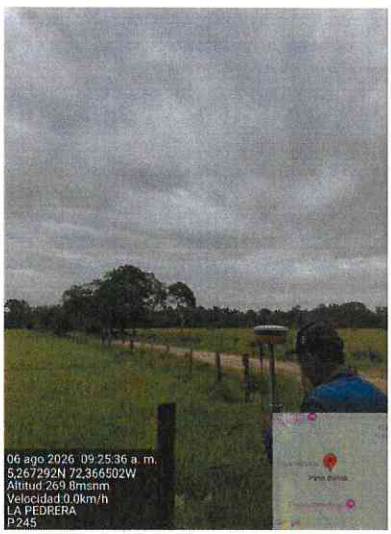



1.1.1 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas del sitio







INFORME MENSUAL No. 02

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003





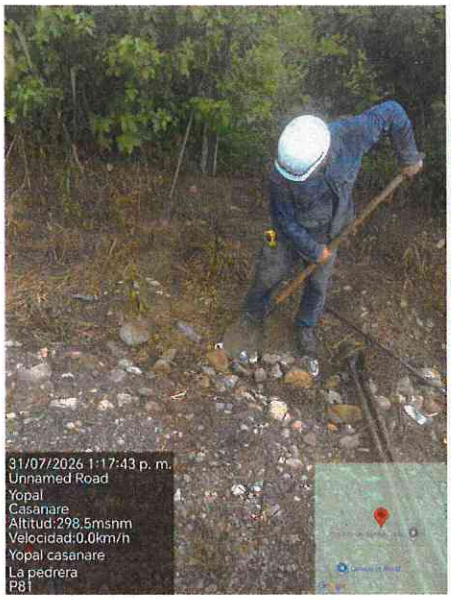

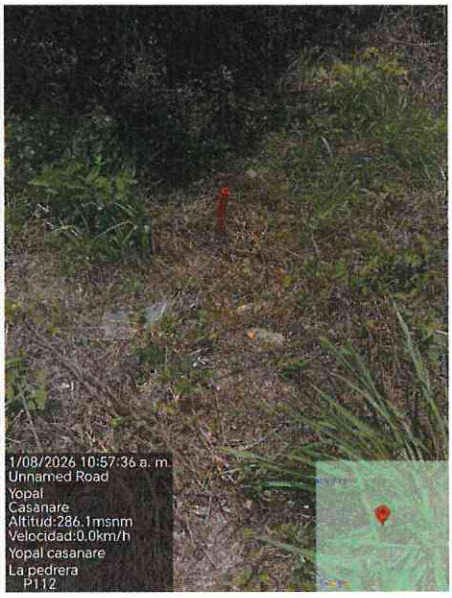

INFORME MENSUAL No. 02

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003


Realizar alumbrado público

1.1.2 Excavación manual en material común del sitio para cimentación de postes de alumbrado público solar







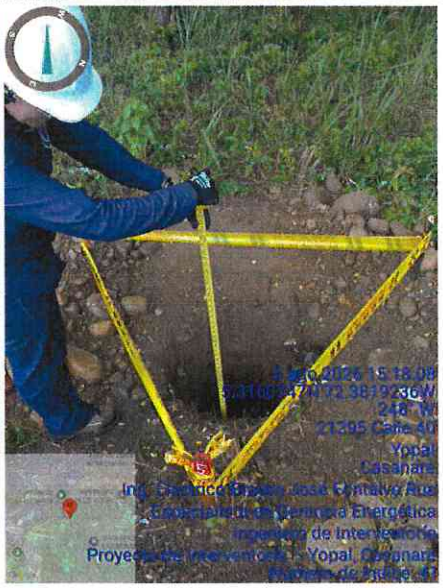



INFORME MENSUAL No. 02

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003





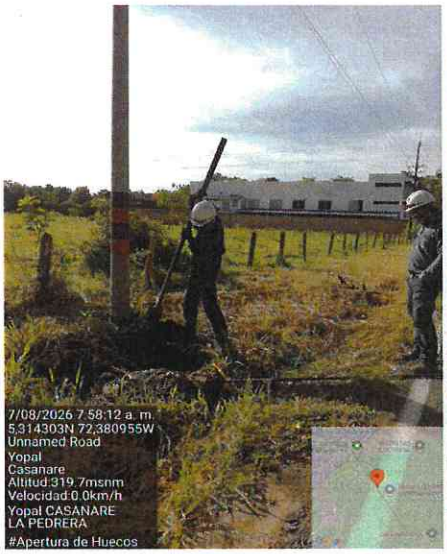

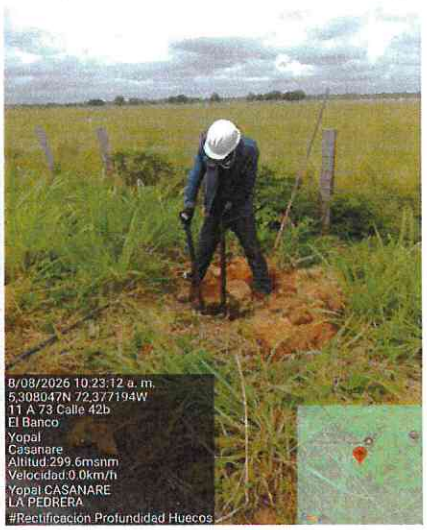

INFORME MENSUAL No. 02

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

Realizar plan de manejo ambiental PMA

1.1.5 PMA










INFORME MENSUAL No. 02

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

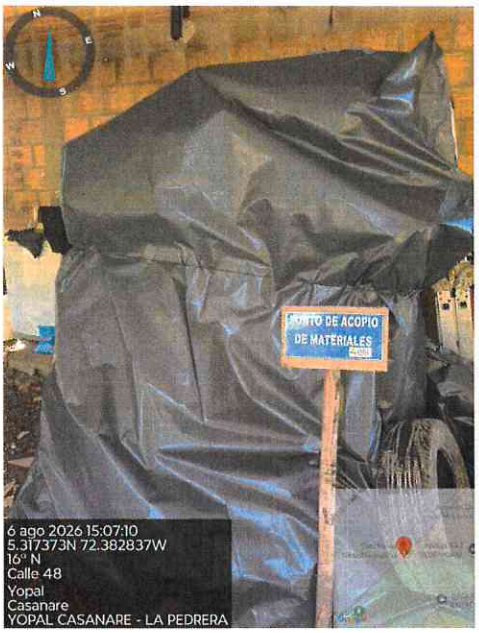



CERTIFICADOS ANTECEDENTES CONTRATISTA

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 21 de agosto de 2026, a las 11:44:57, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	8605332068
Código de Verificación	8605332068260821114457

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 301566091

PIB
11:47:39

Bogotá DC, 21 de agosto del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona ENERGIA INTEGRAL ANDINA S A QUE PODRA ABREVIARSE E I A S A identificado(a) con NIT número 8605332068:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



ENERGÍA INTEGRAL ANDINA.

www.eia.com.co

CERTIFICADOS ANTECEDENTES REPRESENTANTE LEGAL

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 10 de julio de 2026, a las 14:55:07, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	3797710
Código de Verificación	3797710260710145507

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 03:25:01 PM horas del 10/07/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **3797710**

Apellidos y Nombres: **VALERO CAMARGO JOSUE NEFTALI**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 299290005

PIB
14:57:02

Bogotá DC, 10 de julio del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JOSUE NEFTALI VALERO CAMARGO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 3797710:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



ENERGÍA INTEGRAL ANDINA.

www.eia.com.co

ACTA DE VENCINDAD

ACTA DE VECINDAD

ASOSUPRO

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003
OBJETO CONTRATO DE OBRA:	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.		
CONTRATISTA DE OBRA :	Energía Integral Andina S.A.		
CORREO ELECTRONICO:	gerencia@eiasa.com.co; carlos.naranjo@eiasa.com.co		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	019 de 2026		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	Proyectos Triple O S.A.S.		
CORREO ELECTRONICO:	Juamclp0315@hotmail.com; tripleosas@hotmail.com		

FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO





2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?____

Nombre del Propietario

Dirección

Teléfono No. de pisos

Long. del frente (mts)

Matrícula inmobiliaria No.

Cédula catastral SIN INFORMACIÓN

3. SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado			
3. Energía			
4. Teléfonos			
5. Gas	X		
6. Televisión cable			
7. Otros			Cuál?

3. TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin edificar	
3. Valor intermendio		7. Otro	X
4. Valor normal		Cuál?____	FINCA

4. USO ACTUAL

1. Residencial		5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Otro	X
4. Institucional		Cuál? Finca	

5. ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Cuantos

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "7. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:____ GRIETAS Y FISURAS:____

MUROS:____ HUMEDADES:____

CUBIERTA:____ HUNDIMIENTO PISO:____

PISOS: Destapado DESPLAZAMIENTOS:____

FACHADA:____ OTRO: Cuál?____

7. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Se realizó visita de inspección al predio colindante con la vía a La Pedrera, debido a que la cerca o el cerramiento está invadiendo la vía lo que afecta la ubicación de postes para las luminarias. Durante la diligencia no fue posible obtener información sobre el propietario del inmueble, ni establecer las dimensiones de la propiedad, debido a que corresponde a una finca completamente cerrada con postes y cerca perimetral, lo que impidió el acceso y la verificación de sus características físicas.

FIRMAN AL INICIO DE OBRA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día 7/07/2026

Firma	Firma	Firma
Nombre: PROPIETARIO CC.	Nombre: JOAQUIN VARGAS RODRIGUEZ RESIDENTE DE OBRA N° Matrícula Profesional:BY25007973	Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA RESIDENTE DE INTERVENTORIA N° Matrícula Profesional: AT205-136969

ACTA DE VECINDAD

ASOSUPRO


CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.
CONTRATISTA DE OBRA :	Energía Integral Andina S.A.
CORREO ELECTRONICO:	gerencia@elasa.com.co; carlos.naranjo@elasa.com.co
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	019 de 2026
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	Proyectos Triple O S.A.S.
CORREO ELECTRONICO:	Juamclp0315@hotmail.com; tripleosas@hotmail.com

FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



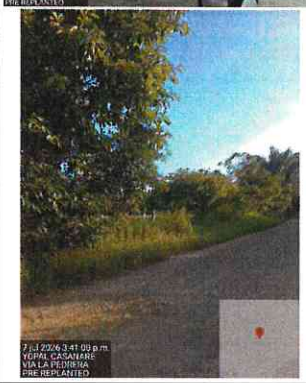

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario _____ Arrendatario _____ Poseedor _____ Otro Cual?_____

Nombre del Propietario _____

Dirección _____

Teléfono _____ No. de pisos _____

Long. del frente (mts) _____

Matrícula inmobiliaria No. _____

Cédula catastral SIN INFORMACIÓN

3. SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado			
3. Energía			
4. Teléfonos			
5. Gas	X		
6. Televisión cable			
7. Otros			Cuál?

3. TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin edificar	
3. Valor Intermendio		7. Otro	X
4. Valor normal		Cuál?_____	FINCA

4. USO ACTUAL

1. Residencial		5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Otro	X
4. Institucional		Cuál? Finca	

5. ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Cuantos ☐

El garaje se usa como

comercio SI ☐ NO ☐

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "7. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:_____ GRIETAS Y FISURAS:_____

MUROS:_____ HUMEDADES:_____

CUBIERTA:_____ HUNDIMIENTO PISO:_____

PISOS: Destapado DESPLAZAMIENTOS:_____

FACHADA:_____ OTRO: Cuál?_____

7. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Se efectuó visita de campo al predio ubicado en inmediaciones de la vía a La Pedrera, debido a que la cerca o el cerramiento está invadiendo la vía lo que afecta la ubicación de postes para las luminarias. Durante la inspección no fue posible identificar al propietario ni recopilar información relacionada con las dimensiones del inmueble, debido a que se trata de una finca delimitada por postes y cerramiento perimetral, lo que restringió el acceso e impidió la verificación directa de sus características.

FIRMAN AL INICIO DE OBRA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día 7/07/2026

Firma	Firma	Firma
Nombre: PROPIETARIO CC.	Nombre: JOAQUIN VARGAS RODRIGUEZ RESIDENTE DE OBRA N° Matrícula Profesional:BY25007973	Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA RESIDENTE DE INTERVENTORIA N° Matrícula Profesional: AT205-136969

ACTA DE VECINDAD


ASOSUPRO

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.
CONTRATISTA DE OBRA :	Energía Integral Andina S.A.
CORREO ELECTRONICO:	gerencia@eiasa.com.co; carlos.naranjo@eiasa.com.co
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	019 de 2026
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	Proyectos Triple O S.A.S.
CORREO ELECTRONICO:	Juamclp0315@hotmail.com; tripleosas@hotmail.com

FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

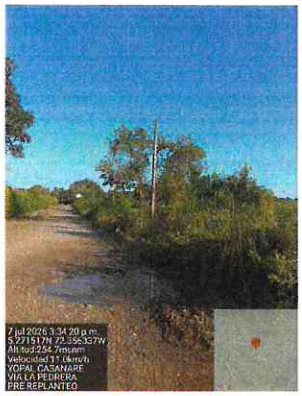

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario _____ Poseedor ____ Otro Cual?_____

Nombre del Propietario _____

Dirección _____

Teléfono _____ No. de pisos _____

Long. del frente (mts) _____

Matrícula inmobiliaria No. _____

Cédula catastral

3. SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☒	☐	
6, Televisión cable	☐	☐	
7, Otros	☐	☐	Cuál?

3. TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor Intermendio	☐	7. Otro	☒
4. Valor normal	☐	Cuál?_____	FINCA

4. USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☒
4. Institucional	☐	Cuál? Finca	

5. ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Cuantos ☐

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "7. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:_____ GRIETAS Y FISURAS:_____

MUROS:_____ HUMEDADES:_____

CUBIERTA:_____ HUNDIMIENTO PISO:_____

PISOS: Destapado DESPLAZAMIENTOS:_____

FACHADA:_____ OTRO: Cuál?_____

7. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información consignada en el numeral "6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Se realizó visita de inspección al predio ubicado sobre la vía a La Pedrera, debido a que la cerca o el cerramiento está invadiendo la vía lo que afecta la ubicación de postes para las luminarias. Durante la visita no fue posible obtener información relacionada con la titularidad del inmueble ni establecer sus dimensiones, debido a que el predio se encuentra totalmente cercado con postes y alambre, lo que impidió el ingreso y la toma de información en campo.

FIRMAN AL INICIO DE OBRA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día 7/07/2026

Firma	Firma	Firma
Nombre: PROPIETARIO CC.	Nombre: JOAQUIN VARGAS RODRIGUEZ RESIDENTE DE OBRA N° Matrícula Profesional:BY25007973	Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA RESIDENTE DE INTERVENTORIA N° Matrícula Profesional: A1205-136969

APROBACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO PMT

PROYECTOS TRIPLE O S.A.S.
Nit. 901017241-1

Yopal, Casanare, 8 de julio de 2026

Señores
ENERGÍA INTEGRAL ANDINA
Atn. Ing. Carlos Naranjo
Carlos.naranjo@eiasa.com.co
Yopal, Casanare

Asunto: Aprobación del Plan de Manejo de Tráfico (PMT).

Respetados señores:

En calidad de Interventoría del Contrato No. 019 de 2026, nos permitimos informar que, una vez revisado el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) presentado por ENERGÍA INTEGRAL ANDINA, se emite concepto de **APROBACIÓN**, al evidenciar que cumple con los requisitos técnicos y las condiciones necesarias para su implementación.

La presente aprobación se otorga con el entendido de que durante la ejecución de las actividades deberán cumplirse estrictamente las medidas de señalización, seguridad vial, control del tránsito y demás disposiciones establecidas en el PMT aprobado, así como la normatividad vigente aplicable.

Cualquier modificación al Plan de Manejo de Tráfico deberá ser previamente informada y sometida a revisión y aprobación por parte de esta Interventoría antes de su implementación.

Sin otro particular, cordialmente,

LUZ NEILA DÍAZ MOGOLLÓN
Representante Legal
PROYECTOS TRIPLE O S.A.S.
NIT 901.017.241-1
Interventoría Contrato No. 019 de 2026
Correo: tripleosas@hotmail.com

Carrera 54D # 135 - 34
Int. 2 Apto 403
Tel. 313 408 3199
Sfé de Bogotá

ENERGÍA INTEGRAL ANDINA.

www.eia.com.co

EIA-003-26
Referencia

ALCALDÍA DE YOPAL
UNIDAD DE CORRESPONDENCIA

10 JUL 2026

RAD. No. 2026134028 *Bogotá, 10 de julio de 2026*

NOMBRE: Natalia HORA: 3:10pm

Señores: SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE YOPAL E. S. D.

Asunto: Revisión de Plan de Manejo de Tránsito (PMT) y ejecución de acto administrativo para el proyecto IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.

Cordial saludo,

A través de esta comunicación, presento para su revisión y posterior aprobación el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) diseñado para la ejecución del proyecto *"Implementación de Sistemas Solares Fotovoltaicos de Iluminación en la vía La Pedrera del Municipio de Yopal, Casanare"*.

Dicho plan ha sido elaborado bajo los lineamientos del Código Nacional de Tránsito y el Manual de Señalización Vial vigente. Su finalidad es mitigar el impacto de la intervención parcial de la vía rural hacia La Pedrera, garantizando así la movilidad y la seguridad de los usuarios del sector.

Atentamente,

David Fernando Pedraza Rojas
Profesional
Energía Integral Andina SA

Powered by CamScanner

Alcaldía Municipal de Yopal

RESOLUCIÓN

900.20.10

RESOLUCIÓN No. [illegible] 04570 DE 17 JUL 2026

"Por la cual se concede permiso para Cierres Parciales con Desvío Controlados en Vías Rurales del Municipio de Yopal para la realización de "IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE"

El Secretario de Movilidad de Yopal en uso de sus facultades legales, constitucionales y conferidas por la Ley 105 de 1993, la ley 769 de 2002 y,

CONSIDERANDO

Que el **Artículo 24 de la Constitución Política** consagra el derecho de todo colombiano a circular libremente por el territorio nacional, sin perjuicio de las limitaciones que establezcan, entre otras, las autoridades respectivas para garantizar y preservar la vida, la integridad personal y la salud de los seres humanos, además de la salvaguarda del interés general. En este sentido, transitar de manera segura, es un derecho que el Estado debe garantizar a sus ciudadanos, siendo inaceptable poner en riesgo la vida de un ser humano.

Que no obstante lo anterior y de conformidad con el **artículo 6 de la Ley 769 de 2002** la Secretaria de Movilidad de Yopal como autoridad de tránsito en su respectiva jurisdicción, le corresponde adoptar las medidas necesarias de carácter transitorio o permanente, que conlleven al mejor ordenamiento del tránsito de personas, animales y vehículos por las vías públicas, a fin de garantizar la seguridad y comodidad de los usuarios de la infraestructura vial.

Que la Ley 769 de 2002, en el título I, capítulo II, artículo 3 Modificado. Art 2º. Ley 1383 de 2010. **Autoridades de tránsito**. Para los efectos de la presente Ley entiéndase que las autoridades de tránsito, en su orden, las siguientes: El Ministerio de Transporte, Los gobernadores y los Alcaldes, **los organismos de tránsito de carácter** Departamental, **Municipal** o Distrital, La Policía Nacional a través de la dirección de tránsito y transporte, los Inspectores de Policía, los inspectores de tránsito, Corregidores o quien haga sus veces en cada ente territorial. La Superintendencia General de Puertos y Transportes. Las fuerzas Militares para cumplir exclusivamente lo dispuesto en el parágrafo 5º de este artículo. Los Agentes de Tránsito y Transporte.

Que el título III, capitulo XIII, artículo 119 de la Ley 769 del 2002, Jurisdicción y Facultades. sólo las autoridades de tránsito, dentro del territorio de su jurisdicción, podrán ordenar el cierre temporal de vías, la demarcación de zonas, la colocación o retiro de señales, o impedir, limitar o restringir el tránsito o estacionamiento de vehículos por determinadas vías o espacios públicos, así mismo en el Artículo 7 de la Ley 769 de 2002, establece que las autoridades de tránsito deben velar por la seguridad de las personas y las cosas en las vías

Powered by CamScanner

públicas o privadas abiertas al público y que sus funciones son de carácter regulatorio y sancionatorio y sus acciones deben estar orientadas a la prevención y a la asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías.

Que, en concordancia con los postulados constitucionales, el artículo 1 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 1383 de 2010. **Ámbito de Aplicación y Principios**. Las nomas del presente Código rigen en todo el Territorio Nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y vehículos por las vías públicas o privadas que están abiertas al público, o en las vías privadas, que internamente circulen vehículos; así como la actuación y procedimientos de las autoridades de tránsito. En desarrollo de lo dispuesto por el artículo 24 de la Constitución Política, todo colombiano tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, pero está sujeto a la intervención y reglamentación de las autoridades para garantizar la seguridad y comodidad de los habitantes, especialmente de los peatones y de los discapacitados físicos y mentales, para la preservación de un ambiente sano y la protección del uso común del espacio público. Le corresponde al Ministerio de Transporte como autoridad suprema de tránsito; definir, orientar, vigilar e inspeccionar la ejecución de la política nacional en materia de tránsito, y entre los principios rectores del Código se establece la seguridad de los usuarios.

Que la Ley 769 de 2002, En el Titulo III **NORMAS DE COMPORTAMIENTO** - Capitulo VIII Trabajos eventuales en la vía Pública, **Artículo 101.** Normas para realizar trabajos en vía pública. Siempre que deban efectuarse trabajos que alteren la circulación en las vías públicas, el interesado en tal labor obtendrá en forma previa la autorización correspondiente de la autoridad competente y señalizará el sitio de labor mediante la colocación de señales preventivas, reglamentarias e informativas que han de iluminarse en horas nocturnas. Toda persona de derecho público o privado interesada en realizar alguna intervención en la vía pública pondrá en conocimiento de la autoridad de tránsito local la licencia que se le conceda para tal propósito, el lugar de la intervención y su duración estimada con una antelación no inferior a ocho (8) días, para que ésta le autorice y tome las medidas oportunas para mitigar el impacto que en la circulación pueda producir la intervención, pudiendo, si así lo amerita la índole de la labor, restringir o suspender el tránsito por la vía, disponiendo su traslado a trayectos alternos, y señalizándola de acuerdo con las restricciones que determine la autoridad competente. Una vez terminada la intervención, es responsabilidad de la persona de derecho público o privado, el retiro de todos los dispositivos de control de tránsito utilizados, so pena de ser multado por la autoridad de tránsito competente. **Artículo 102. Manejo de escombros**. Todo material de trabajo y escombros en la vía pública será manejado por el responsable de la labor, debidamente aislado, tomando las medidas para impedir que se disemine por cualquier forma, o que limite la circulación de vehículos o peatones, de acuerdo con las normas ambientales vigentes y será debidamente señalizado.

Que la Secretaría de Movilidad del Municipio de Yopal tiene como misión asegurar la organización y funcionamiento de tránsito y transporte con la finalidad de facilitar el derecho fundamental de la movilidad y de las demás personas que circulen por el Municipio, así como dirigir, coordinar y controlar mecanismos y procedimientos que permitan el cumplimiento y aplicación del Código Nacional de Tránsito en la Ciudad. Que la finalidad de esta regulación, es buscar un equilibrio que garantice unas óptimas condiciones de movilidad para los diferentes actores viales, de la misma forma disminuir la inseguridad peatonal y vehicular, ejerciendo un mayor control del tráfico en zona urbana mientras se realizan las actividades relacionadas con las obras a ejecutar


Powered by CamScanner

Que, para los cierres parciales con Desvío Controlados en vías Rurales del Municipio de Yopal, se acatará estrictamente los lineamientos indicados en el "**MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL - DISPOSITIVOS UNIFORMES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD VIAL 2024**. adoptado por el Ministerio de Transporte mediante la Resolución No. 20243040045005 del 17 de Septiembre de 2024, Capítulo 7. Señalización y medidas de seguridad para obras en la vía. Subnumeral 7.12. Plan de Manejo de Transito (PMT).

Que de conformidad con lo anteriormente expuesto, se hace necesario clasificar y definir la categoría del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), teniendo en cuenta que la ejecución de las obras se realizará en vías urbanas del Municipio de Yopal.

Que la empresa **ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A,** identificada con número de Nit No. 860.533.206-8, presentó un Plan de Manejo de Tránsito (PMT), en el cual se clasifica y define la categoría bajo la cual será diseñado e implementado dicho plan, teniendo en cuenta que las actividades de mantenimiento forestal, consistentes en el corte de vegetación y/o tala de árboles, se desarrollarán sobre vías urbanas del municipio de Yopal.

Figura 7-29. Clasificación PMT




Fuente: Manual de Señalización 2024

Por las características y condiciones de las obras a realizar, el proyecto corresponde a la Categoría I: Bajo Impacto, considerando que:

"(...) **Categoría I. Obras de bajo impacto, donde se tiene en cuenta;** Intervenciones o interferencias en la vía o ciclo-infraestructura causadas por actividades, obras civiles, eventos y/o ubicación de materiales o elementos varios en la vía pública o privada abierta al público, en donde los espacios de circulación tanto peatonales como ciclistas y/o vehiculares tienen una mínima afectación. Además, implementación de señalización horizontal (demarcación), reparación de pavimentos y repavimentación (que impliquen cierres Parciales de vías en periodos menores a tres horas aproximadamente por punto y/o en horario nocturno), trabajos a media calzada, corte de vegetación, mantenimiento rutinario, reparación de bermas, implementación de intersecciones semaforizadas y otros.

Figura 7-30. Categorías PMT



Fuente: Manual de Señalización 2024

Powered by CamScanner

Así mismo, el manual de Señalización indica que los lineamientos del proceso de fases y actividades sucesivas que se deben abordar para la formulación, aprobación, implementación, seguimiento y supervisión de un Plan de Manejo de Tránsito son los siguientes:

Figura 7-31. Metodología para la presentación de PMT



Fuente: Manual de Señalización 2024

Que la ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia señala en Título XIV del URBANISMO, CAPITULO I: COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA. Corregido por el art. 10 del Decreto Nacional 555 de 2017: "Los siguientes comportamientos, relacionados con bienes inmuebles de particulares, bienes fiscales, bienes de uso público y el espacio público, son contrarios a la convivencia pues afectan la integridad urbanística y por lo tanto no deben realizarse, según la modalidad señalada":

"D) Incumplir cualquiera de las siguientes obligaciones:

13. Destinar un lugar al interior de la construcción para guardar materiales, maquinaria, escombros o residuos y no ocupar con ellos, ni siquiera de manera temporal, el andén, las vías o espacios públicos circundantes.
14. Proveer de unidades sanitarias provisionales para el personal que labora y visita la obra y adoptar las medidas requeridas para mantenerlas aseadas, salvo que exista una solución viable, cómoda e higiénica en el área.
15. Instalar protecciones o elementos especiales en los frentes y costados de la obra y señalización, semáforos o luces nocturnas para la seguridad de quienes se movilizan por el lugar y evitar accidentes o incomodidades.
16. Limpiar las llantas de los vehículos que salen de la obra para evitar que se arroje barro o cemento en el espacio público.
17. Limpiar el material, cemento y los residuos de la obra, de manera inmediata, cuando caigan en el espacio público.
18. Retirar los andamios, barreras, escombros y residuos de cualquier clase una vez terminada la obra, cuando esta se suspenda por más de dos (2) meses, o cuando sea necesario por seguridad de la misma.

Powered by CamScanner

20. Tomar las medidas necesarias para evitar la emisión de partículas en suspensión, provenientes de materiales de construcción, demolición o desecho, de conformidad con las leyes vigentes.
21. Aislar completamente las obras de construcción que se desarrollen aledañas a canales o fuentes de agua, para evitar la contaminación del agua con materiales e implementar las acciones de prevención y mitigación que disponga la autoridad ambiental respectiva.
22. Reparar los daños o averías que en razón de la obra se realicen en el andén, las vías, espacios y redes de servicios públicos.
23. Reparar los daños, averías o perjuicios causados a bienes colindantes o cercanos.
24. Demoler, construir o reparar obras en el horario comprendido entre las 6 de la tarde y las 8 de la mañana, como también los días festivos, en zonas residenciales".

El Contratista deberá informar y comunicar a todos los actores viales las condiciones de las obras a realizar, que comprende: **Antes de inicio de Obra**; informar sobre el tipo de obra a ejecutar, fecha de inicio, duración, desvíos y precauciones a tomar. **Durante las Obras**, comunicar los desvíos, precauciones y mensajes informativos de obra, la divulgación puede realizarse por medios físicos o electrónicos y comprende; una socialización en el área de influencia directa y divulgación a la comunidad en general mediante vallas informativas, pasacalles, avisos en medios de comunicación masivos, avisos en redes sociales, correos electrónicos masivos, volantes de información de inicio y finalización de obra, etc. Lo anterior esta referenciado en el manual de Señalización de 2024.

Que, mediante **contrato de Obra Pública No. 019 de 2026**, celebrado entre: La empresa contratante; **EMPRESA ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO - ASOSUPRO,** identificada con número de Nit No. 901.445.387-3 y la Empresa Contratista; **ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A,** identificada con número de Nit No. 860.533.206-8, se acordó desarrollar y ejecutar las actividades del Proyecto que tiene por objeto: **"IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE"**, cuyo correcto cumplimiento requiere la vigilancia y control constante de la ejecución. Que, para garantizar el adecuado seguimiento y cumplimiento de las obligaciones contractuales, se estableció la figura de interventoría, la cual será ejercida por la empresa; **PROYECTOS TRIPLE O S.A.S**, identificada con número de Nit No. 901017241-1, con **contrato de interventoría No. 019 de 2026**, quien tendrá la función de supervisar, controlar y verificar el desarrollo del contrato conforme a los términos pactados. Que el interventor deberá supervisar el avance y cumplimiento de las actividades objeto del contrato, facilitando a la entidad contratante la toma de decisiones oportunas y garantizando la calidad y eficiencia en la ejecución contractual.

Que le corresponde a la empresa **ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A,** identificada con número de Nit No. 860.533.206-8, la realización de todos los **trámites necesarios para la obtención de los permisos, licencias, autorizaciones, etc., necesarios para la ejecución de las obras materia de la presente resolución**, que se deban otorgar por las autoridades competentes, toda vez que la competencia de la Secretaría de Movilidad para otorgar el permiso de ocupación comprende única y exclusivamente a los tramos de vías descritas y a las obras descritas.


Que, mediante oficio allegado a la Secretaría de Movilidad el día 10 de Julio de 2026 mediante radicado 2026134028, el Señor **JOSUE NEFTALI VALERO CAMARGO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 3.797.710 expedida en Cartagena (Bolivar), en calidad de

Powered by CamScanner

representante legal Suplente de la empresa **ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A,** identificada con número de Nit No. 860.533.206-8, con **contrato de Obras Públicas No. 019 de 2026,** quien solicita autorización para realizar Cierres Parciales con Desvíos Controlados en Vías Rurales del Municipio de Yopal, cuyo objeto es: **"IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE"**, dicha actividades se ejecutaran entre el **15 de Julio de 2026 hasta el 08 de Marzo de 2027**, dicho Cierres Parciales con Desvío Controlados se harán en las siguientes direcciones:

ACTIVIDAD	FECHAS	HORARIOS
"IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE"	15 de Julio de 2026 hasta 08 de Marzo de 2027	**Horas Diurnas** Lunes a Viernes 07:00 Am a 17:00 Pm Sábado: 07:00 Am a 17:00 Pm
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO DONDE SE RELIZARAN CIERRES PARCIALES CON DESVÍO CONTROLADOS EN VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE YOPAL		

Ilustración: Area y Zona de Influencia del Proyecto

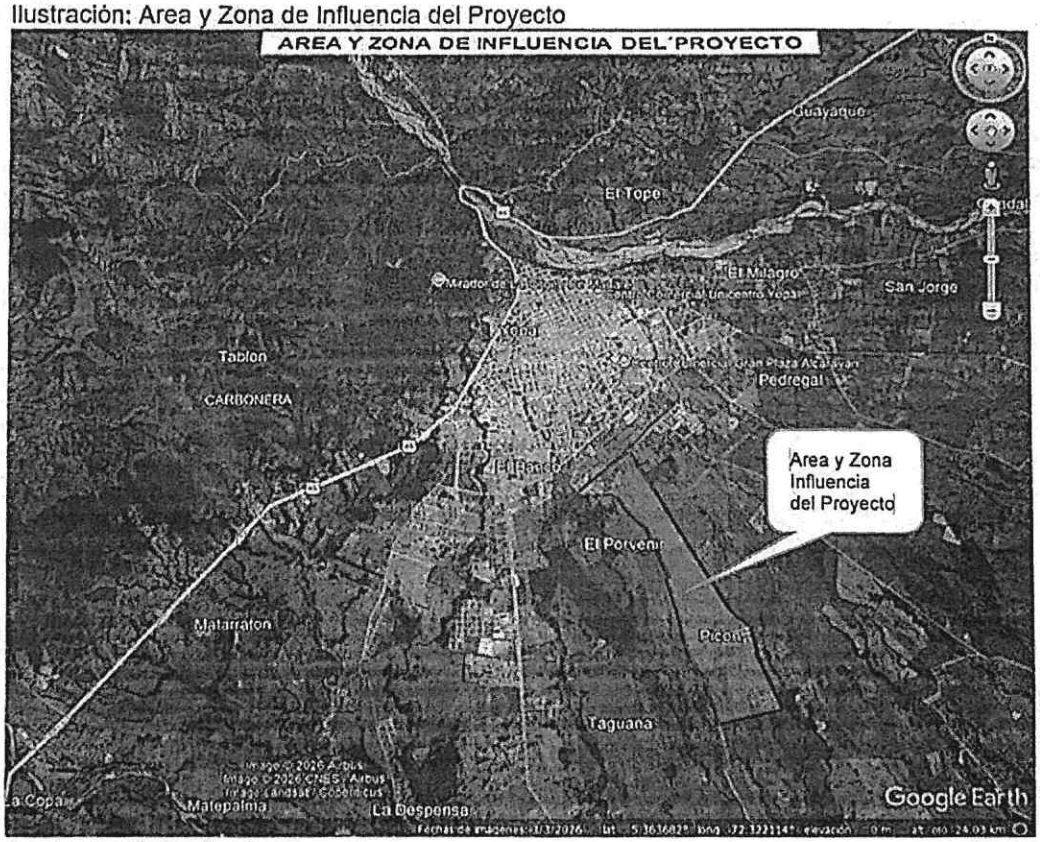

Fuente: Google Earth – Propia

Powered by CamScanner


CRONOGRAMA DE ACTVIDADES DEL PROYECTO

"IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE"

ITEM	ACTIVIDAD	INICIO	FIN	DURACIÓN (días)	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo
1	PRELIMINARES													
1.01	Replanteo de obra	5/6/2026	26/7/2026	48										
1.02	Diseñamos y fabricamos en taller los balcones de vías (incluye taller y supervisión final)	5/6/2026	30/6/2026	25										
2	RECUBRIMIENTO PÉTREO													
2.01	Suministro, transporte en material pétreo (tipo recebo) para conformación de pavimento de plataforma pública (incluye retiro y disposición final)	1/9/2026	30/09/2026	30										
2.02	Suministro e instalación de postes en fibra de vidrio para alumbrado público (12 mts 1.2kgf)	5/6/2026	30/6/2027	390										
2.03	Cimentación para postes de luminarias (0.70 x 1.20m)	15/6/2026	15/10/2026	91										
2.04	Suministro e instalación de luminarias solar (LED de 200 W, 6.4 metros Luminosidad LED, Panel solar fotovoltaico en 3 bloques, empotrar para luminarias, brazo metálico galvanizado y soporte para luminarias)	5/6/2026	30/5/2027	340										
3	ACTA DE VISITA	5/6/2026	6/6/2026	1										
4	ACTA DE INICIO	5/06/2026	5/6/2026	1										
5	Pólizas	5/6/2026	6/6/2026	1										
6	APOYO A LA SUPERVISIÓN	5/6/2026	5/6/2026	1										

IDENTIFICACION DE VÍAS DEL PROYECTO


Ilustración: Vías del proyecto – Yopal – Pedrera - Picon

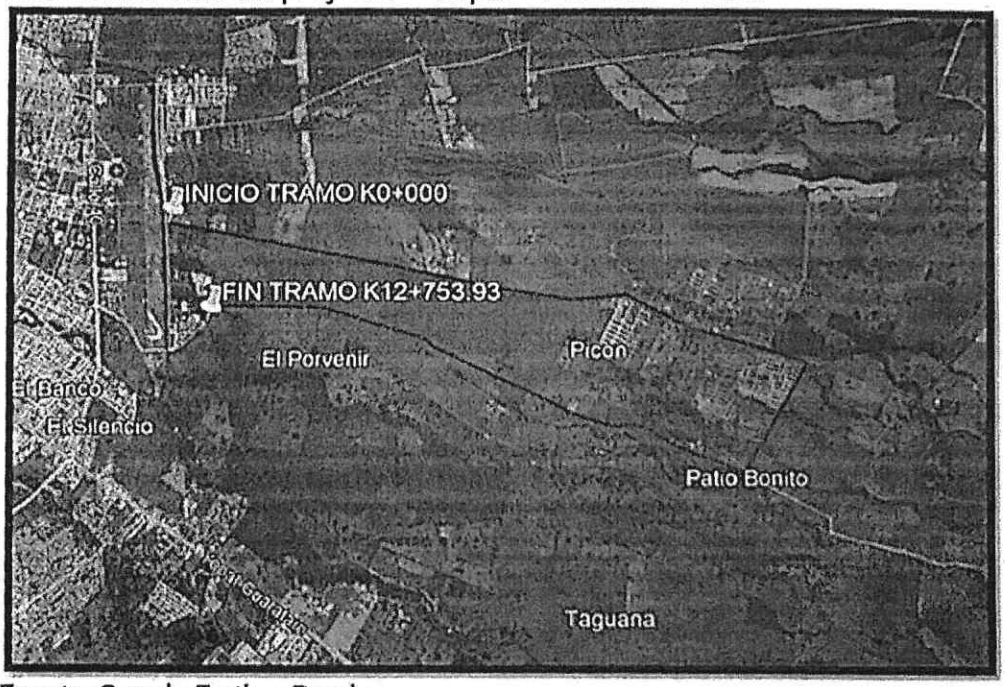

Fuente: Google Earth – Propia

Powered by CamScanner

ESQUEMAS DE SEÑALIZACIÓN TIPICOS PARA CADA AREA O ZONA DE INFLUENCIA A INTERVENIR

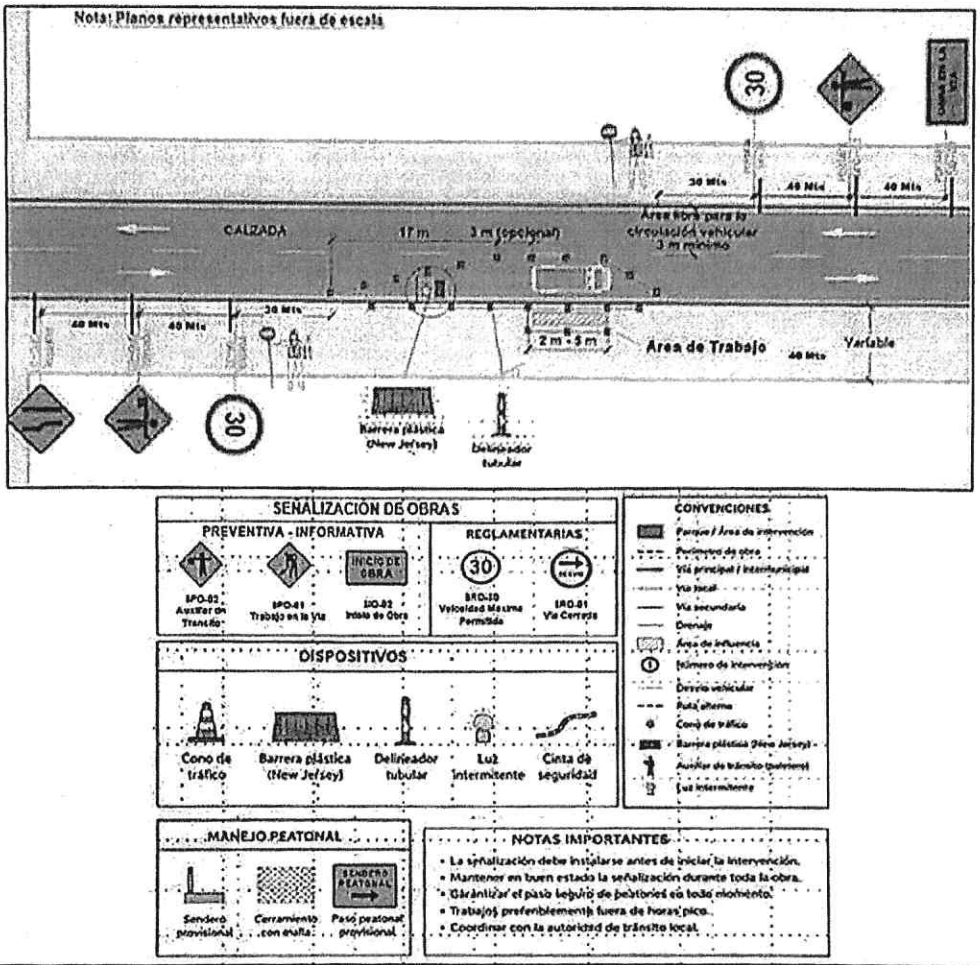

Nota 1: Una vez se finalicen las actividades de obra a las horas señaladas, las vías quedaran habilitadas para su circulación normal.

Nota 2: Si dentro de las actividades se localizan centros educativos se debe identificar y acatar los horarios a los que estén relacionados dentro del centro educativo.

Nota 3: Es muy importante que el contratista notifique oportunamente a la comunidad e instituciones educativas de las obras o actividades que se van a realizar en las direcciones mencionadas en la resolución, su información puede comprender: medios de comunicación, avisos, folletos, vallas informativas, volantes, etc. Además, se debe notificar y evidenciar a la secretaría de Movilidad de Yopal la información de estas mismas.

Nota 4: El suministro de materiales para las diferentes obras y el transporte de escombros, se deberá programar durante horas no pico del día, con el fin de mitigar el impacto generado por la obra. Igualmente deberá especificarse las condiciones para la movilización de la maquinaria amarilla de construcción, acorde con las normas del Código Nacional de Tránsito. Además, que los desplazamientos de los vehículos de carga lo realicen sobre las vías que el mismo PMT hace referencia.

Nota 5: Atender cualquier sugerencia de carácter técnico que la secretaría de Movilidad de Yopal considere pertinente para el desarrollo de los trabajos, con el fin de garantizar la movilidad y seguridad de los usuarios.

Powered by CamScanner

Nota 6: El responsable de la obra deberá disponer, como mínimo, de un Kit de señalización vertical fija en las vías donde se realizará los ingresos y salidas de los vehículos.

Nota 7: Se debe investigar detalladamente la presencia de redes, tales como energía, acueducto, gas, teléfonos, alcantarillado y otros; en las zonas a intervenir y aledaña a las mismas, siendo responsable de los eventuales daños ocasionados durante la ejecución de los trabajos.

Que, para garantizar la seguridad de los usuarios de estas vías, mientras se realiza las actividades, la empresa **ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A,** identificada con número de Nit No. 860.533.206-8, actuando como representante Legal Suplente, Señor **JOSUE NEFTALI VALERO CAMARGO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 3.797.710 expedida en Cartagena (Bolivar), presenta un Plan de Manejo de Tránsito, avalado por el Ingeniero Civil, **LEONARDO ANDRES PACHECO ROJAS**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.118.533.833 expedida en Yopal (Casanare) y M.P No. 15202-233328 BYC.

Que, con el fin de amparar posibles daños y/o perjuicios ocasionados a terceros con ocasión del desarrollo de la actividad, la empresa **ENERGÍA INTEGRAL ANDINA S.A.**, identificada con NIT No. 860.533.206-8, actuando como representante Legal Suplente, señor **JOSUÉ NEFTALÍ VALERO CAMARGO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.797.710 expedida en Cartagena (Bolívar), presenta la **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** No. 802091981, expedida por la compañía Seguros CONFIANZA, con vigencia desde 23 de Abril de 2026 hasta 08 de Marzo de 2027.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: OBJETO: AUTORIZAR a la empresa **ENERGÍA INTEGRAL ANDINA S.A.**, identificada con NIT No. 860.533.206-8, actuando como representante Legal Suplente, señor **JOSUÉ NEFTALÍ VALERO CAMARGO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.797.710 expedida en Cartagena (Bolivar), en calidad de contratista, para establecer medidas de restricción del tránsito con el Cierres Parciales con desvío Controlado de Vías Urbanas del Municipio de Yopal, enunciadas en la parte considerativa de la presente resolución en las fechas y horarios establecidos, para que realicen la actividad: **"IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE"**, dentro de las direcciones mencionadas anteriormente, tendientes a garantizar la seguridad, integridad personal y vida de todos los usuarios.

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez otorgado el permiso provisional por parte de la secretaría de Movilidad de Yopal, ejercerá mediante visitas técnicas a través de un funcionario, la supervisión, vigilancia y control de las obras a fin de determinar si están cumpliendo con los términos del presente acto administrativo. Se dejará constancia de la visita técnica mediante un **ACTA DE VISITA** suscrita entre un representante de la empresa **ENERGÍA INTEGRAL ANDINA S.A.**, identificada con NIT No. 860.533.206-8, y los funcionarios supervisores de la Secretaría de Movilidad de Yopal.

PARAGRAFO SEGUNDO: La Secretaría de Movilidad será el responsable de la revisión, autorización, seguimiento y retroalimentación de los PMT de las obras que se ejecuten en las

Powered by CamScanner

vías donde se debe hacer los respectivos controles para que el Plan diseñado sea el mismo implementado en el terreno y a lo largo de todo el proceso de la ejecución de las Obras.

PARÁGRAFO TERCERO: Si la obra no se inicia en el plazo otorgado mediante esta resolución, se entenderá que el beneficiario de este permiso provisional desiste de su solicitud y en consecuencia se deroga este acto administrativo.

PARARAFO CUARTO: El otorgamiento del presente permiso no vincula a la entidad otorgante de responsabilidad civil, penal, laboral, extracontractual y de incumplimiento derivada de la realización y desarrollo de las obras.

PARAGRAFO QUINTO: La empresa contratista, deberá informar a la Secretaría de Movilidad de Yopal, sobre la suspensión y/o terminación de las obras que están contempladas en el Artículo 1 de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: PLAZO: Que la empresa **ENERGÍA INTEGRAL ANDINA S.A.**, identificada con NIT No. 860.533.206-8, actuando como representante Legal Suplente, señor **JOSUÉ NEFTALÍ VALERO CAMARGO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.797.710 expedida en Cartagena (Bolívar), en calidad de contratista, tendrá un plazo de ejecución de las actividades del Proyecto de acuerdo al Acta de Inicio del Contrato de Obras No. 019 de 2026. Además, de lo establecido dentro de la vigencia de la póliza de responsabilidad civil extracontractual presentada por el Contratista, contados a partir de la fecha de expedición del acto administrativo, período durante el cual deberán ejecutarse las obras conforme a los documentos técnicos anexos a la solicitud (cronograma de actividades de obra), los cuales fueron revisados y declarados viables por parte de la Secretaría de Movilidad de Yopal.

ARTÍCULO TERCERO: Que la empresa **ENERGÍA INTEGRAL ANDINA S.A.**, identificada con NIT No. 860.533.206-8, actuando como representante Legal Suplente, señor **JOSUÉ NEFTALÍ VALERO CAMARGO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.797.710 expedida en Cartagena (Bolívar), en calidad de contratista, deberá efectuar las obras cumpliendo de manera obligatoria las recomendaciones y requerimientos de la Secretaría de Movilidad de Yopal, expresados en las consideraciones y la parte resolutiva de la presente resolución, sin afectar ninguna de las obras o servicios públicos existentes.

ARTICULO CUARTO: OBLIGACIONES: El permiso que se otorga mediante acto administrativo es de carácter provisional y por tanto la empresa **ENERGÍA INTEGRAL ANDINA S.A.**, identificada con NIT No. 860.533.206-8, actuando como representante Legal Suplente, señor **JOSUÉ NEFTALÍ VALERO CAMARGO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.797.710 expedida en Cartagena (Bolívar), en calidad de contratista, una vez termine los trabajos objeto de este permiso, en el marco de sus competencias es responsable de la actividad y quien dejará las vías en el estado en que las encontró o en mejores condiciones, so pena de sanciones. Además, deberá realizar la conformación de la estructura de la vía que resulte afectada por las obras objeto del permiso provisional, cumpliendo con las exigencias técnicas contenidas en las especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, las normas de ensayos de materiales para carreteras, y manual de Drenajes para carreteras, del instituto Nacional de Vías – INVIAS, y demás normas y actos que la modifiquen.

PARAGRAFO PRIMERO: Los trabajos que impliquen el cargue y retiro de material producto de las excavaciones, cortes o demoliciones deben llevarse a los sitios de disposición final, estos no pueden interferir con el tráfico peatonal y/o vehicular.

Powered by CamScanner

PARAGRAFO SEGUNDO: El contratista será responsable de retirar diariamente de la vía y de la zona de influencia de la misma los residuos y materiales resultantes de la ejecución de las actividades de obra, con el fin de mantener el área intervenida en condiciones adecuadas de orden, limpieza y libre de obstrucciones para la circulación.

PARAGRAFO TERCERO: Será sancionado por el Organismo de Tránsito que corresponda con multa equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes, quien transportando agregados minerales como: Asfalto, Arena, triturado o concretos, no aislé perfectamente la carga y permita que ella se esparza por las vías públicas, poniendo en riesgo la seguridad de otros vehículos, de acuerdo a lo establecido por la Ley.

PARAGRAFO CUARTO: Si las obras no llegasen a terminarse dentro del plazo estipulado, la empresa contratista podrá solicitar a la Secretaría de Movilidad de Yopal, una ampliación del plazo, justificando técnicamente las causales que impidieron dar cumplimiento; con una anticipación mínima de quince (15) días hábiles a la terminación estipulada del permiso provisional, con el fin de surtir los trámites administrativos pertinentes, en caso contrario no se tendrá en cuenta la solicitud. Lo anterior está sujeto a ley 1801 de 2016 "Por la Cual se Expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. **Artículo 140. Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio Público. Numeral 2.** *"Realizar Obras de Construcción o remodelación en las vías vehiculares o peatonales, en parques, espacios públicos, corredores de transporte público, o similares, sin la debida autorización de la autoridad competente."*

PARAGRAFO QUINTO: El contratista es el responsable por los daños físicos y estructurales que se puedan causar a las vías alternas utilizadas como desvíos provisionales durante la ejecución de los trabajos, siendo su obligación rehabilitarlas cuando sea necesario.

PARAGRAFO SEXTO: Una vez terminada la intervención, el contratista y la interventoría deberán informar a la autoridad competente que revisa, autoriza y realiza el seguimiento al PMT sobre la finalización de las Obras, para que pueda verificar que el contratista ha restaurado las condiciones iniciales de movilidad en la zona y su área de influencia, lo que implica la verificación del retiro de la señalización de obra y la implementación de los dispositivos de señalización vial.

ARTICULO QUINTO: GARANTÍAS: Que la empresa **ENERGÍA INTEGRAL ANDINA S.A.**, identificada con NIT No. 860.533.206-8, actuando como representante Legal Suplente, señor **JOSUÉ NEFTALÍ VALERO CAMARGO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.797.710 expedida en Cartagena (Bolívar), en calidad de contratista, deberá responder por los accidentes y/o daños ocurridos durante el desarrollo de la actividad a realizar **"IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE"**, comprendida desde el **15 de Julio de 2026 hasta el 08 de Marzo de 2026**, teniendo en cuenta la presenta póliza de **Póliza de Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** No. 802091981, expedida por la compañía Seguros CONFIANZA, con vigencia desde 23 de Abril de 2026 hasta 08 de Marzo de 2027.

PARAGRAFO PRIMERO: Es obligación de la empresa **ENERGÍA INTEGRAL ANDINA S.A.**, identificada con NIT No. 860.533.206-8, actuando como representante Legal Suplente, señor **JOSUÉ NEFTALÍ VALERO CAMARGO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.797.710 expedida en Cartagena (Bolívar), mantener vigentes durante los plazos establecidos en la

Powered by CamScanner

resolución, las pólizas antes citadas. Así mismo, es caso de prorroga o suspensión de los trabajos, el peticionario deberá ampliar las pólizas correspondientes.

PARAGRAFO SEGUNDO: Que la empresa **ENERGÍA INTEGRAL ANDINA S.A.**, identificada con NIT No. 860.533.206-8, actuando como representante Legal Suplente, señor **JOSUÉ NEFTALÍ VALERO CAMARGO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.797.710 expedida en Cartagena (Bolívar), o quien haga sus veces, como empresa solicitante del permiso y ejecutora de las obras, mantendrá indemne a la Secretaría de Movilidad de Yopal, de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones u omisiones o de las de sus contratistas, subcontratistas o dependientes. Así mismo la citada empresa se compromete a responder de cualquier daño que durante y después de ejecutadas las obras se llegaren a presentar con ocasión de la permanencia de las obras en la vía objeto de este permiso, aun después de terminada la vigencia de los amparos contenidos en la póliza de garantía.

ARTICULO SEXTO: Que la empresa **ENERGÍA INTEGRAL ANDINA S.A.**, identificada con NIT No. 860.533.206-8, actuando como representante Legal Suplente, señor **JOSUÉ NEFTALÍ VALERO CAMARGO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.797.710 expedida en Cartagena (Bolívar), en calidad de contratista, deberá disponer e instalar los dispositivos reguladores de tránsito, elementos que se deben ubicar o localizar antes de iniciar actividades, estos deberán permanecer durante la ejecución de la misma y ser retirados una vez cesen las condiciones que dieron origen a su instalación como está establecido en el **MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL - DISPOSITIVOS UNIFORMES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD VIAL 2024** adoptado por el Ministerio de Transporte mediante la Resolución No. 20243040045005 del 17 de Septiembre de 2024, tales como señalización de obras como; preventivas, informativas, reglamentarias, vallas, bandas y auxiliares de tráfico, dispositivos de canalización u otros dispositivos para la regulación de tránsito para dar cumplimiento al plan de manejo de tránsito (PMT) presentado durante los cierres totales y parciales de vías Urbanas y Rurales del Municipio de Yopal.

PARAGRAFO PRIMERO: Que la empresa **ENERGÍA INTEGRAL ANDINA S.A.**, identificada con NIT No. 860.533.206-8, actuando como representante Legal Suplente, señor **JOSUÉ NEFTALÍ VALERO CAMARGO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.797.710 expedida en Cartagena (Bolívar), en calidad de contratista, deberá disponer de personal suficiente y necesario (controladores auxiliares de tránsito con experiencia y Certificados), ya que estos son los responsables de la seguridad de los diferentes usuarios de las vías, se deben tener una cantidad que pueda solventar la necesidad de las intersecciones o cruces de vías que están contempladas y relacionadas dentro del Plan de manejo de Transito (PMT) como cierres parciales y totales con desvió de vías Urbanas del Municipio de Yopal, durante la realización de las diferentes actividades contempladas dentro de la parte resolutiva.

PARAGRAFO SEGUNDO: El contratista deberá adelantar todas las acciones necesarias tendientes a la seguridad del paso de los peatones en la zona a intervenir y su zona de influencia.

PARAGRAFO TERCERO: El contratista deberá garantizar la circulación de los diferentes actores viales, eliminar las eventuales interrupciones del servicio, disponer y ubicar los elementos de señalización requeridos para garantizar la seguridad de los conductores, peatones y trabajadores de la obra, específicamente en la zona a intervenir y su zona de

Powered by CamScanner

influencia. Todo control y/o desvío vehicular debe formar parte del Plan de Manejo de Tráfico (PMT) y ser aprobado por la autoridad de tránsito competente.

ARTICULO SEPTIMO: El permiso que mediante la presente resolución se concede, no podrá ser destinado para un fin distinto al estipulado en el artículo primero del presente acto administrativo y, la secretaría de Movilidad de Yopal podrá revocar cuando la Empresa **ENERGÍA INTEGRAL ANDINA S.A.**, identificada con NIT No. 860.533.206-8, actuando como representante Legal Suplente, señor **JOSUÉ NEFTALÍ VALERO CAMARGO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.797.710 expedida en Cartagena (Bolívar), en calidad de contratista, o quien haga sus veces, incumpla cualquiera de las obligaciones en ella establecidas.

ARTICULO OCTAVO: Que la empresa **ENERGÍA INTEGRAL ANDINA S.A.**, identificada con NIT No. 860.533.206-8, actuando como representante Legal Suplente, señor **JOSUÉ NEFTALÍ VALERO CAMARGO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.797.710 expedida en Cartagena (Bolívar), en calidad de contratista, será el encargado de remitir sendas copias del presente acto administrativo al Subcomandante de Agentes de Tránsito de la Secretaria de Movilidad de Yopal para que realice el seguimiento al cierre, al comando del Departamento de Policía Nacional de Casanare, a la Secretaria de Gobierno Municipal y al despacho de la Alcaldía de Yopal para su conocimiento, al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias – CRUE, Bomberos Yopal, Defensa Civil Colombiana y demás empresas prestadoras de servicio de ambulancias, así mismo a las diferentes empresas que prestan el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo Municipal de Pasajeros.

ARTICULO NOVENO: Que la empresa **ENERGÍA INTEGRAL ANDINA S.A.**, identificada con NIT No. 860.533.206-8, actuando como representante Legal Suplente, señor **JOSUÉ NEFTALÍ VALERO CAMARGO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.797.710 expedida en Cartagena (Bolívar), en calidad de contratista, es responsable si dentro de las actividades a realizan se efectúan trabajos nocturnos o se dejan cierres totales o parciales de vías, es necesario que el contratista utilice la señalización necesaria y suficiente para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía, de forma visible, legible y de acuerdo a las condiciones establecidas dentro del nuevo **"MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL - DISPOSITIVOS UNIFORMES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD VIAL,** Capítulo 7. Señalización y medidas de seguridad para obras en la vía. Subnumeral 7.12. Plan de Manejo de Transito (PMT), adoptado por el Ministerio de Transporte mediante la Resolución No. 20243040045005 del 17 de Septiembre de 2024.

ARTICULO DECIMO: Que la empresa **ENERGÍA INTEGRAL ANDINA S.A.**, identificada con NIT No. 860.533.206-8, actuando como representante Legal Suplente, señor **JOSUÉ NEFTALÍ VALERO CAMARGO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.797.710 expedida en Cartagena (Bolívar), en calidad de contratista, deberá contener en el lugar de la actividad el acto administrativo, documento expedido por la Secretaría de Movilidad de Yopal en caso de ser requerido por las demás autoridades competentes.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: SANCIONES: En caso de incumplimiento por parte la empresa **ENERGÍA INTEGRAL ANDINA S.A.**, identificada con NIT No. 860.533.206-8, actuando como representante Legal Suplente, señor **JOSUÉ NEFTALÍ VALERO CAMARGO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.797.710 expedida en Cartagena (Bolívar), se dará trámite y aplicara lo estipulado al Código Nacional de Policía y Convivencia, Título XIV del

Powered by CamScanner

URBANISMO, CAPITULO I: COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA, específicamente el Articulo 135. Comportamientos contrarios a la integridad urbanística, concretamente la modalidad señalada, Ítem D, numerales del 13 al 24. CAPITULO II, DEL CUIDADO E INTEGRIDAD DEL ESPACIO PUBLCIO. Artículo 140. Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio Público.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Que la empresa **ENERGÍA INTEGRAL ANDINA S.A.**, identificada con NIT No. 860.533.206-8, actuando como representante Legal Suplente, señor **JOSUÉ NEFTALÍ VALERO CAMARGO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.797.710 expedida en Cartagena (Bolívar), en calidad de contratista, deberá **INFORMAR** ampliamente a la comunidad que, durante las horas señaladas, tendrán parcialmente restringida la libre circulación vehicular.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Yopal Casanare a los

MICHAEL JONATHAN CASTRO NIÑO
Secretario de Movilidad de Yopal

Elaboro: Juan Sebastián Porras González
Cargo: Director de Seguridad Vial y Control
Secretaria de Movilidad

Revisó: Ramiro Antonio Mariño Caro
Cargo: Profesional Universitario
Secretaria de Movilidad

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
NOTIFICACIÓN PERSONAL

El Señor David Fernando Pedraza Rojas Se Hizo Presente
En Este Despacho El Día 28 Del Mes 07 Del Año 2026
Que Se Identifica Con La C.C. No. 1118.560.888
Expedida en Yopal - Casanare
Quien Se Notifica De La Resolución No. 041570 de 2026
De Fecha 17 Julio

EL NOTIFICADO

LA SECRETARIA

Powered by CamScanner

ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP

ENTREGA DE DOTACIÓN Y/O ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ASOSUPRO

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE
CONTRATISTA DE OBRA	ENERGIA INTEGRAL ANDINA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	019 de 2026
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	Proyectos Triple O S.A.S.

NOMBRE	CARGO	ELEMENTOS DE PROTECION PERSONAL.		NORMA A CUMPLIR	FECHA DE RECIBIDO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
		ELEMENTOS DE PROTECIÓN PERSONAL / DOTACIÓN	CANTIDAD			
Alberto Manrrique Gomez	Ayudante de obra	Dotación (Pantalon Jean- camisa)	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	Alberto M.
Alberto Manrrique Gomez	Ayudante de obra	Botas de seguridad	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	Alberto M.
Alberto Manrrique Gomez	Ayudante de obra	Casco de seguridad	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	Alberto M.
Alberto Manrrique Gomez	Ayudante de obra	Gafas de seguridad	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	Alberto M.
Alberto Manrrique Gomez	Ayudante de obra	Protección auditiva de inserción	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	Alberto M.
Alberto Manrrique Gomez	Ayudante de obra	Guantes de vaqueta	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	Alberto M.
Alberto Manrrique Gomez	Ayudante de obra	Guantes Zubiola	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	Alberto M.

Con la firma de este registro certifico que:
1. Recibí los elementos de proteccion pers
2. Los revisé y se encuentran en buen estado.
3. Conozco su uso.
4. Me comprometo a usarlo.
5. Me comprometo a mantenerlo en buen estado e informar oportunamente la necesidad de cambiarlo

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día **27-07-2026**

Firma
Nombre: JOAQUIN VARGAS RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: BY25007973

Firma
Nombre: SANDRA MILENA HERNÁNDEZ ESGUERRA
PROFESIONAL SST DE OBRA
Licencia Profesional: 25-01029

Firma
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: AT205-136969

Firma
Nombre:Nombre: ALVARO ANDRES BERNAL SALAMANCA
PROFESIONAL SST DE INTERVENTORIA
Licencia Profesional: 203 DE 13/01/2020

ENTREGA DE DOTACIÓN Y/O ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ASOSUPRO

CONTRATO N°	**019 de 2026**	**PROYECTO N°**	**2025850010003**

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE
CONTRATISTA DE OBRA	ENERGIA INTEGRAL ANDINA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	019 de 2026
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	Proyectos Triple O S.A.S.

NOMBRE	CARGO	ELEMENTOS DE PROTECION PERSONAL.		NORMA A CUMPLIR	FECHA DE RECIBIDO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
		ELEMENTOS DE PROTECIÓN PERSONAL / DOTACIÓN	CANTIDAD			
Edwar Santiago Amortegui	Ayudante de obra	Dotación (Pantalon Jean- camisa)	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	Santiago
Edwar Santiago Amortegui	Ayudante de obra	Botas de seguridad	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	Santiago
Edwar Santiago Amortegui	Ayudante de obra	Casco de seguridad	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	Santiago
Edwar Santiago Amortegui	Ayudante de obra	Gafas de seguridad	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	Santiago
Edwar Santiago Amortegui	Ayudante de obra	Protección auditiva de inserción	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	Santiago
Edwar Santiago Amortegui	Ayudante de obra	Guantes de vaqueta	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	Santiago
Edwar Santiago Amortegui	Ayudante de obra	Guantes Zubiola	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	Santiago

Con la firma de este registro certifico que:
1. Recibí los elementos de proteccion pers
2. Los revisé y se encuentran en buen estado.
3. Conozco su uso.
4. Me comprometo a usarlo.
5. Me comprometo a mantenerlo en buen estado e informar oportunamente la necesidad de cambiarlo

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día **27-07-2026**

Joaquin Vargas R.

Firma
Nombre: JOAQUIN VARGAS RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: BY25007973

Firma
Nombre: SANDRA MILENA HERNÁNDEZ ESGUERRA
PROFESIONAL SST DE OBRA
Licencia Profesional: 25-01029

Firma
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: AT205-136969

Firma
Nombre:Nombre: ALVARO ANDRES BERNAL SALAMANCA
PROFESIONAL SST DE INTERVENTORIA
Licencia Profesional: 203 DE 13/01/2020

ENTREGA DE DOTACIÓN Y/O ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ASOSUPRO

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE
CONTRATISTA DE OBRA	ENERGIA INTEGRAL ANDINA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	019 de 2026
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	Proyectos Triple O S.A.S.

NOMBRE	CARGO	ELEMENTOS DE PROTECION PERSONAL		NORMA A CUMPLIR	FECHA DE RECIBIDO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
		ELEMENTOS DE PROTECIÓN PERSONAL / DOTACIÓN	CANTIDAD			
Felix Amortegui Sanchez	Ayudante de obra	Dotación (Pantalon Jean- camisa)	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	FELIX AMORTEGUI
Felix Amortegui Sanchez	Ayudante de obra	Botas de seguridad	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	FELIX AMORTEGUI.
Felix Amortegui Sanchez	Ayudante de obra	Casco de seguridad	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	FELIX AMORTEGUI
Felix Amortegui Sanchez	Ayudante de obra	Gafas de seguridad	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	FELIX AMORTEGUI
Felix Amortegui Sanchez	Ayudante de obra	Protección auditiva de inserción	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	FELIX AMORTEGUI.
Felix Amortegui Sanchez	Ayudante de obra	Guantes de vaqueta	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	FELIX AMORTEGUI.
Felix Amortegui Sanchez	Ayudante de obra	Guantes Zubiola	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	FELIX AMORTEGUI.

Con la firma de este registro certifico que:
1. Recibí los elementos de proteccion pers
2. Los revisé y se encuentran en buen estado.
3. Conozco su uso.
4. Me comprometo a usarlo.
5. Me comprometo a mantenerlo en buen estado e informar oportunamente la necesidad de cambiarlo

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día **27-07-2026**

Joaquin Vargas R.

Firma
Nombre: JOAQUIN VARGAS RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: BY25007973

Firma
Nombre: SANDRA MILENA HERNÁNDEZ ESGUERRA
PROFESIONAL SST DE OBRA
Licencia Profesional: 25-01029

Firma
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: AT205-136969

Firma ANDINA BERNAL
Nombre:Nombre: ALVARO ANDRES BERNAL SALAMANCA
PROFESIONAL SST DE INTERVENTORIA
Licencia Profesional: 203 DE 13/01/2020

ENTREGA DE DOTACIÓN Y/O ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ASOSUPRO

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE
CONTRATISTA DE OBRA	ENERGIA INTEGRAL ANDINA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	019 de 2026
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	Proyectos Triple O S.A.S.

NOMBRE	CARGO	ELEMENTOS DE PROTECION PERSONAL		NORMA A CUMPLIR	FECHA DE RECIBIDO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
		ELEMENTOS DE PROTECIÓN PERSONAL / DOTACIÓN	CANTIDAD			
Jhon Andres Barrios Rivera	Ayudante de obra	Dotación (Pantalon Jean- camisa)	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	
Jhon Andres Barrios Rivera	Ayudante de obra	Botas de seguridad	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	
Jhon Andres Barrios Rivera	Ayudante de obra	Casco de seguridad	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	
Jhon Andres Barrios Rivera	Ayudante de obra	Gafas de seguridad	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	
Jhon Andres Barrios Rivera	Ayudante de obra	Protección auditiva de inserción	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	
Jhon Andres Barrios Rivera	Ayudante de obra	Guantes de vaqueta	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	
Jhon Andres Barrios Rivera	Ayudante de obra	Guantes Zubiola	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	

Con la firma de este registro certifico que:
1. Recibí los elementos de proteccion pers
2. Los revisé y se encuentran en buen estado.
3. Conozco su uso.
4. Me comprometo a usarlo.
5. Me comprometo a mantenerlo en buen estado e informar oportunamente la necesidad de cambiarlo

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día **27-07-2026**

Firma
Nombre: JOAQUIN VARGAS RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: BY25007973

Firma
Nombre: SANDRA MILENA HERNÁNDEZ ESGUERRA
PROFESIONAL SST DE OBRA
Licencia Profesional: 25-01029

Firma
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: AT205-136969

Firma
Nombre:Nombre: ALVARO ANDRES BERNAL SALAMANCA
PROFESIONAL SST DE INTERVENTORIA
Licencia Profesional: 203 DE 13/01/2020

ENTREGA DE DOTACIÓN Y/O ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ASOSUPRO

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE
CONTRATISTA DE OBRA	ENERGIA INTEGRAL ANDINA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	019 de 2026
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	Proyectos Triple O S.A.S.

NOMBRE	CARGO	ELEMENTOS DE PROTECION PERSONAL.		NORMA A CUMPLIR	FECHA DE RECIBIDO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
		ELEMENTOS DE PROTECIÓN PERSONAL / DOTACIÓN	CANTIDAD			
Luis Alfredo Barrios Rivera	Ayudante de obra	Dotación (Pantalon Jean- camisa)	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	Luis Barrios
Luis Alfredo Barrios Rivera	Ayudante de obra	Botas de seguridad	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	Luis Barrios
Luis Alfredo Barrios Rivera	Ayudante de obra	Casco de seguridad	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	Luis Barrios
Luis Alfredo Barrios Rivera	Ayudante de obra	Gafas de seguridad	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	Luis Barrios
Luis Alfredo Barrios Rivera	Ayudante de obra	Protección auditiva de Inserción	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	Luis Barrios
Luis Alfredo Barrios Rivera	Ayudante de obra	Guantes de vaqueta	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	Luis Barrios
Luis Alfredo Barrios Rivera	Ayudante de obra	Guantes Zubiola	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	Luis Barrios

Con la firma de este registro certifico que:
1. Recibí los elementos de proteccion pers
2. Los revisé y se encuentran en buen estado.
3. Conozco su uso.
4. Me comprometo a usarlo.
5. Me comprometo a mantenerlo en buen estado e informar oportunamente la necesidad de cambiarlo

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día **27-07-2026**

Firma
Nombre: JOAQUIN VARGAS RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: BY25007973

Firma
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: AT205-136969

Firma
Nombre: SANDRA MILENA HERNÁNDEZ ESGUERRA
PROFESIONAL SST DE OBRA
Licencia Profesional: 25-01029

Firma
Nombre:Nombre: ALVARO ANDRES BERNAL SALAMANCA
PROFESIONAL SST DE INTERVENTORIA
Licencia Profesional: 203 DE 13/01/2020

INFORME IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



ENERGÍA INTEGRAL ANDINA.

www.eia.com.co

INFORME AVANCE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No. 002

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE

CONTRATO DE OBRA: 019 DE 2026

Periodo: 01 al 30 de Julio de 2026

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN	2
2. OBJETIVO	3
2.1. Objetivo específicos	4
3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO	5
3.1. Localización geográfica del proyecto.	5
3.2. Descripción de las fases del proyecto	7
3.3. Descripción de las actividades de seguridad y salud en el trabajo	7
3.3.1. Relación de personal	8
3.3.2. Aportes al sistema de seguridad social	9
3.3.3. Exámenes médicos ocupacionales	10
3.3.4. Inducción en seguridad y salud en el trabajo.	11
3.3.5. Entrega de dotación y elementos de protección personal.	12
3.3.6. Actividades de capacitación y formación	15
3.3.7. Análisis de Trabajo seguro	16
3.3.8. Inspecciones de seguridad	16
3.3.9. Indicadores	17
3.3.9.1 Frecuencia de accidentalidad	17
3.3.9.2 Severidad de la accidentalidad laboral	19
3.3.9.3 Ausentismo por causa Médica	21
3.3.10. Plan de manejo de Tránsito- PMT	23
3.3.11. Pausas activas	24
4. CONCLUSIONES	25
5. ANEXOS	26

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) registra el avance y desarrollo de las actividades establecidas en el plan de trabajo para la ejecución del Contrato N.° 019 de 2026 – ASOSUPRO, y tiene como propósito presentar el estado de las acciones implementadas para la identificación, evaluación y control de los riesgos laborales, así como el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2, y la Resolución 0312 de 2019, por la cual se establecen los Estándares Mínimos del SG-SST.

Durante el periodo reportado se dio inicio a las actividades operativas en obra, por lo cual se avanzó en la implementación de las medidas contempladas en el SG-SST, de acuerdo con las actividades ejecutadas y las condiciones particulares del proyecto. Las acciones desarrolladas estuvieron orientadas a la prevención de accidentes e incidentes de trabajo, la identificación y control de los peligros presentes en las actividades constructivas y la promoción de condiciones seguras para el personal vinculado al proyecto.

Asimismo, se realizó el seguimiento a los requisitos de seguridad establecidos para el inicio y desarrollo de las actividades, incluyendo la gestión de los elementos de protección personal (EPP), la socialización de medidas de seguridad y la verificación de las condiciones necesarias para la ejecución segura de las labores.

El presente informe deja constancia del avance en la implementación del SG-SST durante el periodo evaluado y servirá como herramienta para el seguimiento, control y mejora continua de las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo durante las diferentes etapas de ejecución del proyecto.

2. OBJETIVO

Presentar las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ejecutadas durante el período comprendido entre el 01 al 30 de julio de 2026, con el fin de evidenciar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019. Asimismo, evidenciar las acciones implementadas para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como realizar el seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para la ejecución del Contrato No. 019 de 2026.

2.1. Objetivo específicos

- ✔ Verificar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
- ✔ Implementar las actividades establecidas en el Plan de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
- ✔ Identificar oportunidades de mejora que fortalezcan la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y faciliten el cumplimiento de la normatividad vigente.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATO N°	019 de 2026	**PROYECTO N°**	2025850010003
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE		
NÚMERO DE INFORME:	02		
PERIODO:	01 al 30 de julio 2026		

3.1. Localización geográfica del proyecto.

El proyecto se localiza en el municipio de Yopal, capital del departamento de Casanare, en la región de la Orinoquia colombiana, específicamente sobre la vía La Pedrera, en el área rural del municipio. Yopal se encuentra ubicado en el occidente del departamento, sobre el piedemonte de la Cordillera Oriental, constituyéndose como uno de los principales centros urbanos y de servicios de la región.


En cuanto a sus límites territoriales, Yopal limita al norte con los municipios de Nunchía y Paya, este último perteneciente al departamento de Boyacá; al sur con los municipios de Orocué y Maní; al oriente con Nunchía y San Luis de Palenque; y al occidente con Aguazul y Labranzagrande, este último en el departamento de Boyacá.


El espacio destinado para realizar la intervención del proyecto de inversión denominado "IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE", se localiza en el sector denominado La Pedrera de la vereda el Picón, ubicando el final del tramo a intervenir a 5,74 kilómetros del casco urbano del municipio de Yopal.

MUNICIPIO:	YOPAL CASANARE	VEREDA:	Vía La Pedrera

COORDENADAS:

TRAMO A INTERVENIR							
PUNTO INICIAL				PUNTO FINAL			
K0+000				K12+7353,93			
PLANAS		GEOGRAFICAS		PLANAS		GEOGRAFICAS	
N: 1079910.452	E:855282.146	LAT: 5.317450°	LONG: -72.383000°	N:1078981.067	E:854818.949	LAT: 5.309039°	LONG:-72.387160°

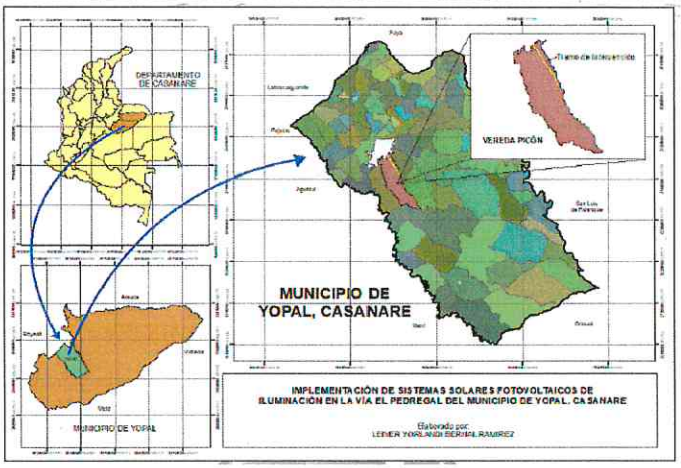

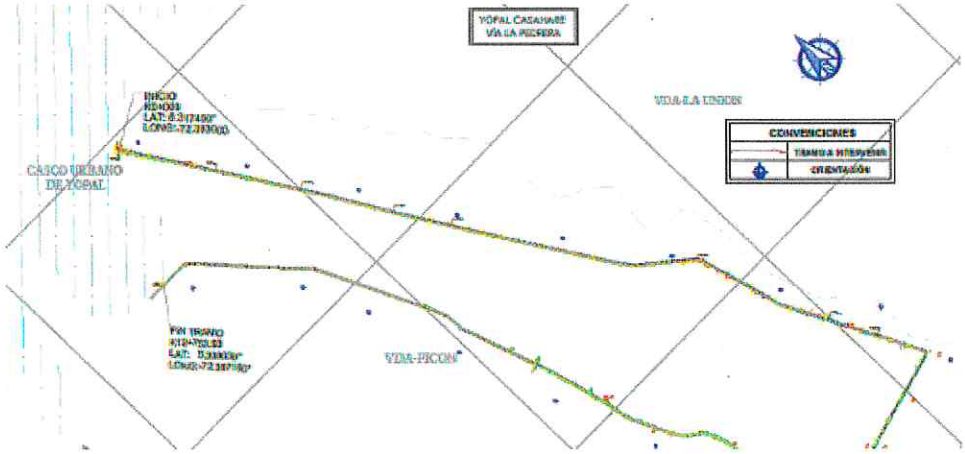

3.2. Descripción de las fases del proyecto

Actividades Preliminares
Replanteo de obra.
Desmonte y limpieza en zonas no boscosas del sitio (incluye retiro disposición final)

Construcción
Excavación manual en material común del sitio para cimentación de postes de alumbrado público solar (Incluye retiro y disposición final).
Suministro e Instalación de poste en fibra de vidrio para alumbrado público (12mt 510kgf).
Cimentación para postes de alumbrado público solar.
Suministro e instalación de luminarias solar ELITE III PRO INI-SL Incluye (Luminaria LED, Panel solar fotovoltaico y batería, soporte para conexiones, brazo metálico galvanizado y collarín anti vandálico).

Cierre y Finalización
Desmovilización de equipos, limpieza de áreas intervenidas y entrega de la obra.

3.3. Descripción de las actividades de seguridad y salud en el trabajo

Durante el período comprendido entre el 01 al 30 de julio de 2026, las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) estuvieron orientadas a la implementación y seguimiento de las medidas establecidas en el SG-SST, de acuerdo con el inicio de las actividades operativas del proyecto.

Durante este período se dio inicio a las actividades en obra, por lo cual se implementaron acciones encaminadas a la identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos laborales, así como a la prevención de incidentes y accidentes de trabajo. De igual manera, se realizó seguimiento a las condiciones de seguridad de las áreas de trabajo, al uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP) y al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas para el desarrollo de las actividades, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2, y la Resolución 0312 de 2019, en lo relacionado con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Asimismo, se adelantaron actividades de inducción, socialización de medidas de prevención, inspecciones y acompañamiento en campo, de acuerdo con las necesidades y actividades ejecutadas durante el periodo.

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas durante el período reportado

.

3.3.1. Relación de personal

Relación de personal profesional aprobado.

NOMBRE	CARGO	% DEDICACIÓN PERSONA- MES
Lauro Daniel León Garzón	Director de obra	50%
Joaquín Vargas Rodríguez	Residente de obra	100%
Laura Camila Caballero Roldan	Ingeniero Ambiental	30%
Néstor Raúl Canchón Casas	Tecnólogo Electricista	100%
Sandra Milena Hernández Esguerra	Profesional SISOMA	50%

Dentro del personal operativo que tenemos en el momento se encuentran:

No.	APELLIDO -NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
1	Alberto Manrrique Gomez	1.074.486.092	Ayudante	27/7/2026	-
2	Edwar Santiago Amortegui Rodriguez	1.071.062.177	Ayudante	27/7/2026	-
3	Felix Amortegui Sanchez	1.070.613.623	Ayudante	27/7/2026	-
4	Jhon Andres Barrios Rivera	1.070.592.353	Ayudante	27/7/2026	-
5	Luis Alfredo Barrios Rivera	1.070.600.122	Ayudante	27/7/2026	-

3.3.2. Aportes al sistema de seguridad social

Durante el período comprendido entre el 01 al 30 de julio de 2026, se efectuó la revisión documental correspondiente a los soportes de afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y riesgos laborales), como parte de las actividades de control y seguimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Trabajadores directos de ENERGÍA INTEGRAL ANDINA:

Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	Días Cotizados	Número de planilla	EPS	PENSION	ARL
Lauro Daniel León Garzón	DIRECTOR DE OBRA	74.377.955	30	6030573722	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA
Joaquin Vargas Rodriguez	RESIDENTE DE OBRA	6.772.241	30	6030573722	SANITAS	COLPENSIONES	SURA
Nestor Raul Canchon	TECNOLOGO ELECTRICISTA	80.737.747	30	6030573722	SANITAS	COLFONDOS	SURA
Sandra Milena Hernández Esguerra	PROF.SISOMA	20.430.391	30	6030573722	FAMISANAR	COLFONDOS	SURA
Manrique Gomez Alberto	AYUDANTE	1.074.486.092	4	6030573722	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	SURA
Amortegui Rodriguez Edwar Santiago	AYUDANTE	1.071.062.177	4	6030573722	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA
Amortegui Sanchez Felix	AYUDANTE	1.070.613.623	4	6030573722	SANITAS	PORVENIR	SURA
Luis Alfredo Barrios Rivera	AYUDANTE	1.070.600.122	4	6030573722	FAMISANAR	PORVENIR	SURA
Jhon Andres Barrios RIvera	AYUDANTE	1.070.592.353	4	6030573722	FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA

Nota: Se anexan las planillas de pago No. 6033264283 y No. 6033397097, correspondientes a la corrección realizada por concepto de nivel de riesgo del director de obra y del profesional SISOMA.

Relación de personal vinculada por modalidad independiente

Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	Días Cotizados	Número de planilla	EPS	PENSION	ARL
LAURA CAMILA CABALLERO ROLDAN	INGENIERA AMBIENTAL	1.070.622.211	30	6030580702	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA

Para la ejecución de las actividades de replanteo de obra, se dispuso del servicio de topografía, integrado por el siguiente personal:

Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	Días Cotizados	Número de planilla	EPS	PENSION	ARL
FANNY BARRERA GONZALEZ	TOPOGRAFÍA	46.370.853	30	9510788431	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA
ELBER IGNACIO GAMBOA GARCIA	CADENERO	7.311.566	30	9510788431	SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA

Anexo 1- Planillas de seguridad social.

3.3.3. Exámenes médicos ocupacionales

Durante el período comprendido entre el 01 al 30 de julio de 2026, se dio inicio a las actividades operativas en obra, por lo cual se realizó la verificación de los exámenes médicos ocupacionales de ingreso del personal vinculado al proyecto, conforme a los lineamientos establecidos en el profesiograma.

De igual manera, se efectuó el seguimiento de los conceptos de aptitud médica ocupacional del personal profesional y operativo, verificando que los trabajadores cuenten con las condiciones de salud requeridas para el desarrollo de las funciones asignadas y que estas sean acordes con los peligros y riesgos asociados a las actividades ejecutadas.

Estas acciones hacen parte del proceso de seguimiento y control del SG-SST y contribuyen a garantizar que el personal que participa en las actividades del proyecto cuente con las condiciones de aptitud requeridas para desempeñar sus labores de manera segura.

Trabajadores directos de ENERGÍA INTEGRAL ANDINA (Exámenes de ingreso):

NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO Y/O OFICIO	FECHA DE EXAMEN DE INGRESO	CONCEPTO	FRECUENCIA (PROFESIOGRAMA)
Manrique Gomez Alberto	AYUDANTE	22-07-2026	APTO Y SIN RESTRICCIONES	Anual
Amortegui Rodriguez Edwar Santiago	AYUDANTE	22-07-2026	APTO Y SIN RESTRICCIONES	Anual
Amortegui Sanchez Felix	AYUDANTE	22-07-2026	APTO Y SIN RESTRICCIONES	Anual
Luis Alfredo Barrios Rivera	AYUDANTE	22-07-2026	APTO Y SIN RESTRICCIONES	Anual
Jhon Andres Barrios RIvera	AYUDANTE	22-07-2026	APTO Y SIN RESTRICCIONES	Anual

Anexo 2- Exámenes médicos ocupacionales

3.3.4. Inducción en seguridad y salud en el trabajo.

Durante el período reportado, se realizó la verificación y seguimiento de las actividades relacionadas con los procesos de inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Teniendo en cuenta que durante este período se dio inicio a las actividades operativas en obra, se realizó la inducción al personal vinculado al proyecto, previo al desarrollo de sus funciones, con el propósito de fortalecer el conocimiento sobre los peligros y riesgos asociados a las actividades, las medidas de prevención y control, el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), los procedimientos de trabajo seguro y las responsabilidades de los trabajadores frente al cumplimiento de las disposiciones en materia de SST.

Estas actividades se desarrollaron de conformidad con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.11, parágrafo 2, y la Resolución 0312 de 2019, en lo relacionado con la inducción, capacitación y formación en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Asimismo, se realizó el seguimiento a la documentación correspondiente a las inducciones del personal profesional y operativo vinculado al proyecto, dejando los respectivos soportes como evidencia del cumplimiento de las actividades establecidas en el SG-SST, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.11, parágrafo 2, y en la Resolución 0312 de 2019, Estándares Mínimos, ítem "Inducción y reinducción en SST".





Anexo 3. Registros de inducción SGI

3.3.5. Entrega de dotación y elementos de protección personal.

Durante el período evaluado, y teniendo en cuenta que se dio inicio a las actividades operativas en obra, se realizó la entrega de los Elementos de Protección Personal (EPP) y la dotación al personal vinculado al proyecto, de acuerdo con los requisitos establecidos en la Matriz de Elementos de Protección Personal y las condiciones de cada cargo.

La entrega de estos elementos se efectuó considerando los peligros, riesgos y controles asociados a las actividades desarrolladas, con el propósito de garantizar la protección de los trabajadores durante la ejecución de sus labores y prevenir la ocurrencia de incidentes y accidentes de trabajo.

Asimismo, se cuenta con los respectivos soportes de entrega de EPP y dotación, debidamente diligenciados, como evidencia del cumplimiento de las medidas establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.11, Resolución 0312 de 2019, así como en la Resolución 2400 de 1979, en lo relacionado con los elementos de protección personal.






27/07/2026 11:17:29 a. m.
5,317578N 72,382656W
Calle 48
Yopal
Casanare
Altitud:304.7msnm
Velocidad:0.0km/h
YOPAL CASANARE
VIA LA PEDRERA
P01


27/07/2026 11:17:40 a. m.
5,317578N 72,382649W
Calle 48
Yopal
Casanare
Altitud:304.5msnm
Velocidad:0.0km/h
YOPAL CASANARE
VIA LA PEDRERA
P01


27/07/2026 11:17:48 a. m.
5,317579N 72,382649W
Calle 48
Yopal
Casanare
Altitud:304.7msnm
Velocidad:0.0km/h
YOPAL CASANARE
VIA LA PEDRERA
P01


27/07/2026 11:18:03 a. m.
5,317577N 72,382644W
Calle 48
Yopal
Casanare
Altitud:304.8msnm
Velocidad:0.0km/h
YOPAL CASANARE
VIA LA PEDRERA
P01

Anexo 4. Registros de entrega de Elementos de Protección Personal (EPP) y dotación.

3.3.6. Actividades de capacitación y formación

Durante el período reportado, y teniendo en cuenta el inicio de las actividades operativas en obra, se ejecutaron charlas de seguridad dirigidas al personal vinculado al proyecto, como parte de las actividades contempladas en el cronograma de formación del SG-SST.

Las charlas pre operacionales estuvieron orientadas a la prevención de accidentes e incidentes de trabajo, la identificación de peligros y riesgos, la implementación de medidas de prevención y control, el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP) y el cumplimiento de las normas de seguridad establecidas para el desarrollo de las actividades en obra, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.11, y la Resolución 0312 de 2019, en lo relacionado con la capacitación y formación en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Como evidencia de estas actividades se cuenta con los registros de asistencia, temas socializados, material de apoyo y demás soportes correspondientes, permitiendo realizar el seguimiento y control al cumplimiento de las actividades de capacitación y sensibilización en Seguridad y Salud en el Trabajo.







Anexo 5. Charlas de seguridad

3.3.7. Análisis de Trabajo seguro

Durante el período reportado, y teniendo en cuenta el inicio de las actividades operativas en obra, se realizó la elaboración, socialización y verificación de Análisis de Trabajo Seguro (ATS) para las actividades programadas, con el propósito de identificar previamente los peligros asociados a cada tarea, valorar los riesgos y establecer las medidas de prevención y control necesarias para garantizar la ejecución segura de los trabajos.

Anexo 6. Análisis de Trabajo seguro

3.3.8. Inspecciones de seguridad

Durante el período reportado, y teniendo en cuenta el inicio de las actividades operativas en obra, se realizaron inspecciones de herramientas y equipos de trabajo, así como la verificación de los elementos y recursos disponibles para la atención de primeros auxilios.

La inspección de herramientas estuvo orientada a verificar su estado físico, condiciones de funcionamiento y uso seguro, con el fin de identificar oportunamente elementos que pudieran representar riesgos para los trabajadores.

Asimismo, se realizó la verificación del botiquín y los elementos de primeros auxilios, comprobando su disponibilidad, estado y condiciones de almacenamiento, con el propósito de garantizar una respuesta oportuna ante cualquier situación que pueda presentarse durante la ejecución de las actividades.

Estas inspecciones hacen parte de las medidas de prevención y control implementadas en el marco del SG-SST, y cuentan con los respectivos registros como evidencia de su ejecución.



Anexo 7. Inspecciones de seguridad

3.3.9. Indicadores

3.3.9.1 Frecuencia de accidentalidad

En el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), durante el período reportado se realizó el seguimiento al indicador de frecuencia de la accidentalidad, con el propósito de evaluar la ocurrencia de accidentes de trabajo en relación con la exposición de los trabajadores y verificar la efectividad de las medidas de prevención y control implementadas.

Durante el período comprendido entre el 09 de julio y el 08 de agosto de 2026, se efectuó seguimiento a los eventos de accidentalidad presentados durante el desarrollo de las actividades operativas en obra. Como resultado de la revisión, no se reportaron accidentes de trabajo durante el período evaluado.

Nombre del indicador	Frecuencia de la Accidentalidad
Elaborado por	Sandra Milena Hernández
Objetivo del indicador	Determinar la frecuencia de los accidentes de trabajo presentados durante el periodo de medición en el proyecto ubicado en Yopal, Casanare – vía La Pedrera, con el fin de realizar seguimiento al desempeño del Sistema de Gestión

	de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
Método de cálculo	Número de accidentes de trabajo ocurridos en el mes / Número total de trabajadores en el mes × 100
Interpretación del indicador	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron durante el mes, se presentaron [X] accidentes de trabajo. Un resultado igual a cero (0) indica que no se presentaron accidentes de trabajo durante el periodo evaluado.
Meta	0%
Fuente de la información para el cálculo	Registros de reporte e investigación de accidentes e incidentes de trabajo, registros de asistencia y/o nómina, y planillas de pago de seguridad social.
Periodicidad del reporte	Mensual
Personas que deben conocer el resultado	Gerencia, responsable del SG-SST, trabajadores y COPASST.
Responsable del seguimiento o verificación	Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
Área / Proyecto	Yopal, Casanare – Vía La Pedrera

FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	
Descripción del indicador	**Periodo**
	Julio 2026
No. De accidentes de Trabajo presentados en el mes	**0**
No. Trabajadores en el mes	**12**
Resultado del indicador frecuencia de Accidentalidad	0

Durante el período evaluado no se registraron accidentes de trabajo, por lo que el indicador de frecuencia de la accidentalidad presenta un resultado de cero (0%).

3.3.9.2 Severidad de la accidentalidad laboral

Con el propósito de realizar el seguimiento y control del comportamiento de la accidentalidad laboral, ENERGÍA INTEGRAL ANDINA, a través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), implementó el indicador de severidad de la accidentalidad, mediante el cual se realiza el seguimiento a los días perdidos como consecuencia de accidentes de trabajo.

Este indicador permite evaluar el impacto de los eventos ocurridos, analizar la efectividad de las medidas de prevención y control implementadas y establecer acciones de mejora orientadas a prevenir la ocurrencia de accidentes y fortalecer las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del proyecto.

Nombre del indicador	Severidad de la Accidentalidad Laboral
Elaborado por	Sandra Milena Hernández
Objetivo del indicador	Determinar los días de incapacidad y/o días de trabajo perdidos como consecuencia de los accidentes de trabajo ocurridos durante el periodo evaluado, con el fin de establecer medidas correctivas y preventivas orientadas a reducir la severidad de la accidentalidad laboral.
Método de cálculo	Número de días perdidos por accidentes de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes / número de trabajadores en el mes × 100
Interpretación del indicador	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron durante el mes, se presentaron [X] días perdidos como consecuencia de accidentes de trabajo. Un resultado igual a cero (0) indica que no se presentaron días perdidos por accidentes de trabajo durante el periodo evaluado.
Meta	Igual a 0%

Fuente de la información para el cálculo	Certificados de incapacidad médica, registros de accidentes de trabajo, investigaciones de accidentes y registros de nómina o personal del proyecto.
Periodicidad del reporte	Mensual
Personas que deben conocer el resultado	Gerencia, responsable del SG-SST, trabajadores y COPASST.

SEVERIDAD DE LA ACCIDENTALIDAD	
Descripción del indicador	**Periodo**
	Julio 2026
No. Total de días perdidos en el mes por accidentes laborales	0
No. Total de días cargados por muerte o por Pérdida de Capacidad Laboral	0
No. Trabajadores en el mes	12
Resultado del indicador de severidad	0

Durante el período evaluado no se registraron accidentes de trabajo, por lo que el indicador de severidad presenta un resultado de cero (0).

3.3.9.3 Ausentismo por causa Médica

En el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), durante el período reportado se realizó el seguimiento al indicador de ausentismo por causa médica, con el propósito de identificar, analizar y controlar las ausencias laborales derivadas de causas médicas, así como evaluar su comportamiento y establecer acciones orientadas a la prevención y control de las condiciones que puedan afectar la salud de los trabajadores.

Nombre del indicador	Ausentismo por causa médica
Elaborado por	Sandra Milena Hernández

Objetivo del indicador	Determinar el porcentaje de ausentismo laboral generado por causas médicas durante el período de medición en el proyecto ubicado en Yopal, Casanare – Vía La Pedrera, con el fin de realizar seguimiento al comportamiento del ausentismo y al desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
Método de cálculo	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral y común / Número de días de trabajo programados) * 100.
Interpretación del indicador	El resultado representa el porcentaje de días laborales perdidos por ausencias derivadas de causas médicas durante el período evaluado. Un resultado igual a cero (0%) indica que no se presentaron días de ausencia por causa médica durante el período reportado.
Meta	≤ 2%
Fuente de la información para el cálculo	Registros de ausentismo e incapacidades médicas, certificados de incapacidad, registros de asistencia y/o nómina, y planillas de pago de seguridad social
Periodicidad del reporte	Mensual
Personas que deben conocer el resultado	Gerencia, responsable del SG-SST, trabajadores y COPASST.
Responsable del seguimiento o verificación	Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
Área / Proyecto	Yopal, Casanare – Vía La Pedrera

AUSENTISMO POR CAUSA MÉDICA	
Descripción del indicador	**Periodo**
	Julio 2026
Número de días de ausencia por incapacidad laboral y común	0
Número de días de trabajo programados	31
Resultado del indicador de Ausentismo por causa médica	0%

Durante el período evaluado, se presentó un ausentismo por causa médica del 0% de los días de trabajo programados, debido a que no se registraron días de ausencia por incapacidad médica.

3.3.10. Plan de manejo de Tránsito- PMT

ENERGÍA INTEGRAL ANDINA, en cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de tránsito y seguridad vial, elaboró el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para la ejecución del proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE", de conformidad con la Ley 769 de 2002 – Código Nacional de Tránsito Terrestre, especialmente sus artículos 101, 102, 114, 115 y 119; la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana; y el Manual de Señalización Vial – Dispositivos Uniformes en la Infraestructura Vial para la Regulación del Tránsito y la Seguridad Vial 2024, adoptado mediante la Resolución No. 20243040045005 del 17 de septiembre de 2024, así como las demás disposiciones aplicables al proyecto.

Marco normativo aplicable al PMT:

- **Ley 769 de 2002 – Código Nacional de Tránsito Terrestre:** artículos 101, 102, 114, 115 y 119.
- **Resolución 001235 de 2012 – Ministerio de Transporte:** registro de maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada.
- **Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana:** disposiciones relacionadas con integridad urbanística.

- **Manual de Señalización Vial 2024:** adoptado mediante **Resolución No. 20243040045005 del 17 de septiembre de 2024**.
- **Pliegos de condiciones y demás disposiciones contractuales aplicables al proyecto.**

El PMT fue presentado ante la Secretaría de Tránsito y Transporte del Municipio de Yopal y aprobado mediante Resolución N.° 04570 del 17 de julio de 2026 – PMT La Pedrera, constituyéndose en el instrumento técnico y operativo para establecer las medidas de regulación, señalización y control del tránsito durante la ejecución de las actividades del proyecto.

El plan contempla las medidas técnicas, operativas y administrativas necesarias para prevenir, mitigar y controlar las posibles afectaciones a la movilidad vehicular y peatonal, incluyendo la implementación de señalización temporal, delimitación y protección de las zonas de trabajo, regulación del tránsito y medidas de información y prevención dirigidas a los diferentes actores viales.

Durante el período comprendido entre el 09 de julio y el 08 de agosto de 2026, se dio inicio a las actividades operativas del proyecto, por lo cual se implementaron las medidas establecidas en el PMT aprobado, de acuerdo con las condiciones y actividades desarrolladas en campo. Se realizó seguimiento a la señalización, delimitación de las áreas de intervención y aplicación de las medidas de control y prevención, con el propósito de garantizar condiciones seguras para los trabajadores, peatones, conductores y demás usuarios de la vía.





Anexo 8. PMT aprobado.

3.3.11. Pausas activas

Durante el período reportado se realizaron pausas activas dirigidas al personal vinculado al proyecto, como parte de las actividades de promoción y prevención establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Estas actividades estuvieron orientadas a disminuir la fatiga física y mental, prevenir la aparición de molestias y lesiones musculoesqueléticas y promover hábitos de trabajo saludables durante la jornada laboral. Las pausas incluyeron ejercicios de movilidad articular, estiramiento y activación de los principales grupos musculares, de acuerdo con las condiciones y actividades desarrolladas por el personal.

La ejecución de las pausas activas contribuye al bienestar de los trabajadores y al fortalecimiento de las estrategias de promoción de la salud y prevención de riesgos laborales implementadas en el proyecto.







Anexo 9. Registro de pausas activas

4. CONCLUSIONES

Durante el período objeto del presente informe, ENERGÍA INTEGRAL ANDINA S.A.S. avanzó en la implementación de las actividades administrativas, operativas y de planificación requeridas para garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015, particularmente en el Capítulo 6 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2, y en la Resolución 0312 de 2019, durante la ejecución del proyecto.

En este sentido, se realizó la implementación y seguimiento de los procedimientos, programas y documentos necesarios para la gestión de los riesgos laborales, incluyendo la inducción y capacitación del personal, entrega de Elementos de Protección Personal (EPP) y dotación, inspecciones de seguridad, charlas de seguridad, verificación de herramientas y equipos, revisión de elementos de primeros auxilios y seguimiento a las condiciones de seguridad en campo.

De igual manera, se realizó la implementación de las medidas establecidas en el Plan de Manejo de Tránsito (PMT), aprobado mediante Resolución N.° 04570 del 17 de julio de 2026 – PMT La Pedrera, de acuerdo con las actividades operativas desarrolladas durante el periodo.

Las acciones implementadas estuvieron orientadas a la identificación, prevención y control de los riesgos laborales, promoviendo condiciones seguras para los trabajadores y demás actores involucrados en la ejecución del proyecto.

5. ANEXOS

- ✔ **Anexo 1-** Planillas de seguridad social
- ✔ **Anexo 2-** Exámenes médicos ocupacionales
- ✔ **Anexo 3.** Registros de inducción SGI
- ✔ **Anexo 4.** Registros de entrega de Elementos de Protección Personal (EPP) y dotación.
- ✔ **Anexo 5.** Charlas de seguridad-Socializaciones
- ✔ **Anexo 6** Análisis de Trabajo seguro
- ✔ **Anexo 7** Inspecciones de seguridad
- ✔ **Anexo 8** Aprobación del Plan de Manejo de Tráfico - PMT.
- ✔ **Anexo 9** Registro de pausas activas.

Elaboró:



SANDRA MILENA HERNÁNDEZ ESGUERRA
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Resolución: 25-01029 Exp. por la Gobernación de Cundinamarc

ANEXO 1.
PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Nota: Este documento ya se encuentra impreso y adjunto en el numeral 15 de la lista de chequeo del Contrato de Obra de ASOSUPRO, correspondiente al Informe Mensual No. 02, para el período comprendido entre el 1 y el 31 de julio. Por lo anterior, no se adjunta nuevamente, con el fin de evitar duplicidad documental. Únicamente se anexa la documentación correspondiente a la afiliación del personal de obra.

ARL | sura

Medellín, 27 de Julio de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de ENERGIA INTEGRAL ANDINA SA, en el centro de trabajo 0000000392 - ASOSUPRO TOBERIN R5, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1074486092	MANRIQUE GOMEZ ALBERTO	27/07/2026		236R2212	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10100007072620861880

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 27/07/2026 17:11:19 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.154.194.109, 192.230.104.6, 172.16.42.57

Protección

Una empresa sura

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **MANRIQUE GOMEZ ALBERTO** identificado(a) con **CC** número **1.074.486.092** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 23 de marzo de 2023 y sus recursos se encuentran distribuidos como se enuncia a continuación, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 2373 de 2010 así:

1. El 100% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO

Esta constancia se expide a petición del(la) interesado(a) el día 28 de julio de 2026.

Cordialmente,

Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Asesor Virtual Pronto en nuestro Portal Web www.proteccion.com y App o comunicarse con la Línea de Servicio en:
Bogotá **(601) 482 33 64** – Medellín **(604) 510 90 99** – Cali **(602) 386 00 80 -**
Barranquilla **(605) 319 79 99** – Cartagena **(605) 642 49 99** – WhatsApp **+57 310 220 5575**
o llámanos desde tu computador desde cualquier lugar del mundo ingresando a **https://customer0001.wolkvox.com/proteccion/index.php**

ComfaCasanare
Construimos Sueños !!!

Marque con una equis (x) y verifique instrucciones de diligenciamiento y causales de no aceptación al reverso

☐ Inscripción del trabajador ☐ Modificación
☐ Traslado
☐ Reintegro en el mismo mes SI ☐ NO ☐
Indique última fecha de retiro: AÑO MM DD

CO09/2884

Formato de Inscripción, de Trabajadores

FAPP006

1. DATOS DEL TRABAJADOR

Tipo y número de identificación	Fecha de expedicion	Sexo
CEDULA: 1074486092	2022-11-18	MASCULINO

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
MANRIQUE	GOMEZ	ALBERTO	

Fecha de nacimiento	Telefono	Dirección de residencia	Barrio
2004-11-08	3102650933	CARRERA 12 # 3-12	

Correo Electronico: asis.talentohumano@eiasa.com.co

Estado civil: SOLTERO

Ciudad	Fecha de ingreso a la empresa	Horas labor mes	Cargo	Sueldo Básico
YOPAL	2026-07-27	210	ayudante de obra	1750905

Tipo de contrato: FIJO | Administra recursos públicos: ☐ | Servidor público: ☐ | Nivel de escolaridad: BASICA

Profesión: CONSTRUCCION Y OBRAS CIV | Ocupacion: AUXILIARES DE MAESTROS

Orientacion sexual: NO DISPONIBLE | Vivienda: ARRENDADA

Factor de vulnerabilidad: NO APLICA | Pertenencia etnica: NO DISPONIBLE

2. DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	Telefono
ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.	

NIT, CC O CE	DEPENDENCIA
860533206	

3. DATOS DEL CÓNYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE

Tipo y número de identificación	Fecha de expedicion	Sexo

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Fecha de nacimiento	EMPRESA DONDE TRABAJA O ACTIVIDAD ECONOMICA

Caja de compensación a las cual está afiliado(a)	Sueldo básico

Solicitud de Datos Personales

Yo, ALBERTO MANRIQUE , Identificado con cédula de ciudadanía No. 1074486092,manifiesto así de manera expresa, que AUTORIZO para el uso y tratamiento de mis datos personales en virtud de la función que le compete el tratamiento de los que fueron recolectados para las finalidades, así como para el envío de mensajes de correos de texto (SMS); de igual forma autorizó de manera irrevocable a la Caja a corroborar con cualquier persona, institución y autoridad, la información relativa a mis referencias personales, comerciales, fiscales, judiciales, financieras y cualquier otro dato que a juicio de la organización sea pertinentes para verificar y ampliar información por mi suministrada de acuerdo al manual de políticas y protección de datos establecido por la Caja de Compensación Familiar del Casanare COMFACASANARE de acuerdo a lo establecido en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013

FIRMA

Declaro bajo la gravedad de juramento que todos los datos son exactos y examinados por quien firma.

Firma del trabajador(a)
C.C. T.I. R.C o C.E. No 1074486092

Firma y sello del empleador

OBSERVACIONES: FORMULARIO SIN BENEFICIARIOS

ComfaCasanare

Radicado: 2026-07-28-nZYWmVuC-afi
Fecha: 2026-07-28
Hora: 09:23:32
Destino: Afiliaciones
Empresa: ENERGIA INTEGRAL ANDINA SA

La información de este formato está sujeta a verificacion

Utilice este formato exclusivamente para afiliación de trabajadores solteros, casados o en unión libre sin beneficiarios.

Recuerde que es deber de la empresa y el trabajador actualizar la información del grupo familiar.
Al respaldo encontrará recomendaciones, instructivo y causales de no aceptación.
Consulte los requisitos para adicionar beneficiarios, realizar inscripciones para servicios y subsidio de su grupo familiar.
Si no ha recibido su tarjeta familiar, presente la copia de este formato para utilizar los servicios del CARNET.

CEDULA DE CIUDADANIA

REPUBLICA DE COLOMBIA



NUIP 1.074.486.092

MANRIQUE GOMEZ

ALBERTO

COL 17 M

08 NOV 2004 O+

NARIÑO (CUNDINAMARCA)

19 NOV 2022, GIRARDOT

19 NOV 2032

008864815

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL008864815015109<<<<<<<<<<<
0411088M3211197COL1074486092<7
MANRIQUE<GOMEZ<<ALBERTO<<<<<<<<

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

No de Radicacion	Fecha de Radicación
4017185941	2|8|0|7|2|0|2|6

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo)

1.tipo de tramite	2.Tipo afiliacion	3.Regimen	4.Contribución Solidaria
A. Afiliación ☐ B.Reporte de Novedades ☒	B. Colectiva ☐ C. Institucional ☐ A. Individual: -Cotizante Cabeza de familia ☒ -Beneficiario afiliado adicional ☐ D. De oficio ☐	A.Contributivo ☒ B.Subsidiado ☐	Si ☐ No ☒

5. Tipo de afiliado	6. Tipo de cotizante	7.Codigo (a registrar por la EPS)
A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐ D. Afiliado adicional ☐	A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐	1

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante , cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional)

8.Apellidos y nombres			
Primer apellido: MANRIQUE	Segundo apellido: GOMEZ	Primer nombre: ALBERTO	Segundo nombre:

9.Tipo documento de Identidad	10.Número del documento de identidad	11.Sexo biológico	12.Sexo identificación
CC	1074486092	Femenino ☐ Masculino ☒	F ☐ M ☒ T ☐ NB ☐ Otro ☐ Cual

13. Nacionalidad	14.Lugar Nacimiento			15.Fecha Nacimiento
	Pais: COLOMBIA	Departamento:	Municipio:	0|8|1|1|2|0|0|4
COLOMBIA				

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

16.Etnia	17.Comunidad	18.Discapacidad	SI ☐	NO ☒
6		Categoria Discapacidad		

19.Tiene encuesta SISBEN	20.Clasificación SISBEN		21.Grupo población especial
SI ☐ NO ☒	Nivel	Grupo	

22. Administradora de riesgos Laborales - ARL	23. Administradora de Pensiones	24. Ingreso base de cotizacion - IBC	25. Tarifa Contribución Solidaria
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A.		1750905	

26.Residencia

Dirección	Telefono fijo	Telefono celular	Correo electronico
FCA SANTA RITA KM 3	2658	3226964742	MANRIQUEGOMEZ2317@GMAIL.COM

Departamento	Municipio/Distrito	Localidad / comuna	zona
CUNDINAMARCA	GIRARDOT		Urbana cabecera municipal ☐ Rural dispersa ☐ Urbana centro poblado ☐ Resto rural ☐

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

27. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

28. Tipo documento de Identidad	29. Número documento identidad	30. Sexo biológico	31. Sexo Identificación
		Femenino ☐ Masculino ☐	F ☐ M ☐ T ☐ NB ☐ Otro ☐ Cual

32. Nacionalidad	33.Lugar Nacimiento			34.Fecha Nacimiento
	Pais:	Departamento:	Municipio:	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

35. Apellidos y nombres				
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	36. Tipo documento de Identidad	37. Número de identidad	38. Nacionalidad	39.Sexo Biológico		40.Sexo Identificación						41.Lugar Nacimiento			42.Fecha de nacimiento
				Femenino	Masculino	F	M	T	NB	otro	cual	Pais	Departamento	Municipio	
B1															
B2															
B3															
B4															
B5															

Datos complementarios del Beneficiario

	43.Parentesco	44.Etnia	45.Comunidad	46.Grupo poblacional especial	47.Encuesta SISBEN		48.Clasificación SISBEN		49.Discapacidad			50.Incapacidad Permanente	
					SI	No	Nivel	Grupo	SI	No	Categoria	SI	No
B1													
B2													
B3													
B4													
B5													

	51. Datos de residencia								
	Departamento	Municipio/Distrito	Zona				Teléfono Fijo y/o celular	52.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
			Cabecera municipal	Centro poblado	Rural dispersa	Resto rural		
B1								
B2								
B3								
B4								
B5								

	Dirección	Localidad/Comuna	Correo Electrónico
B1			
B2			
B3			
B4			
B5			

Seleccion de la IPS Primaria

	53. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS	54.Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
C	VS GRANADA - VS GRANADA	vsgranada - vsgranada
B	-	-
B	-	-
B	-	-

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL APORTANTE, DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA O RESPONSABLES DE PAGO

55. Nombre o razón social	56. Tipo de identificación	57. Numero de documento de identificación	58. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS)
ENERGIA INTEGRAL ANDINA S A QUE PODRA ABREVIARSE E	NIT	860533206	

59.Ubicación				
Dirección: CL 19 B 166 73	Teléfono fijo o celular: 4037300	Correo electrónico: TALENTOHUMANO.MED@ENERGIAINTEGRALANDINA.COM	Departamento: BOGOTA	Municipio/distrito: BOGOTA

No de Radicacion
4017185941

B. REPORTE DE NOVEDADES

60. Tipo de Novedad

- [X] 1. Modificación datos básicos de identificación
- [ ] 2. Corrección datos básicos de identificación
- [ ] 3. Actualización documento de identidad
- [ ] 4. Actualización y/o corrección datos complementarios
- [ ] 5. Terminación de la inscripcion en la EPS. Código:
- [ ] 6. Reporte de pago a través de un tercero; Código:
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [X] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- [ ] 10. Terminación de la relacion laboral o perdida de las condiciones para seguir cotizando
- [ ] 11. Inscripción EPS retorno al país.
- [X] 12. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 14. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 15.Traslado: [ ] A. Mismo régimen [ ] B. Diferente régimen
- [ ] 16. Reporte de fallecimiento del cotizante o cabeza de familia
- [ ] 17.Reporte del tramite de protección al cesante
- [ ] 18. Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- [ ] 19. Reporte de la calidad del pensionado
- [ ] 20. Ingreso a contribución solidaria
- [ ] 21. Retiro de contribución solidaria

VI. DATOS ACTUALIZADOS SEGÚN REPORTE DE LA NOVEDAD

61. Datos básicos de la identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	62. Sexo biológico	63.Sexo identificación	64.Fecha de nacimiento
		Femenino [ ] Masculino [ ]	F [ ] M [ ] T [ ] NB [ ] Otro [ ] Cual	

65.EPS anterior	66.Fecha de Novedad	67.Motivo de traslado Código:	68.Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones
	2|7|0|7|2|0|2|6		

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- 69. [ ] Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- 70. [ ] Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributvo,Especial o de Excepción.
- 71. [ ] Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- 72. [ ] Declaración de no internación del cotizante,cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .
- 73. [ ] Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clinica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- 74. [ ] Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que poir sus funciones la requieran
- 75. [ ] Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decr eto 1377 de 2013
- 76. [ ] Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o celular como mensaje de texto
- 77. [ ] Aceptación de las condiciones para vincularse a la Contribución Solidaria y de realizar los pagos correspondientes
- 78. [ ] Aceptación de la actualización del grupo familiar y las tarifas en Contribución Solidaria, según encuesta del Sisbén vigente

VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

79. En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que se hará cargo del pago de la Contribución Solidaria

Apellidos y nombres

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad

IX. FIRMAS

80. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	81. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio

X.ANEXOS

- 82. [ ] Anexo Copia del documento de identidad: CN [ ] RC. [ ] TI. [ ] CC. [ ] PA. [ ] CE. [ ] CD. [ ] SC. [ ] PT. [ ]

  Cantidad: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Total: [0]

- 83. [ ] Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- 84. [ ] Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la union marital.
- 85. [ ] Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la union marital.
- 86. [ ] Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- 87. [ ] Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- 88. [ ] Documento en que conste la perdida de la patria potestad, o el certificaco de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- 89. [ ] Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- 90. [ ] Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- 91. [ ] Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

XI. DATOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y/O INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

92. Identificación de la Entidad Territorial Código del municipio	Código del Departamento	93. Nombre de la Institución

XII. DATOS DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL O DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

94. Apellidos y Nombres

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	95.Firma del funcionario

96. Fecha de Radicación	97. Fecha de Validación	

Observaciones

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, asi como la veracidad de las demás información registrada.

Famisanar EPS
NIT 830.003.564-7

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

9013035218
9013035218

Número Radicación RAT: 30867472

Fecha de Radicación: 06 | 08 | A | 2026 | A

1. DATOS DEL TRÁMITE — Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

1. Tipo de trámite	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen	4. Contribución solidaria	5. Tipo de afiliado	6. Tipo de cotizante	7. Código (lo asigna la EPS)
A. Afiliación [ ] B. Reporte de Novedades [X]	A. Individual: - Cotizante o cabeza de familia [X] - Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectivo [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]	A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]	SI [ ] NO [ ]	A. Cotizante [X] C. Beneficiario [ ] B. Cabeza de familia [ ] D. Afiliado adicional [ ]	A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]	

A. AFILIACIÓN **II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACION** (del cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional)

8. Apellidos y nombres			
TORRES Primer Apellido	SANABRIA Segundo Apellido	CRISTIAN Primer Nombre	DAVID Segundo Nombre

9. Tipo de documento de identidad	10. Número del documento de identidad	11. Sexo biológico	12. Sexo identificación	13. Nacionalidad
CC	1069584455	Femenino [ ] Masculino [X]	F [ ] M [ ] ND [ ] Otro [ ] Cual [ ]	

14. Lugar de nacimiento	País	Departamento	Municipio	15. Fecha de nacimiento
				06 | 01 | M | A | 1994 | A | A

III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

16. Etnia	17. Comunidad	18. Discapacidad / Categoría discapacidad	19. Tiene encuesta SISBEN	20. Clasificación SISBEN	21. Grupo de población especial
		SI [ ] NO [X]	SI [ ] NO [ ]	Nivel [ ] Grupo [ ]	

22. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	23. Administradora de Pensiones	24. Ingreso base de cotización - IBC	25. Tarifa contribución solidaria
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.		$1.750.905	

26. Residencia			
Dirección	Teléfono fijo	Teléfono celular	Correo electrónico
Departamento	Municipio / Distrito	Localidad / Comuna	Cabecera Municipal [ ] Rural Disperso [ ] Centro Poblado [ ] Resto Rural [ ] Zona

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR - Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero (a) permanente del cotizante

27. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

28. Tipo de documento de identidad	29. Número del documento de identidad	30. Sexo biológico	31. Sexo identificación	32. Nacionalidad
		Femenino [ ] Masculino [ ]	F [ ] M [ ] ND [ ] Otro [ ] Cual [ ]	

33. Lugar de nacimiento	País	Departamento	Municipio	34. Fecha de nacimiento
				D | D | M | M | A | A | A | A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

36. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B1			
B2			
B3			
B4			
B5			

	35. Tipo de documento de identidad	37. Número del documento de identidad	38. Nacionalidad	39. Sexo biológico (Femenino / Masculino)	40. Sexo identificación (F / M / ND / Otro / Cual)	41. Lugar de nacimiento (País / Departamento / Municipio)	42. Fecha de nacimiento
B1							D D M M A A A A
B2							D D M M A A A A
B3							D D M M A A A A
B4							D D M M A A A A
B5							D D M M A A A A

Datos complementarios del beneficiario

	43. Parentesco	44. Etnia	45. Comunidad	46. Grupo de población especial	47. Tiene encuesta SISBEN (SI / NO)	48. Clasificación SISBEN (NIVEL / GRUPO)	49. Discapacidad (SI / NO / CATEGORÍA DISCAPACIDAD)	50. Incapacidad permanente (SI / NO)
B1								
B2								
B3								
B4								
B5								

51. Datos de residencia

	Departamento	Municipio / Distrito	Zona	Cabecera Municipal	Rural Disperso	Centro Poblado	Resto Rural	Teléfono fijo y/o celular	52. Valor de la UPC del afiliado adicional (lo registra por la EPS)
B1									
B2									
B3									
B4									
B5									

	Dirección	Localidad / Comuna	Correo electrónico
B1			
B2			
B3			
B4			
B5			

53. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS

54. Código de la IPS (a registrar por la EPS)

C
01
02
03
04
05

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL APORTANTE, DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA O RESPONSABLES DEL PAGO

55. Nombre o razón social	56. Tipo de documento de identificación	57. Número del documento de identificación	58. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
ENERGIA INTEGRAL ANDINA SA	NT	860533206	

59. Ubicación				
AV CIRCUNVALAR KM 6 VIA EL	31068042 Teléfono	Correo electrónico	SAN ANDRES Municipio / Distrito	SAN ANDRES Departamento

B. REPORTE DE NOVEDADES

60. Tipo de Novedad 1. Modificación de datos básicos de identificación [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación [ ] 3. Actualización del documento de identidad [ ]
4. Actualización y corrección de datos complementarios [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS Código [ ] 6. Reporte de pago a través de un tercero Código [ ]
7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar [X]
10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando [ ] 11. Inscripción EPS retorno al país [ ] 12. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 13. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 14. Movilidad: A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado [ ]
15. Traslado: A Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen [ ] 16. Reporte de fallecimiento del Cotizante o Cabeza de familia [ ] 17. Reporte del tramite de protección al cesante [ ]
18. Reporte de la calidad de Pre pensionado [ ] 19. Reporte de la calidad de Pensionado [ ] 20. Ingreso a Contribución Solidaria [ ] 21. Retiro de Contribución Solidaria [ ]

VI. DATOS ACTUALIZADOS SEGÚN REPORTE DE LA NOVEDAD

61. Datos básicos de identificación			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	62. Sexo biológico	63. Sexo identificación	64. Fecha de nacimiento
		Femenino [ ] Masculino [ ]	1 [ ] NB [ ] Otro [ ] Cual	D D M M A A A A

65. EPS anterior	66. Fecha de novedad	67. Motivo de traslado	68. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones
	D 05 M 08 A 2026 A	Código [ ]	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 69. Declaraciones de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 70. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 71. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [ ] 72. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [ ] 73. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [ ] 74. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [ ] 75. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [ ] 76. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.
- [ ] 77. Aceptación de las condiciones para vincularse a la Contribución Solidaria y de realizar los pagos correspondientes.
- [ ] 78. Aceptación de la actualización del grupo familiar y las tarifas en Contribución Solidaria, según la encuesta del Sisben vigente.

VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

79. En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que se hará cargo del pago de la Contribución Solidaria

Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad

IX. FIRMAS

Cristian Torres

86. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional

Melissa Rojo

91. Aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio

X. ANEXOS

82. Anexo copia del documento de identidad

	CN	RC	TI	CC	PA	CE	CD	SC
Cantidad:								

TOTAL ANEXOS [ ]

83. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
84. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital
85. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
86. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
87. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
88. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres
89. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud numeral 4 y 5 del artículo 2.1.7.3 del Decreto 780 de 2016.
90. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
91. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

XI. DATOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y/O INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

92. Identificación de la Entidad Territorial		93. Nombre de la Institución
Código del municipio [ ]	Código del departamento [ ]	

XII. DATOS DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL O DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

94. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	95. Firma del funcionario

96. Fecha de radicación	97. Fecha de validación	OBSERVACIONES:
D D M M A A A A	D D M M A A A A	CARGO: AYUDANTE DE OBRA

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

Cambio Empleo

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

CRISTIAN DAVID TORRES SANABRIA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.069.584.455**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 5 de Agosto del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

ARL | sura

Medellín, 04 de August de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A E I A S.A.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000392 ASOSUPRO TOBERIN R5		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1069584455	TORRES SANABRIA CRISTIAN DAVID	05/08/2026		25333130	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 04/08/2026 17:21:24 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.154.194.109, 192.230.104.6, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ARL | sura

Medellín, 25 de July de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A E I A S.A.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000392 ASOSUPRO TOBERIN R5		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1071062177	AMORTEGUI RODRIGUEZ EDWAR SANTIAGO	27/07/2026		921gv221	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 25/07/2026 21:47:19 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.84.89.164, 198.143.52.11, 172.16.42.57

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 27/07/2026, el empleador ENERGIA INTEGRAL ANDINA S A identificado con NIT número 860533206 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
10584135	27/07/2026	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1071062177	EDWARSANTIAGO AMORTEGUI RODRIGUEZ	1750905	AYUDANTE DE OBRA	2026-07-27

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 27 días del mes de Julio del año 2026.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

EDWAR SANTIAGO AMORTEGUI RODRIGUEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.071.062.177**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 27 de Julio del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

ComfaCasanare
Construimos Sueños !!!

Marque con una equis (x) y verifique instrucciones de diligenciamiento y causales de no aceptación al reverso

☐ Inscripción del trabajador ☐ Modificación
☐ Traslado
☐ Reintegro en el mismo mes Si☐ NO☐
Indique última fecha de retiro: AÑO MM DD

SGS CO09/2884

Formato de Inscripción, de Trabajadores

FAPP006

1. DATOS DEL TRABAJADOR

Tipo y número de identificación	Fecha de expedicion	Sexo
CEDULA: 1071062177	2022-05-18	MASCULINO

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
AMORTEGUI	RODRIGUEZ	EDWAR	SANTIAGO

Fecha de nacimiento	Telefono	Dirección de residencia	Barrio
2004-05-04	3102650933	CARRERA 5# 13-22	

Correo Electronico: ASIS.TALENTOHUMANO@EIASA.COM.CO

Estado civil: SOLTERO

Ciudad	Fecha de ingreso a la empresa	Horas labor mes	Cargo	Sueldo Básico
YOPAL	2026-07-27	210	AYUDANTE DE OBR	1750905

Tipo de contrato: FIJO | Administra recursos públicos ☐ | Servidor público ☐ | Nivel de escolaridad: BASICA

Profesión: CONSTRUCCION Y OBRAS CIV | Ocupacion: AUXILIARES DE MAESTROS

Orientacion sexual: HETEROSEXUAL | Vivienda: ARRENDADA

Factor de vulnerabilidad: NO APLICA | Pertenencia etnica: NO DISPONIBLE

2. DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	Telefono
ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.	

NIT, CC O CE	DEPENDENCIA
860533206	

3. DATOS DEL CÓNYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE

Tipo y número de identificación	Fecha de expedicion	Sexo

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Fecha de nacimiento	EMPRESA DONDE TRABAJA O ACTIVIDAD ECONOMICA

Caja de compensación a las cual está afiliado(a)	Sueldo básico

Solicitud de Datos Personales

Yo, EDWAR SANTIAGO AMORTEGUI SANTIAGO, Identificado con cédula de ciudadanía No. 1071062177,manifiesto así de manera expresa, que AUTORIZO para el uso y tratamiento de mis datos personales en virtud de la función que le compete el tratamiento de los que fueron recolectados para las finalidades, así como para el envío de mensajes de correos de texto (SMS); de igual forma autorizó de manera irrevocable a la Caja a corroborar con cualquier persona, institución y autoridad, la información relativa a mis referencias personales, comerciales, fiscales, judiciales, financieras y cualquier otro dato que a juicio de la organización sea pertinentes para verificar y ampliar información por mi suministrada de acuerdo al manual de políticas y protección de datos establecido por la Caja de Compensación Familiar del Casanare COMFACASANARE de acuerdo a lo establecido en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013

FIRMA

Declaro bajo la gravedad de juramento que todos los datos son exactos y examinados por quien firma.

Firma del trabajador(a)
C.C. T.I. R.C o C.E. No 1071062177

Firma y sello del empleador

OBSERVACIONES: FORMULARIO SIN BENEFICIARIOS

ComfaCasanare

Radicado: 2026-07-27-HizUFt26i-afi
Fecha: 2026-07-27
Hora: 16:42:16
Destino: Afiliaciones
Empresa: ENERGIA INTEGRAL ANDINA SA

La información de este formato está sujeta a verificación

Utilice este formato exclusivamente para afiliación de trabajadores solteros, casados o en unión libre sin beneficiarios.

Recuerde que es deber de la empresa y el trabajador actualizar la información del grupo familiar.
Al respaldo encontrará recomendaciones, instructivo y causales de no aceptación.
Consulte los requisitos para adicionar beneficiarios, realizar inscripciones para servicios y subsidio de su grupo familiar.
Si no ha recibido su tarjeta familiar, presente la copia de este formato para utilizar los servicios del CARNET.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.071.062.177
AMORTEGUI RODRIGUEZ

APELLIDOS
EDWAR SANTIAGO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-MAY-2004
GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.76
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

18-MAY-2022 GIRARDOT
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-1510900-01300279-M-1071062177-20220603 0079568545A 1 8504787010

ComfaCasanare
Construimos Sueños !!!

Marque con una equis (x) y verifique instrucciones de diligenciamiento y causales de no aceptación al reverso

☐ Inscripción del trabajador ☐ Modificación
☐ Traslado
☐ Reintegro en el mismo mes SI☐ NO☐
Indique última fecha de retiro: AÑO MM DD

CO09/2884

Formato de Inscripción, de Trabajadores

FAPP006

1. DATOS DEL TRABAJADOR

Tipo y número de identificación: CEDULA: 1070613623	Fecha de expedicion: 2012-07-06	Sexo: MASCULINO	
Primer Apellido: AMORTEGUI	Segundo Apellido: SANCHEZ	Primer Nombre: FELIX	Segundo Nombre:
Fecha de nacimiento: 1988-06-30	Telefono: 3102650933	Dirección de residencia: CARRERA 9 # 3-30	Barrio:
Correo Electronico: ASIS.TALENTOHUMANO@EIASA.COM.CO			
Estado civil: SOLTERO			

Ciudad	Fecha de ingreso a la empresa	Horas labor mes	Cargo	Sueldo Básico
YOPAL	2026-07-27	210	AYUDANTE DE OBR	1750905

Tipo de contrato	FIJO	Administra recursos públicos ☐	Servidor público ☐	Nivel de escolaridad	BASICA
Profesión	CONSTRUCCION Y OBRAS CIV	Ocupacion	AUXILIARES DE MAESTROS		
Orientacion sexual	HETEROSEXUAL	Vivienda	ARRENDADA		
Factor de vulnerabilidad	NO APLICA	Pertenencia etnica	NO DISPONIBLE		

2. DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	Telefono
ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.	

NIT, CC O CE	DEPENDENCIA
860533206	

3. DATOS DEL CÓNYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE

Tipo y número de identificación	Fecha de expedicion	Sexo	
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
Fecha de nacimiento	EMPRESA DONDE TRABAJA O ACTIVIDAD ECONOMICA		
Caja de compensación a las cual está afiliado(a)	Sueldo básico		

Solicitud de Datos Personales

Yo, FELIX AMORTEGUI , Identificado con cédula de ciudadanía No. 1070613623,manifiesto así de manera expresa, que AUTORIZO para el uso y tratamiento de mis datos personales en virtud de la función que le compete el tratamiento de los que fueron recolectados para las finalidades, así como para el envío de mensajes de correos de texto (SMS); de igual forma autorizó de manera irrevocable a la Caja a corroborar con cualquier persona, institución y autoridad, la información relativa a mis referencias personales, comerciales, fiscales, judiciales, financieras y cualquier otro dato que a juicio de la organización sea pertinentes para verificar y ampliar información por mi suministrada de acuerdo al manual de políticas y protección de datos establecido por la Caja de Compensación Familiar del Casanare COMFACASANARE de acuerdo a lo establecido en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013

FIRMA

Declaro bajo la gravedad de juramento que todos los datos son exactos y examinados por quien firma.

Firma del trabajador(a)
C.C. T.I. R.C o C.E. No 1070613623

Firma y sello del empleador

OBSERVACIONES: FORMULARIO SIN BENEFICIARIOS

ComfaCasanare

Radicado: 2026-07-27-49kM6aBiy-afi
Fecha: 2026-07-27
Hora: 16:37:15
Destino: Afiliaciones
Empresa: ENERGIA INTEGRAL ANDINA S A

La información de este formato está sujeta a verificacion

Utilice este formato exclusivamente para afiliación de trabajadores solteros, casados o en unión libre sin beneficiarios.

Recuerde que es deber de la empresa y el trabajador actualizar la información del grupo familiar.

Al respaldo encontrará recomendaciones, instructivo y causales de no aceptación.

Consulte los requisitos para adicionar beneficiarios, realizar inscripciones para servicios y subsidio de su grupo familiar.

- Si no ha recibido su tarjeta familiar, presente la copia de este formato para utilizar los servicios del CARNET.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.070.613.623
AMORTEGUI SANCHEZ

APELLIDOS
FELIX

NOMBRES

Felix.AmoRTEGUI.S

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 30-JUN-1988
GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

06-JUL-2012 GIRARDOT
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

P-1510900-00390490-M-1070613623-20120731 0030665413A 1 37884323

ARL | sura

Medellín, 25 de July de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A E I A S.A.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000392 ASOSUPRO TOBERIN R5		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1070613623	AMORTEGUI SANCHEZ FELIX	27/07/2026		34248X19	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 25/07/2026 22:07:15 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.84.89.164, 198.143.52.11, 172.16.42.57

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

FELIX AMORTEGUI SANCHEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.070.613.623**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 27 de Julio del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

EPS Sanitas
Nuestro compromiso es contigo

Bogota 29.07.2026

Señores,
ENERGIAINTEGRAL ANDINA S A - NI 860533206
Ciudad

Asunto : CERTIFICADO DE RADICACION

Respetados Señores :

Por medio del presente nos permitimos CERTIFICAR el recibido de 1 usuarios enviados para tramite de novedad web radicadas el 2026-07-28 con numero de radicado 8319351 :

Cordialmente,

Gestión de la Afiliación - Operaciones - EPS Sanitas

NUMERO DE RADICADO : 8319351

EPS Sanitas

Nuestro compromiso es contigo

Bogotá, 27 de Julio de 2026

Señores

EPS Sanitas

Ciudad

Referencia: Solicitud Radiación Novedades Masivas

Respetados,

Por medio de la presente solicitamos realizar trámite de novedad a cargo del empleador identificado como NIT 860533206 – Energía Integral Andina para las personas que se detallan a continuación.

N	Tipo Doc. Empleado	No. Doc. Empleado	Nombre Empleado	IBC	Fecha Ingreso Empresa	Fecha Retiro Si Aplica **	Dirección Residencia	Municipio / Departamento	# Celular	Correo electrónico
1	C.C	1.070.613.623	FELIX AMOETEGUI SANCHEZ	1750905	27/07/2026		CARRERA 11 # 3-26	YOPAL	3102650933	asis.talantohumano@elasa.com.co

** La fecha de retiro aplica solamente para los casos en los cuales aún el usuario se encuentra activo en el sistema bajo el mismo empleador

Cordialmente

Melissa R

Leydi Melissa Restrepo G.
Asistente de Talento Humano

Gestión de la Afiliación - Operaciones - EPS Sanitas

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

LUIS ALFREDO BARRIOS RIVERA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.070.600.122**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir.**

La presente certificación se expide el 28 de Julio del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

ComfaCasanare
Construimos Sueños !!!

Marque con una equis (x) y verifique Instrucciones de diligenciamiento y causales de no aceptación al reverso

☐ Inscripción del trabajador ☐ Modificación
☐ Traslado
☐ Reintegro en el mismo mes Si☐ NO☐
Indique última fecha de retiro: AÑO MM DD

SGS CO09/2884

Formato de Inscripción, de Trabajadores

FAPP006

1. DATOS DEL TRABAJADOR

Tipo y número de identificación	Fecha de expedicion	Sexo
CEDULA: 1070600122	2003-03-31	MASCULINO

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
BARRIOS	RIVERA	LUIS	ALFREDO

Fecha de nacimiento	Telefono	Dirección de residencia	Barrio
1990-03-28	3102650933	CARRERA 12 # 3-26	

Correo Electronico: ASIS.TALENTOHUMANO@EIASA.COM.CO

Estado civil: SOLTERO

Ciudad	Fecha de ingreso a la empresa	Horas labor mes	Cargo	Sueldo Básico
YOPAL	2026-07-27	210	AYUDANTE DE OBR	1750905

Tipo de contrato: FIJO — Administra recursos públicos ☐ — Servidor público ☐ — Nivel de escolaridad: BASICA

Profesión: CONSTRUCCION Y OBRAS CIV — Ocupacion: AUXILIARES DE MAESTROS

Orientacion sexual: NO DISPONIBLE — Vivienda: ARRENDADA

Factor de vulnerabilidad: NO APLICA — Pertenencia etnica: NO DISPONIBLE

2. DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	Telefono
ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.	

NIT, CC O CE	DEPENDENCIA
860533206	

3. DATOS DEL CÓNYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE

Tipo y número de identificación	Fecha de expedicion	Sexo

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Fecha de nacimiento	EMPRESA DONDE TRABAJA O ACTIVIDAD ECONOMICA

Caja de compensación a las cual está afiliado(a)	Sueldo básico

Datos Personales de Solicitud

Yo, LUIS ALFREDO BARRIOS ALFREDO, Identificado con cédula de ciudadanía No. 1070600122,manifiesto así de manera expresa, que AUTORIZO para el uso y tratamiento de mis datos personales en virtud de la función que le compete el tratamiento de los que fueron recolectados para las finalidades, así como para el envío de mensajes de correos de texto (SMS); de igual forma autorizó de manera irrevocable a la Caja a corroborar con cualquier persona, institución y autoridad, la información relativa a mis referencias personales, comerciales, fiscales, judiciales, financieras y cualquier otro dato que a juicio de la organización sea pertinentes para verificar y ampliar información por mi suministrada de acuerdo al manual de políticas y protección de datos establecido por la Caja de Compensación Familiar del Casanare COMFACASANARE de acuerdo a lo establecido en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013

FIRMA

Declaro bajo la gravedad de juramento que todos los datos son exactos y examinados por quien firma.

Firma del trabajador(a)
C.C. T.I. R.C o C.E. No 1070600122

Firma y sello del empleador

OBSERVACIONES: FORMULARIO SIN BENEFICIARIOS

ComfaCasanare

Radicado: 2026-07-28-ZJKMVvWcn-afi
Fecha: 2026-07-28
Hora: 09:28:52
Destino: Afiliaciones
Empresa: ENERGIA INTEGRAL ANDINA SA

La información de este formato está sujeta a verificación

Utilice este formato exclusivamente para afiliación de trabajadores solteros, casados o en unión libre sin beneficiarios.

Recuerde que es deber de la empresa y el trabajador actualizar la información del grupo familiar.
Al respaldo encontrará recomendaciones, instructivo y causales de no aceptación.
Consulte los requisitos para adicionar beneficiarios, realizar inscripciones para servicios y subsidio de su grupo familiar.
Si no ha recibido su tarjeta familiar, presente la copia de este formato para utilizar los servicios del CARNET.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.070.600.122
BARRIOS RIVERA

APELLIDOS
LUIS ALFREDO

NOMBRES
ALFREDO BARRIOS

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-MAR-1990
GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

31-MAR-2008 GIRARDOT
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1510900-00079661-M-1070600122-20080926 0003766980A 1 25958558

ARL | sura

Medellín, 27 de Julio de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de ENERGIA INTEGRAL ANDINA SA, en el centro de trabajo 0000000392 - ASOSUPRO TOBERIN R5, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1070600122	BARRIOS RIVERA LUIS ALFREDO	27/07/2026		122047h2	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10100007072620862030

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 27/07/2026 17:13:50 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.154.194.109, 192.230.104.6, 172.16.42.57

Famisanar EPS
NIT 830.003.564-7

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

9013028862

No. de Radicación SAT: 30856641

Fecha de Radicación: 04 | 08 | 2026

1. DATOS DEL TRAMITE

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

1. Tipo de trámite	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen	4. Contribución solidaria	5. Tipo de afiliado	6. Tipo de cotizante	7. Código (a registrar por la EPS)
A. Afiliación [ ] B. Reporte de Novedades [X]	A. Individual: - Cotizante o cabeza de familia [X] B. Colectiva [ ] - Beneficiario o afiliado adicional [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]	A. Contributivo [ ] B. Subsidiado [X]	SI [ ] NO [ ]	A. Cotizante [X] C. Beneficiario [ ] B. Cabeza de familia [ ] D. Afiliado adicional [ ]	A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]	

A. AFILIACIÓN II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional)

8. Apellidos y nombres			
BARRIOS Primer Apellido	RIVERA Segundo Apellido	LUIS Primer Nombre	ALFREDO Segundo Nombre

9. Tipo de documento de identidad	10. Número del documento de identidad	11. Sexo biológico	12. Sexo identificación	13. Nacionalidad
CC	1070600122	Femenino [ ] Masculino [X]	Femenino [ ] Masculino [ ] T [ ] NB [ ] Otro [ ] Cual	

14. Lugar de nacimiento País	Departamento	Municipio	15. Fecha de nacimiento
			28 | D | 03 | M | A 1990 | A | A

III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

16. Etnia	17. Comunidad	18. Discapacidad (Categoría discapacidad)	19. Tiene encuesta SISBÉN	20. Clasificación SISBÉN	21. Grupo de población especial
		SI [ ] NO [X]	SI [ ] NO [ ]	Nivel [ ] Grupo [ ]	

22. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	23. Administradora de Pensiones	24. Ingreso base de cotización - IBC	25. Tarifa contribución solidaria
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.		$1.750.905	

26. Residencia Dirección	Teléfono fijo	Teléfono celular	Correo electrónico

Departamento	Municipio / Distrito	Localidad / Comuna	Zona
			Cabecera Municipal [ ] Rural Disperso [ ] Centro Poblado [ ] Resto Rural [ ]

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR - Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero (a) permanente del cotizante

27. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

28. Tipo de documento de identidad	29. Número del documento de identidad	30. Sexo biológico	31. Sexo identificación	32. Nacionalidad
		Femenino [ ] Masculino [ ]	Femenino [ ] Masculino [ ] T [ ] NB [ ] Otro [ ] Cual	

33. Lugar de nacimiento País	Departamento	Municipio	34. Fecha de nacimiento
			D | D | M | M | A | A | A | A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

35. Apellidos y nombres			
	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	36. Tipo de documento de identidad	37. Número del documento de identidad	38. Nacionalidad	39. Sexo biológico		40. Sexo identificación						41. Lugar de nacimiento			42. Fecha de nacimiento
				Femenino	Masculino	F	M	T	NB	Otro	Cual	País	Departamento	Municipio	D D M M A A A A
B1															
B2															
B3															
B4															
B5															

Datos complementarios del beneficiario

	43. Parentesco	44. Etnia	45. Comunidad	46. Grupo de población especial	47. Tiene encuesta SISBÉN		48. Clasificación SISBÉN		49. Discapacidad			50. Incapacidad permanente	
					SI	NO	NIVEL	GRUPO	SI	NO	CATEGORÍA DISCAPACIDAD	SI	NO
B1													
B2													
B3													
B4													
B5													

51. Datos de residencia

	Departamento	Municipio / Distrito	Zona	Cabecera Municipal	Rural Disperso	Centro Poblado	Resto Rural	Teléfono fijo y/o celular	52. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1									
B2									
B3									
B4									
B5									

	Dirección	Localidad / Comuna	Correo electrónico
B1			
B2			
B3			
B4			
B5			

53. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS		54. Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B1		
B2		
B3		
B4		
B5		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL APORTANTE, DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA O RESPONSABLES DEL PAGO

55. Nombre o razón social	56. Tipo de documento de identificación	57. Número del documento de identificación	58. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
ENERGIA INTEGRAL ANDINA SA	NT	860533206	

59. Ubicación	Teléfono	Correo electrónico	Municipio / Distrito	Departamento
AV CIRCUNVALAR KM 6 VIA EL	31068042		SAN ANDRES	SAN ANDRES

B. REPORTE DE NOVEDADES

60. Tipo de Novedad 1. Modificación de datos básicos de identificación [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación [ ] 3. Actualización del documento de identidad [ ]
4. Actualización y corrección de datos complementarios [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS Código [ ] 6. Reporte de pago a través de un tercero Código [ ]
7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar [X]
10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando [ ] 11. Inscripción EPS retorno al país [ ] 12. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 13. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 14. Movilidad A. Régimen Contributivo [X] B. Régimen Subsidiado [ ]
15. Traslado: A Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen [ ] 16. Reporte de fallecimiento del Cotizante o Cabeza de familia [ ] 17. Reporte del tramite de protección al cesante [ ]
18. Reporte de la calidad de Pre-pensionado [ ] 19. Reporte de la calidad de Pensionado [ ] 20. Ingreso a Contribución Solidaria [ ] 21. Retiro de Contribución Solidaria [ ]

VI. DATOS ACTUALIZADOS SEGÚN REPORTE DE LA NOVEDAD

61. Datos básicos de identificación			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	62. Sexo biológico	63. Sexo identificación	64. Fecha de nacimiento
		Femenino [ ] Masculino [ ]	Femenino [ ] Masculino [ ] 1 [ ] NB [ ] Otro [ ] Cual	D I D I M I M I A I A I A I A

65. EPS anterior	66. Fecha de novedad	67. Motivo de traslado	68. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones
	D 27 I M 07 I A I 2026 I A	Código [ ]	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 69. Declaraciones de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 70. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 71. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [ ] 72. Declaración de no información del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [ ] 73. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [ ] 74. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [ ] 75. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [ ] 76. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.
- [ ] 77. Aceptación de las condiciones para vincularse a la Contribución Solidaria y de realizar los pagos correspondientes.
- [ ] 78. Aceptación de la actualización del grupo familiar y las tarifas en Contribución Solidaria, según la encuesta del Sisbén vigente.

VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

78. En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que se hará cargo del pago de la Contribución Solidaria

Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad

IX. FIRMAS

80. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional 81. Aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de Oficio

X. ANEXOS

82. Anexo copia del documento de identidad Cantidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ] TOTAL ANEXOS [ ]

83. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente. [ ]
84. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital. [ ]
85. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital. [ ]
86. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor. [ ]
87. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia. [ ]
88. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres [ ]
89. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud numeral 4 y 5 del artículo 2.1.7.3 del Decreto 780 de 2016 [ ]
90. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas. [ ]
91. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio. [ ]

XI. DATOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y/O INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

92. Identificación de la Entidad Territorial	93. Nombre de la institución
Código del municipio [ ] Código del departamento [ ]	

XII. DATOS DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL O DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

94. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	95. Firma del funcionario

96. Fecha de radicación	97. Fecha de validación	OBSERVACIONES:
D I D I M I M I A I A I A I A	D I D I M I M I A I A I A I A	CARGO: AYUDANTE DE OBRA

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

Colpensiones

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **JOHN ANDRES BARRIOS RIVERA** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **1070592353,** se encuentra afiliado/a desde **11/07/2006** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES.**

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 28 de julio de 2026.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Famisanar EPS
NIT 830.003.564-7

9013028870

No. de Radicación en la EAT: 30856662

Fecha de Radicación: 04 | 08 | M A | 2026 | A

1. DATOS DEL TRÁMITE Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

1. Tipo de trámite	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen	4. Contribución solidaria	5. Tipo de afiliado	6. Tipo de cotizante	7. Código (a registrar por la EPS)
A. Afiliación [ ]	A. Individual: - Cabeza o cabeza de familia [X] - Beneficiario o afiliado adicional [ ]	A. Contributivo [ ]	SI [ ]	A. Cotizante [X] C. Beneficiario [ ]	A. Dependiente [X]	
B. Reporte de Novedades [X]	B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]	B. Subsidiado [X]	NO [ ]	B. Cabeza de familia [ ] D. Afiliado adicional [ ]	B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]	

A. AFILIACIÓN II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional)

8. Apellidos y nombres			
BARRIOS	RIVERA	JOHN	ANDRES
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

9. Tipo de documento de identidad	10. Número del documento de identidad	11. Sexo biológico	12. Sexo identificación	13. Nacionalidad
CC	1070592353	Femenino [ ] Masculino [X]	F [ ] M [ ] NB [ ] Otro [ ] Cual	

14. Lugar de nacimiento	País	Departamento	Municipio	15. Fecha de nacimiento
				31 | D | 05 | M | A 1988 | A | A

III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

16. Etnia	17. Comunidad	18. Discapacidad / Categoría discapacidad	19. Tiene encuesta SISBÉN	20. Clasificación SISBÉN	21. Grupo de población especial
		SI [ ] NO [X]	SI [ ] NO [ ]	Nivel [ ] Grupo [ ]	

22. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	23. Administradora de Pensiones	24. Ingreso base de cotización - IBC	25. Tarifa contribución solidaria
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.		$1.750.905	

26. Residencia Dirección	Teléfono fijo	Teléfono celular	Correo electrónico

Departamento	Municipio / Distrito	Localidad / Comuna	Zona
			Cabecera Municipal [ ] Rural Disperso [ ] Centro Poblado [ ] Resto Rural [ ]

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR - Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero (a) permanente del cotizante

27. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

28. Tipo de documento de identidad	29. Número del documento de identidad	30. Sexo biológico	31. Sexo identificación	32. Nacionalidad
		Femenino [ ] Masculino [ ]	F [ ] M [ ] NB [ ] Otro [ ] Cual	

33. Lugar de nacimiento	País	Departamento	Municipio	34. Fecha de nacimiento
				D | D | M | M | A | A | A | A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	35. Apellidos y nombres			
	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	36. Tipo de documento de identidad	37. Número del documento de identidad	38. Nacionalidad	39. Sexo biológico		40. Sexo identificación					41. Lugar de nacimiento			42. Fecha de nacimiento
				Femenino	Masculino	F	M	T	NB	Otro	Cual	País	Departamento	Municipio	
B1														D D M M A A A A
B2														D D M M A A A A
B3														D D M M A A A A
B4														D D M M A A A A
B5														D D M M A A A A

Datos complementarios del beneficiario

	43. Parentesco	44. Etnia	45. Comunidad	46. Grupo de población especial	47. Tiene encuesta SISBÉN		48. Clasificación SISBÉN		49. Discapacidad			50. Incapacidad permanente	
					SI	NO	NIVEL	GRUPO	SI	NO	CATEGORÍA DISCAPACIDAD	SI	NO
B1													
B2													
B3													
B4													
B5													

51. Datos de residencia

	Departamento	Municipio / Distrito	Zona	Cabecera Municipal	Rural Disperso	Centro Poblado	Resto Rural	Teléfono fijo y/o celular	52. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1									
B2									
B3									
B4									
B5									

	Dirección	Localidad / Comuna	Correo electrónico
B1			
B2			
B3			
B4			
B5			

53. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS		54. Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B1		
B2		
B3		
B4		
B5		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL APORTANTE, DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA O RESPONSABLES DEL PAGO

55. Nombre o razón social	56. Tipo de documento de identificación	57. Número del documento de identificación	58. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
ENERGIA INTEGRAL ANDINA SA	NT	860533206	

59. Ubicación	Teléfono	Correo electrónico	Municipio / Distrito	Departamento
AV CIRCUNVALAR KM 6 VIA EL	31068042		SAN ANDRES	SAN ANDRES

B. REPORTE DE NOVEDADES

60. Tipo de Novedad 1. Modificación de datos básicos de identificación [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación [ ] 3. Actualización del documento de identidad [ ]
4. Actualización y corrección de datos complementarios [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS Código [ ] 6. Reporte de pago a través de un tercero Código [ ]
7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar [X]
10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando [ ] 11. Inscripción EPS retorno al país [ ] 12. Vinculación a una entidad autorizada para realizar
afiliaciones colectivas [ ] 13. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 14. Movilidad: A. Régimen Contributivo [X] B. Régimen Subsidiado [ ]
15. Traslado: A Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen [ ] 16. Reporte de fallecimiento del Cotizante o Cabeza de familia [ ] 17. Reporte del trámite de protección al cesante [ ]
18. Reporte de la calidad de Pre-pensionado [ ] 19. Reporte de la calidad de Pensionado [ ] 20. Ingreso a Contribución Solidaria [ ] 21. Retiro de Contribución Solidaria [ ]

VI. DATOS ACTUALIZADOS SEGÚN REPORTE DE LA NOVEDAD

61. Datos básicos de identificación			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	62. Sexo biológico	63. Sexo identificación	64. Fecha de nacimiento
		Femenino [ ] Masculino [ ]	Femenino [ ] Masculino [ ] T [ ] NB [ ] Otro [ ] Cual	D D M M A A A A

65. EPS anterior	66. Fecha de novedad	67. Motivo de traslado	68. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones
	D 27 M 07 A 2026	Código [ ]	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 69. Declaraciones de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 70. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 71. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [ ] 72. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [ ] 73. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [ ] 74. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [ ] 75. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [ ] 76. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.
- [ ] 77. Aceptación de las condiciones para vincularse a la Contribución Solidaria y de realizar los pagos correspondientes.
- [ ] 78. Aceptación de la actualización del grupo familiar y las tarifas en Contribución Solidaria, según la encuesta del Sisbén vigente.

VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

79. En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que se hará cargo del pago de la Contribución Solidaria

Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad

IX. FIRMAS

80. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional John Bayros 81. Aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de Oficio energía integral andina

X. ANEXOS

82. Anexo copia del documento de identidad

	CN	RC	TI	CC	PA	CE	CD	SC
Cantidad:								

TOTAL ANEXOS [ ]

83. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente. [ ]
84. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital. [ ]
85. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital. [ ]
86. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor. [ ]
87. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia. [ ]
88. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres [ ]
89. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud numeral 4 y 5 del artículo 2.1.7.3 del Decreto 780 de 2016. [ ]
90. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas. [ ]
91. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio. [ ]

XI. DATOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y/O INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

92. Identificación de la Entidad Territorial	93. Nombre de la Institución
Código del municipio [ ] Código del departamento [ ]	

XII. DATOS DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL O DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

94. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	95. Firma del funcionario

96. Fecha de radicación	97. Fecha de validación	OBSERVACIONES:
D D M M A A A A	D D M M A A A A	CARGO: AYUDANTE DE OBRA

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

Medellín, 27 de Julio de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de ENERGIA INTEGRAL ANDINA SA, en el centro de trabajo 0000000392 - ASOSUPRO TOBERIN R5, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1070592353	BARRIOS RIVERA JOHN ANDRES	27/07/2026		23224923	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10100007072620862108

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 27/07/2026 17:15:08 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.154.194.109, 192.230.104.6, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ComfaCasanare
Construimos Sueños !!!

Marque con una equis (x) y verifique Instrucciones de diligenciamiento y causales de no aceptación al reverso

☐ Inscripción del trabajador ☐ Modificación
☐ Traslado
☐ Reintegro en el mismo mes SI☐ NO☐
Indique última fecha de retiro: AÑO MM DD

CO09/2884

Formato de Inscripción, de Trabajadores

FAPP006

1. DATOS DEL TRABAJADOR

Tipo y número de identificación	Fecha de expedicion	Sexo
CEDULA: 1070592353	2006-06-06	MASCULINO

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
BARRIOS	RIVERA	JOHN	ANDRES

Fecha de nacimiento	Telefono	Dirección de residencia	Barrio
1988-05-31	3102650933	CARRERA 6 # 3-15	

Correo Electronico: ASIS.TALENTOHUMANO@EIASA.COM.CO

Estado civil: SOLTERO

Ciudad	Fecha de ingreso a la empresa	Horas labor mes	Cargo	Sueldo Básico
YOPAL	2026-07-27	210	AYUDANTE DE OBR	1750905

Tipo de contrato: FIJO — Administra recursos públicos ☐ — Servidor público ☐ — Nivel de escolaridad: BASICA

Profesión: CONSTRUCCION Y OBRAS CIV — Ocupacion: AUXILIARES DE MAESTROS

Orientacion sexual: NO DISPONIBLE — Vivienda: ARRENDADA

Factor de vulnerabilidad: NO APLICA — Pertenencia etnica: NO DISPONIBLE

2. DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	Telefono
ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.	

NIT, CC O CE	DEPENDENCIA
860533206	

3. DATOS DEL CÓNYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE

Tipo y número de identificación	Fecha de expedicion	Sexo

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Fecha de nacimiento	EMPRESA DONDE TRABAJA O ACTIVIDAD ECONOMICA

Caja de compensación a las cual está afiliado(a)	Sueldo básico

Datos Personales de Solicitud

Yo, JOHN ANDRES BARRIOS ANDRES, Identificado con cédula de ciudadanía No. 1070592353,manifiesto así de manera expresa, que AUTORIZO para el uso y tratamiento de mis datos personales en virtud de la función que le compete el tratamiento de los que fueron recolectados para las finalidades, así como para el envío de mensajes de correos de texto (SMS); de igual forma autorizó de manera irrevocable a la Caja a corroborar con cualquier persona, institución y autoridad, la información relativa a mis referencias personales, comerciales, fiscales, judiciales, financieras y cualquier otro dato que a juicio de la organización sea pertinentes para verificar y ampliar información por mi suministrada de acuerdo al manual de políticas y protección de datos establecido por la Caja de Compensación Familiar del Casanare COMFACASANARE de acuerdo a lo establecido en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013

FIRMA

Declaro bajo la gravedad de juramento que todos los datos son exactos y examinados por quien firma.

Firma del trabajador(a)
C.C. T.I. R.C o C.E. No 1070592353

Firma y sello del empleador

OBSERVACIONES: FORMULARIO SIN BENEFICIARIOS

ComfaCasanare

Radicado: 2026-07-28-kxgGeXzkj-afi
Fecha: 2026-07-28
Hora: 09:32:30
Destino: Afiliaciones
Empresa: ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.

La información de este formato está sujeta a verificacion

Utilice este formato exclusivamente para afiliación de trabajadores solteros, casados o en unión libre sin beneficiarios.

CEDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.070.592.353



Apellidos
BARRIOS RIVERA

Nombres
JOHN ANDRES

Nacionalidad | Estatura | Sexo
COL | 1.70 | M

Fecha de nacimiento | G.S.
31 MAYO 1988 | A+

Lugar de nacimiento
SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)

Fecha y lugar de expedición
06 JUN 2006, GIRARDOT

Firma

Fecha de expiración
24 ABR 2035

CO

0600378555

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL0600378555015109<<<<<<<<<<<
8805315M3504244COL1070592353<5
BARRIOS<RIVERA<<JOHN<ANDRES<<<

ARL | sura

Medellín, 04 de August de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A E I A S.A.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000392 ASOSUPRO TOBERIN R5		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1118650325	TARACHE SOGAMOSO MARLY	05/08/2026		20j24811	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 04/08/2026 16:50:13 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.154.194.109, 192.230.104.6, 172.16.42.57

ADRES

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	1072963411
NOMBRES	MICHAEL RONALDO
APELLIDOS	GOMEZ PEÑALOZA
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	ANAPOIMA

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	EPS FAMISANAR S.A.S.	CONTRIBUTIVO	01/06/2025	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	09/11/2026 10:00:00	**Estación de origen:**	192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**,

establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la base de datos, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las EPS y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si necesita retirarse, trasladarse, modificar sus datos o su estado de afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se aclara que estas actualizaciones dependen netamente de las EPS y no de la ADRES, por lo cual la solicitud de actualización debe ser escalada a la EPS donde se presenta la afiliación.

IMPRIMIR CERRAR VENTANA

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

MICHAEL RONALDO GOMEZ PEÑALOZA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.072.963.411**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 5 de Agosto del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

ARL | sura

Medellín, 04 de August de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A E I A S.A.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000392 ASOSUPRO TOBERIN R5		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1072963411	GOMEZ PEÑALOZA MICHAEL RONALDO	05/08/2026		25224X22	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 04/08/2026 17:18:50 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.154.194.109, 192.230.104.6, 172.16.42.57
