

**ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
ASOSUPRO**

DIRECCIÓN: Carrera 33 # 37 – 35; Barrio Centro

CIUDAD: VILLAVICENCIO – META

TELEFONO: (608) 662 3648

LICITACIÓN PUBLICA

LP - 024 - 2026

OBJETO

**MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA, EN EL
TRAYECTO ENTRE LA VEREDA MIRALINDO Y PUENTE EL DUYA, ETAPA 1,
MUNICIPIO DE OROCUÉ, CASANARE**

PROPONENTE

CONSORCIO VIA MIRALINDO 26

REQUISITOS ECONÓMICOS

ASOSUPRO 
OFICINA DE CONTRATACIÓN

15 JUL 2026

RECIBIDO

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
ASOSUPRO

DIRECCIÓN: Carrera 33 # 37 – 35; Barrio Centro

CIUDAD: VILLAVICENCIO – META

TELEFONO: (608) 662 3648

LICITACIÓN PUBLICA

LP - 024 - 2026

OBJETO

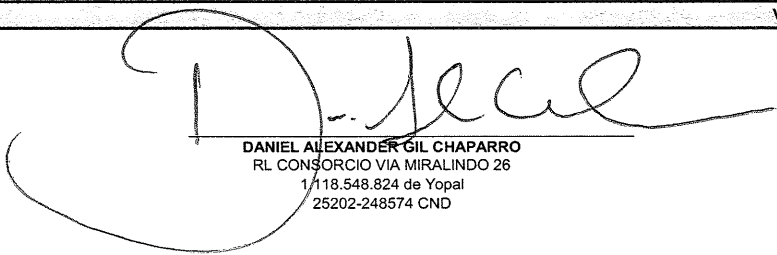
**MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA, EN EL
TRAYECTO ENTRE LA VEREDA MIRALINDO Y PUENTE EL DUYA, ETAPA 1,
MUNICIPIO DE OROCUÉ, CASANARE**

PROPONENTE

CONSORCIO VIA MIRALINDO 26

OFERTA ECONÓMICA
FORMULARIO – 1

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA, EN EL TRAYECTO ENTRE LA VEREDA MIRALINDO Y PUENTE EL DUYA, ETAPA 1, MUNICIPIO DE OROCUÉ, CASANARE							LP-024-2026	
FORMULARIO 1 :FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL							PLAZO:	24 MESES
PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO								
No.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
		GRL	PART.					
1				PRELIMINARES				\$ 37,001,506.00
1	200.2.1		PART-1	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	ha	18.00	\$ 2,055,639.20	\$ 37,001,506.00
2				EXPLANACIÓN				\$ 44,797,065,297.00
2	600.1.1		PART-2	Excavaciones varias sin clasificar	m³	191,550.00	\$ 21,418.04	\$ 4,102,625,562.00
2.02	310.1		PART-3	Conformación de la calzada existente	m²	180,000.00	\$ 3,562.80	\$ 641,304,000.00
2.03	223.1		PART-4	Geotextil de refuerzo tipo para terraplenes reforzados con geosintéticos.	m²	180,000.00	\$ 22,660.08	\$ 4,078,814,400.00
2.04	230.1		PART-5	Mejoramiento de la subrasante (AFIRMADO)	m³	60,300.00	\$ 285,081.45	\$ 17,190,411,435.00
2.05	220.1		PART-6	Terraplenes (Cajones)	m³	63,000.00	\$ 298,157.30	\$ 18,783,909,900.00
3				SUB BASES Y BASES				\$ 28,138,859,288.00
3.01	320.2.1		PART-7	Sub-base granular clase B	m³	46,800.00	\$ 405,143.65	\$ 18,960,722,820.00
	330.2.2		PART-8	Base granular clase B	m³	21,450.00	\$ 427,885.15	\$ 9,178,136,468.00
4				PAVIMENTO ASFALTICO				\$ 29,130,653,711.00
4.01	420.1		PART-9	Riego de imprimación con emulsión asfáltica cri-40	m²	139,500.00	\$ 3,324.96	\$ 463,831,920.00
4.02	450.2P		PART-10	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 (Compra de mezcla)	m³	16,740.00	\$ 1,712,474.42	\$ 28,666,821,791.00
5				ESTRUCTURAS Y DRENAJES				\$ 2,056,454,086.00
5.01	201.7		PART-11	Demolición de estructuras	m³	391.32	\$ 268,365.39	\$ 105,016,744.00
5.02	600.1.1		PART-12	Excavaciones varias sin clasificar	m³	2,764.00	\$ 21,418.04	\$ 59,199,463.00
5.03	630.1.6		PART-13	Concreto liviano resistencia 14 Mpa, mezcla in situ	m³	50.59	\$ 867,366.30	\$ 43,880,061.00
5.04	640.1		PART-14	Acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa	kg	45,829.62	\$ 7,538.94	\$ 345,506,755.00
5.05	630.1.3.2		PART-15	Concreto reforzado resistencia 28 Mpa, compra de mezcla	m³	527.26	\$ 889,586.57	\$ 469,043,415.00
5.06	661.1.2		PART-16	Tubería de Concreto Reforzado 21MPA de 900mm	m	636.00	\$ 861,443.07	\$ 547,877,793.00
5.07	610.1		PART-17	Rellenos para estructuras	m³	1,353.00	\$ 359,149.93	\$ 485,929,855.00
6				SEÑALIZACIÓN				\$ 301,817,357.00
6.01	710.1.1		PART-18	Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 75 X 75 cm	und	31.00	\$ 873,747.59	\$ 27,086,175.00
6.02	700.1		PART-19	Línea de demarcación con pintura en frío	m	35,001.00	\$ 7,032.59	\$ 246,147,683.00
6.03	701.1.2		PART-20	Tacha reflectiva (Analizado para tacha tipo a con adhesivo bituminoso y/o termoplástico)	und	2,502.00	\$ 11,424.26	\$ 28,583,499.00
SUBTOTAL OBRAS (AJUSTADO AL PESO)								\$ 104,461,851,245.00
COSTO INDIRECTO A.L.U								\$ 19,847,751,736.00
ADMINISTRACION								\$ 11,490,803,637.00
IMPREVISTOS								\$ 3,133,855,537.00
UTILIDAD								\$ 5,223,092,562.00
COSTO TOTAL OBRA								\$ 124,309,602,981.00
PRESUPUESTO IMPLEMENTACION PAGA								\$ 164,875,000.00
PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO DE TRANSITO								\$ 136,917,855.00
CARACTERIZACIÓN								\$ 32,853,075.00
VALOR TOTAL								\$ 124,644,248,911.00


DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO
RL CONSORCIO VIA MIRALINDO 26
1/118.548.824 de Yopal
25202-248574 CND

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA EN EL TRAYECTO ENTRE LA VEREDA MIRALINDO Y PUENTE EL DUVAL, ETAPA 1, MUNICIPIO DE GROCUE, CASANARE												CONSORCIO VIA MIRALINDO 26									
FORMULARIO 1. FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL										PLAZO:		24 MESES									
PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO										24 MESES											
DESCRIPCIÓN										VR. UNITARIO		VR. TOTAL		CANTIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		OBSERVACIONES	
No.		ITEM DE PAGO		ESPECIFICACIONES		UNID		CANTIDAD		VR. UNITARIO		VR. TOTAL		CANTIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		OBSERVACIONES	
1		1		PRELIMINARES								\$ 37.021.395,00		PRELIMINARES				\$ 37.001.506,00			
200.2.1		PART-1		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas		ha		18,00		\$ 2.056.744,23		\$ 37.021.395,00		18,00		\$ 2.055.639,20		\$ 37.001.506,00		Sin Observación	
2		2		EXPLANACIÓN								\$ 44.797.466.139,00		EXPLANACIÓN				\$ 44.797.065.297,00			
600.1.1		PART-2		Excavaciones varias sin clasificar		m²		191.550,00		\$ 21.418,04		\$ 4.102.625.562,00		191.550,00		\$ 21.418,04		\$ 4.102.625.562,00		Sin Observación	
202.310.1		PART-3		Conformación de la calzada existente		m²		180.000,00		\$ 3.562,97		\$ 641.334.800,00		180.000,00		\$ 3.562,80		\$ 641.304.000,00		Sin Observación	
203.223.1		PART-4		Geotextil de refuerzo tipo para terraplenes reforzados con geosintéticos.		m²		180.000,00		\$ 22.660,08		\$ 4.078.814.400,00		180.000,00		\$ 22.660,08		\$ 4.078.814.400,00		Sin Observación	
204.230.1		PART-5		Mejoramiento de la subrasante (AFIRMADO)		m²		60.300,00		\$ 285.087,59		\$ 17.190.781.877,00		60.300,00		\$ 285.081,45		\$ 17.190.411.435,00		Sin Observación	
205.220.1		PART-6		Terraplenes (Cajones)		m²		63.000,00		\$ 298.157,30		\$ 18.783.909.900,00		63.000,00		\$ 298.157,30		\$ 18.783.909.900,00		Sin Observación	
3		3		SUB BASES Y BASES								\$ 28.139.139.932,00		SUB BASES Y BASES				\$ 28.138.659.288,00			
301.320.2.1		PART-7		Sub-base granular clase B		m²		46.800,00		\$ 405.149,61		\$ 18.961.001.748,00		46.800,00		\$ 405.143,65		\$ 18.960.722.820,00		Sin Observación	
302.330.2.2		PART-8		Base granular clase B		m²		21.450,00		\$ 427.885,23		\$ 9.178.138.184,00		21.450,00		\$ 427.885,15		\$ 9.178.136.468,00		Sin Observación	
4		4		PAVIMENTO ASFALTICO								\$ 29.130.655.106,00		PAVIMENTO ASFALTICO				\$ 29.130.653.711,00			
401.420.1		PART-9		Riego de imprimación con emulsión asfáltica cl-40		m²		139.500,00		\$ 3.324,97		\$ 463.833.315,00		139.500,00		\$ 3.324,96		\$ 463.831.920,00		Sin Observación	
402.450.2P		PART-10		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 (Compra de mezcla)		m²		16.740,00		\$ 1.712.474,42		\$ 28.666.821.791,00		16.740,00		\$ 1.712.474,42		\$ 28.666.821.791,00		Sin Observación	
5		5		ESTRUCTURAS Y DRENAJES								\$ 2.056.468.685,00		ESTRUCTURAS Y DRENAJES				\$ 2.056.454.086,00			
501.201.7		PART-11		Demolición de estructuras		m³		391,32		\$ 268.365,39		\$ 105.016.744,00		391,32		\$ 268.365,39		\$ 105.016.744,00		Sin Observación	
502.600.1.1		PART-12		Excavaciones varias sin clasificar		m³		2.764,00		\$ 21.418,04		\$ 59.199.463,00		2.764,00		\$ 21.418,04		\$ 59.199.463,00		Sin Observación	
503.630.1.6		PART-13		Concreto liviano resistencia 14 Mpa. mezcla in situ		m³		50,59		\$ 867.366,30		\$ 43.880.061,00		50,59		\$ 867.366,30		\$ 43.880.061,00		Sin Observación	
504.640.1		PART-14		Acero de refuerzo de fy 4200 Mpa		kg		45.829,62		\$ 7.538,94		\$ 345.506.755,00		45.829,62		\$ 7.538,94		\$ 345.506.755,00		Sin Observación	
505.630.1.3.2		PART-15		Concreto reforzado resistencia 28 Mpa. compra de mezcla		m³		527,26		\$ 889.596,57		\$ 469.043.415,00		527,26		\$ 889.596,57		\$ 469.043.415,00		Sin Observación	
506.661.1.2		PART-16		Tubería de Concreto Reforzado 21MPa de 900mm		m		636,00		\$ 861.443,07		\$ 547.877.793,00		636,00		\$ 861.443,07		\$ 547.877.793,00		Sin Observación	
507.610.1		PART-17		Rellenos para estructuras		m³		1.353,00		\$ 359.160,72		\$ 485.944.454,00		1.353,00		\$ 359.149,93		\$ 485.929.855,00		Sin Observación	
6		6		SEÑALIZACIÓN								\$ 301.819.471,00		SEÑALIZACIÓN				\$ 301.817.357,00			
601.710.1.1		PART-18		Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 75 X 75 cm		und		31,00		\$ 873.748,85		\$ 27.086.214,00		31,00		\$ 873.747,59		\$ 27.086.175,00		Sin Observación	
602.700.1		PART-19		Línea de demarcación con pintura en frío		m		35.001,00		\$ 7.032,64		\$ 246.149.433,00		35.001,00		\$ 7.032,59		\$ 246.147.683,00		Sin Observación	
603.701.1.2		PART-20		Línea reactiva (Vitrificado para tacta tipo A con adhesivo epoximoso y/o manualidad)		und		2.502,00		\$ 11.424,39		\$ 28.583.824,00		2.502,00		\$ 11.424,26		\$ 28.583.499,00		Sin Observación	
												\$ 104.462.570.729,00		SUBTOTAL OBRAS (AJUSTADO AL PESO)				\$ 104.461.851.245,00			
												\$ 19.847.888.435,00		COSTO INDIRECTO A.L.U		19,00%		\$ 19.847.751.736,00			
												\$ 11.490.882.780,00		ADMINISTRACIÓN		11%		\$ 11.490.803.637,00		Sin Observación	
												\$ 3.133.877.122,00		IMPREVISTOS		3,00%		\$ 3.133.855.537,00		Sin Observación	
												\$ 5.223.128.536,00		UTILIDAD		5,00%		\$ 5.223.092.562,00		Sin Observación	
												\$ 124.310.459.167,00		COSTO TOTAL OBRA				\$ 124.309.602.981,00			
												\$ 164.875.000,00		PRESUPUESTO IMPLEMENTACION PAGA				\$ 164.875.000,00		Sin Observación	
												\$ 136.917.855,00		PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO DE TRANSITO				\$ 136.917.855,00		Sin Observación	
												\$ 32.853.075,00		CARACTERIZACIÓN				\$ 32.853.075,00		Sin Observación	
												\$ 124.645.105.097,00		VALOR TOTAL				\$ 124.644.246.911,00		Sin Observación	
